POWERACT
CONSULTING

ÉTUDE DE CAS · SANTÉ · CLINIQUES PRIVÉES

L’ingénierie de formation des compétences IA, de bout en bout

Groupe Santéora Cliniques Privées : le déroulé réel des 35 processus de bout en bout exécutés dans CortexSkills — macro-processus, tâches et étapes



Préparé par POWERACT Consulting · 16 oct. 2026

SOMMAIRE

Ce que couvre cette étude de cas

- Le client et le projet
- Comment CortexSkills structure le travail
- Phase 1 — Périmètre et collecte de preuves
- Phase 2 — Diagnostic
- Phase 3 — Rapport d'ingénierie de formation et plan
- Phase 4 — Conception et déploiement
- Phase 5 — Évaluation, conformité et impact
- Phase 6 — Talents, savoirs et amélioration continue
- Phase 0 — Catalyseurs (transverses à toutes les phases)
- Résultats et prochaines étapes

SYNTHÈSE

35 processus déroulés de bout en bout, 100 % des tâches terminées

18 avr. 2026 – 28 sept. 2026 · 27 personnes impliquées · chaque chiffre ci-dessous est lu dans l'application

35
processus de bout en bout (33 standard + 2 santé)

53
macro-processus mobilisés

265
tâches terminées, aucune en retard

463
étapes exécutées

Le périmètre et les preuves d'abord

40 parties prenantes enregistrées, 24 questions générées par l'IA et validées, 187 réponses collectées avant toute décision.

Un plan approuvé sur des faits

23 besoins regroupés en 6 thèmes ; budget net de 1 330 000 MAD approuvé par le comité de pilotage.

Un déploiement mesuré jusqu'à l'impact

Scores de 48 % à 81 % ; 9 superviseurs sur 11 appliquent la routine à J+30 ; ROI de 22 %.

LE CLIENT

Groupe Santéora Cliniques Privées

Cycle d'ingénierie de formation centré sur les compétences IA pour le secteur Établissements de santé : périmètre, preuves, diagnostic, rapport, déploiement, évaluation et amélioration continue.

Élément	Valeur
Secteur	Établissements de santé — cliniques privées
Taille	2 600 salariés, grande organisation
Siège	Casablanca, Maroc
Projet	Déroulé complet compétences IA 2026 — Groupe Santéora Cliniques Privées
Orientation	Compétences IA
Période	18 avr. 2026 – 28 sept. 2026
Langues	Français, anglais, arabe



Objectifs stratégiques saisis dans l'application

- OS-1 : Triage IA et aide à la décision clinique utilisé par 80 % du personnel Soins cliniques et infirmiers fin 2026 (responsable : directeur des opérations, mesure trimestrielle). OS-2 : zéro écart majeur d'audit ISO 7101.
- Familles de compétences prioritaires : Triage IA et aide à la décision clinique ; Assistance IA en imagerie médicale ; conformité ISO 7101. Niveau cible 3 (Autonome) pour les encadrants.

COMMENT CORTEXSKILLS STRUCTURE LE TRAVAIL

Quatre niveaux, du flux de valeur jusqu'à l'étape saisie

Processus de bout en bout

E2E-33 · Du questionnaire à la collecte des réponses

35 exécutés dans ce cas

Macro-processus

MP-54 · Conception, diffusion du questionnaire et collecte des réponses

53 mobilisés

Tâche

UFT-33-04 · Affecter le RACSI

265 terminées

Étape

MP-54.4 · Affecter le RACSI par section

463 exécutées

Ce qui a été saisi à cette étape

Section « Pratiques numériques » : R analyste formation, A responsable formation, C consultant, S DSI, I DRH (un seul A).

Chaque étape se remplit de trois façons : saisie ou collée, chargée depuis un modèle, ou proposée par l'IA et validée par une personne.

LE PARCOURS DU PROJET

Six phases fermées par des jalons d’approbation, avec des catalyseurs tout au long

1

Périmètre et collecte de preuves

E2E-32 · E2E-33 · E2E-19 · E2E-24

4 processus · 37 tâches

G1 — Périmètre et preuves approuvés

2

Diagnostic

E2E-20 · E2E-25 · E2E-26 · E2E-27 · E2E-28 · E2E-29 · E2E-02 · E2E-21

8 processus · 62 tâches

G2 — Diagnostic validé

3

Rapport d'ingénierie de formation et plan

E2E-01 · E2E-03 · E2E-30 · E2E-22 · E2E-23 · E2E-16 · HCPR-E2E-02

7 processus · 50 tâches

G3 — Rapport et feuille de route approuvés

4

Conception et déploiement

E2E-04 · E2E-05 · E2E-06 · E2E-13 · E2E-14

5 processus · 39 tâches

G4 — Prêt pour le déploiement

5

Évaluation, conformité et impact

E2E-07 · E2E-08 · E2E-09 · HCPR-E2E-01

4 processus · 26 tâches

G5 — Évaluation et impact validés

6

Talents, savoirs et amélioration continue


E2E-10 · E2E-11 · E2E-12 · E2E-31

4 processus · 30 tâches

G6 — Clôture et amélioration continue

Phase 0 — Catalyseurs, sur toutes les phases : E2E-15 Données, IA et intégrations · E2E-17 Du changement à l'adoption · E2E-18 Qualité, risques et amélioration

Le cockpit du projet : 265 tâches terminées sur 265

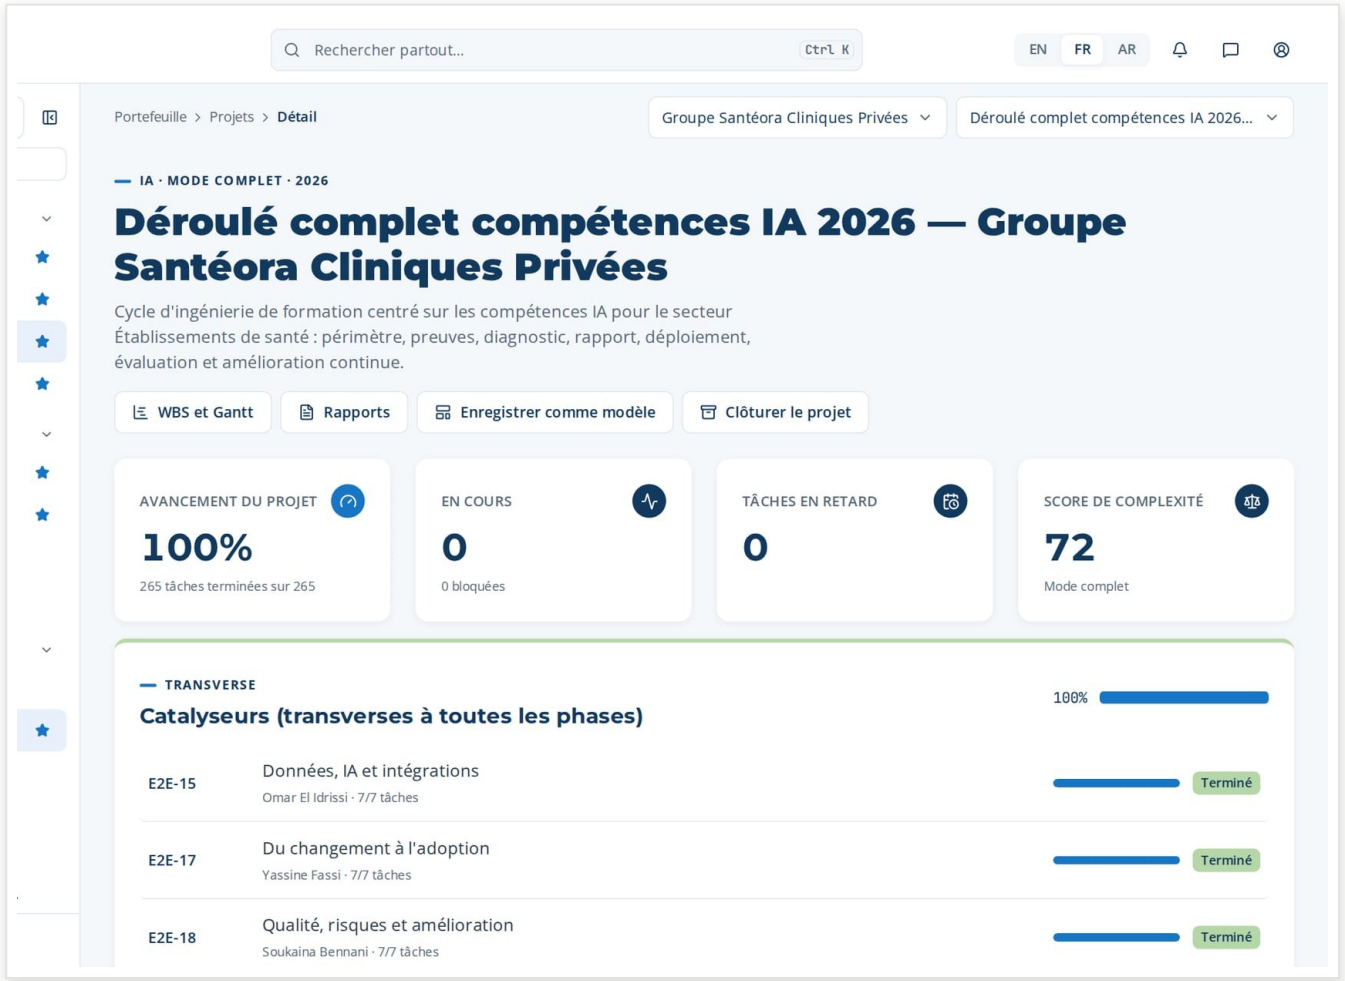

Avancement par phase

Chaque phase liste ses processus, responsables et nombres de tâches.

Aucune tâche en retard


Échéances, responsables et évaluateurs sont fixés par tâche.

Score de complexité 72

Mode complet choisi à partir de la notation du projet.

DANS L'APPLICATION

Découpage du travail et diagramme de Gantt du déroulé

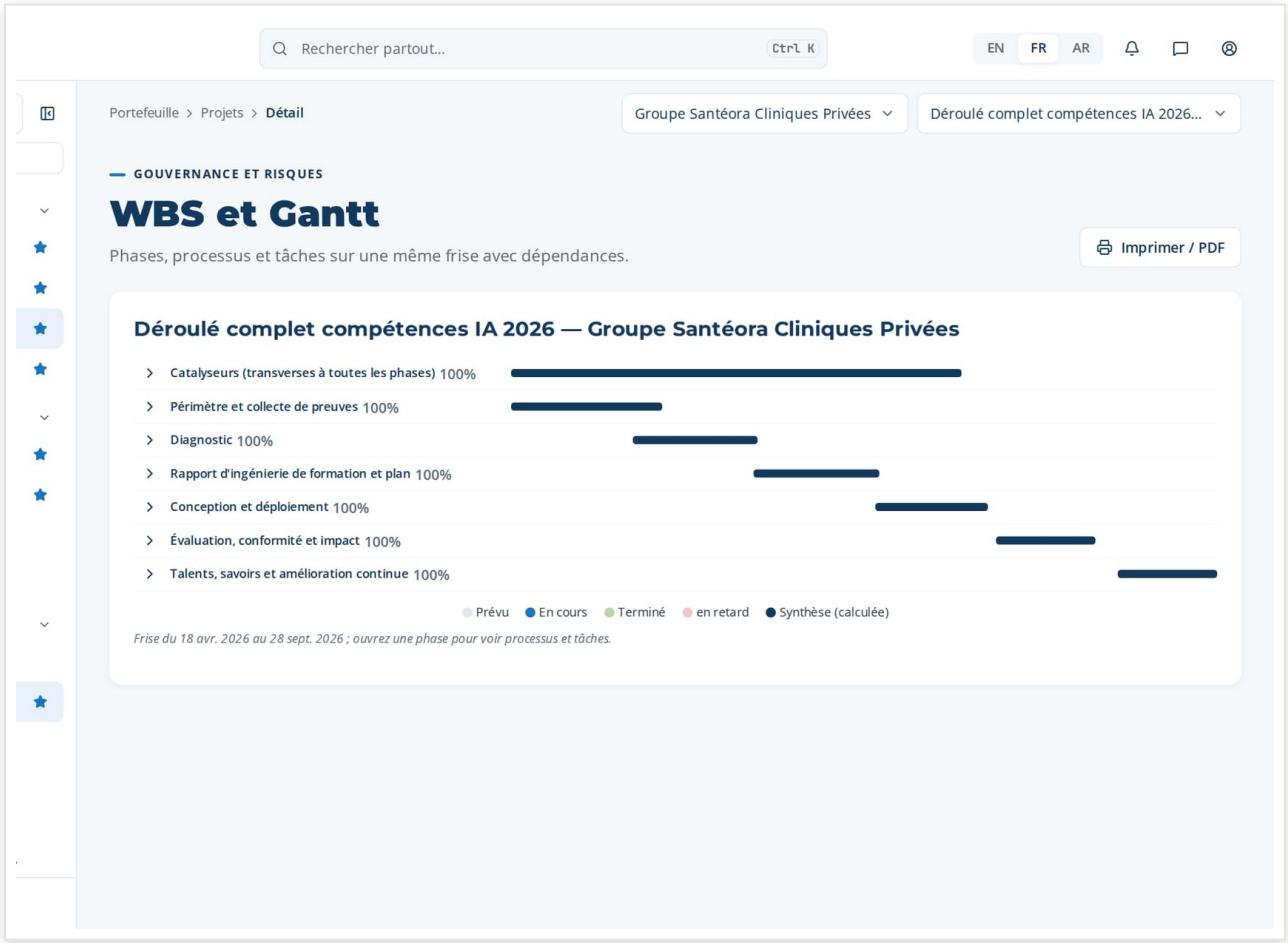

Phases, processus et tâches sur une même frise, avec leurs dépendances.

Comment les processus s'alimentent

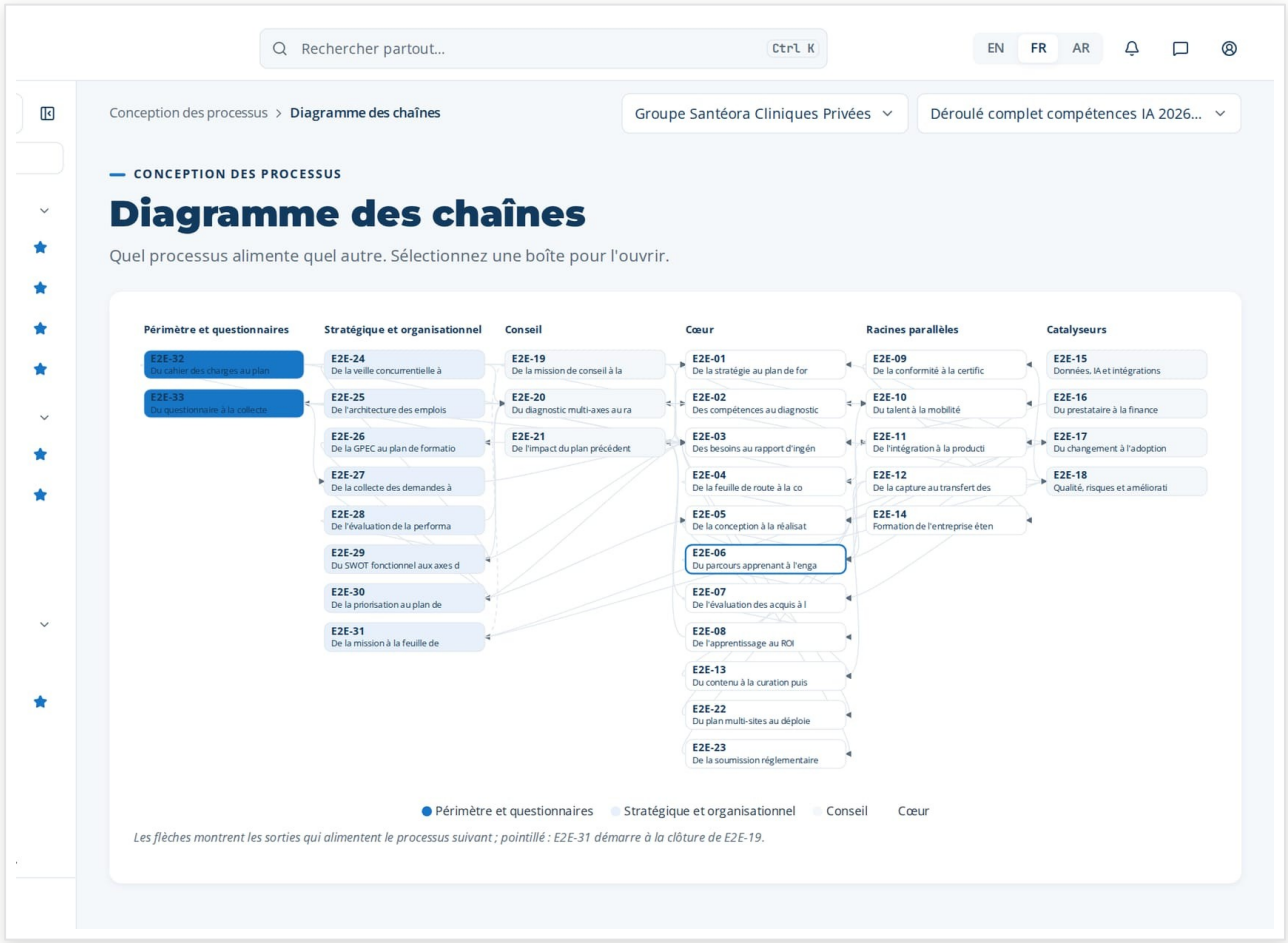


Diagramme des chaînes : la sortie de chaque processus alimente les suivants.

01

PHASE 1

Périmètre et collecte de preuves

4 processus · 37 tâches · 52 étapes

18 avr. 2026 – 23 mai 2026

Fermée par G1 — Périmètre et preuves approuvés

E2E-32 Du cahier des charges au plan d'ingénierie

E2E-33 Du questionnaire à la collecte des réponses

E2E-19 De la mission de conseil à la clôture

E2E-24 De la veille concurrentielle à la stratégie

Du cahier des charges au plan d'ingénierie

Définir et approuver le cahier des charges structuré et le registre des parties prenantes


DÉCLENCHEUR
Nouvelle mission d'ingénierie de formation, cycle du plan annuel ou demande de la direction.

ÉTAT FINAL
Cahier des charges approuvé avec matrice des critères et registre des parties prenantes transmis à la conception du questionnaire (E2E-33) et à l'analyse des besoins (E2E-03).

9 tâches · 12 étapes
26 jours · 4 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-53 Définition et gestion du cahier des charges · MP-01 Alignement stratégie et gouvernance · MP-44 Architecture des emplois et gestion des fiches de poste · MP-45 GPEC et intégration stratégique RH (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) · MP-03 Analyse des besoins et diagnostic

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-32-01 **Définir le cadre du périmètre**	**MP-53.1** Définir le cadre (groupe oui/non) **MP-53.2** Sélectionner l'organisation	Hicham Naciri 20 avr. 2026	Périmètre Groupe : Non. Organisation : Groupe Santéora Cliniques Privées.
UFT-32-02 **Sélectionner le secteur**	**MP-53.3** Sélectionner le secteur	Yassine Berrada 23 avr. 2026	Secteur : Établissements de santé.
UFT-32-03 **Sélectionner les niveaux de décision**	**MP-53.4** Sélectionner le niveau de décision (MS/MO/OP/personnalisé)	Yassine Berrada 26 avr. 2026	Niveaux de décision : MS, MO, OP (pas de niveau personnalisé).
UFT-32-04 **Croiser fonctions × niveaux de décision**	**MP-53.5** Croiser fonctions × niveaux de décision	Yassine Berrada 29 avr. 2026	Matrice : Soins cliniques et infirmiers × MS/MO/OP ; Qualité × MO/OP ; Finance × MS/MO ; RH × MS/MO.
UFT-32-05 **Choisir l'orientation et ajouter des critères personnalisés**	**MP-53.6** Sélectionner l'orientation (tous/digital/IA/personnalisée) **MP-53.7** Ajouter des critères personnalisés	Hicham Naciri 2 mai 2026	Focus : IA. Critère personnalisé : « Préparation à Triage IA et aide à la décision clinique » (poids 2,00).

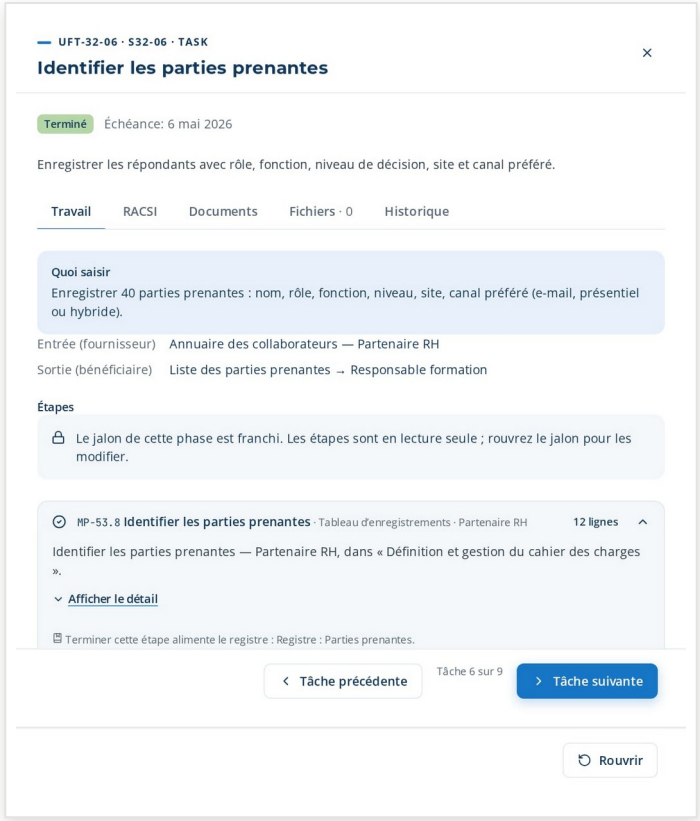


UFT-32-06 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

Du cahier des charges au plan d'ingénierie (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-32-06 **Identifier les parties prenantes**	**MP-53.8** Identifier les parties prenantes	Karim Chraibi 5 mai 2026	Enregistrer 40 parties prenantes : nom, rôle, fonction, niveau, site, canal préféré (e-mail, présentiel ou hybride).
UFT-32-07 **Valider le périmètre**	**MP-53.9** Valider et approuver le périmètre	Hicham Naciri 8 mai 2026	Validation : chaque fonction du périmètre a au moins 3 parties prenantes ; complétude 100 %.
UFT-32-08 **Approuver le périmètre**	**MP-53.9** Valider et approuver le périmètre **MP-53.10** Publier le périmètre et enregistrer les parties prenantes	Mehdi Lahlou 11 mai 2026	Statut : Approuvé (version 1). Justification : périmètre aligné sur OS-1 et OS-2.
UFT-32-09 **Publier le périmètre et enregistrer les parties prenantes**	**MP-53.10** Publier le périmètre et enregistrer les parties prenantes	Yassine Berrada 14 mai 2026	Générer le document de périmètre (RPT-033) et transmettre périmètre et parties prenantes au studio questionnaires.

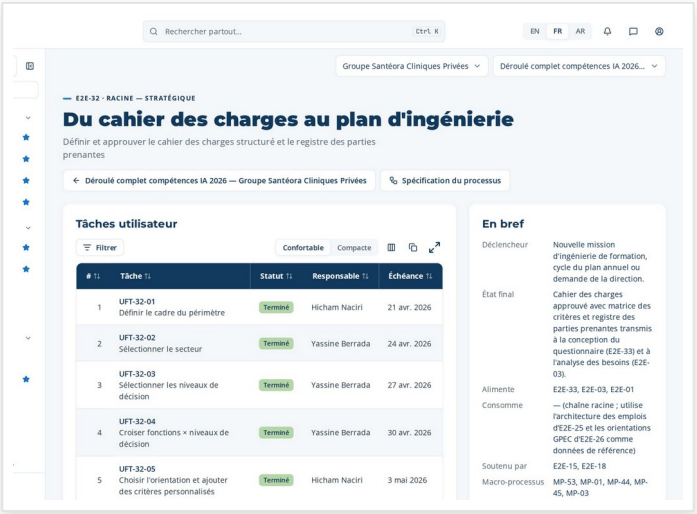

La page de E2E-32 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Alimente
E2E-33, E2E-03, E2E-01
Soutenu par
E2E-15, E2E-18

Du questionnaire à la collecte des réponses

Concevoir, diffuser et collecter les réponses aux questionnaires sur plusieurs canaux


DÉCLENCHEUR
Un cahier des charges approuvé devient disponible (fin de E2E-32).

ÉTAT FINAL
Jeu de données consolidé et validé des réponses alimentant l'analyse des besoins (E2E-03), le diagnostic (E2E-20) et la collecte des demandes (E2E-27).

12 tâches · 13 étapes
35 jours · 3 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-54 Conception, diffusion du questionnaire et collecte des réponses · MP-03 Analyse des besoins et diagnostic · MP-37 Diagnostic organisationnel multi-axes · MP-46 Collecte et consolidation des demandes de formation

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-33-01 **Sélectionner le modèle de questionnaire**	**MP-54.1** Sélectionner le modèle de questionnaire par orientation	Yassine Berrada 20 avr. 2026	Modèle : « Besoins IA — Établissements de santé » dans la langue de l'utilisateur, 5 sections.
UFT-33-02 **Élaborer le questionnaire**	**MP-54.2** Élaborer le questionnaire (charger/IA/manuel)	Yassine Berrada 23 avr. 2026	Mode d'élaboration : IA. 24 questions générées à partir du périmètre approuvé.
UFT-33-03 **Adapter et valider le contenu**	**MP-54.3** Adapter au secteur et à l'orientation	Yassine Berrada 26 avr. 2026	Valider chaque question ; reformuler 5 avec le vocabulaire Soins cliniques et infirmiers ; supprimer 2 doublons.
UFT-33-04 **Affecter le RACSI**	**MP-54.4** Affecter le RACSI par section	Hicham Naciri 29 avr. 2026	Section « Pratiques numériques » : R analyste formation, A responsable formation, C consultant, S DSI, I DRH (un seul A).
UFT-33-05 **Choisir les canaux de diffusion**	**MP-54.5** Choisir les canaux de diffusion	Hicham Naciri 2 mai 2026	Canaux : MS et MO par e-mail ; OP en présentiel sur tablette ; équipe de nuit en hybride.

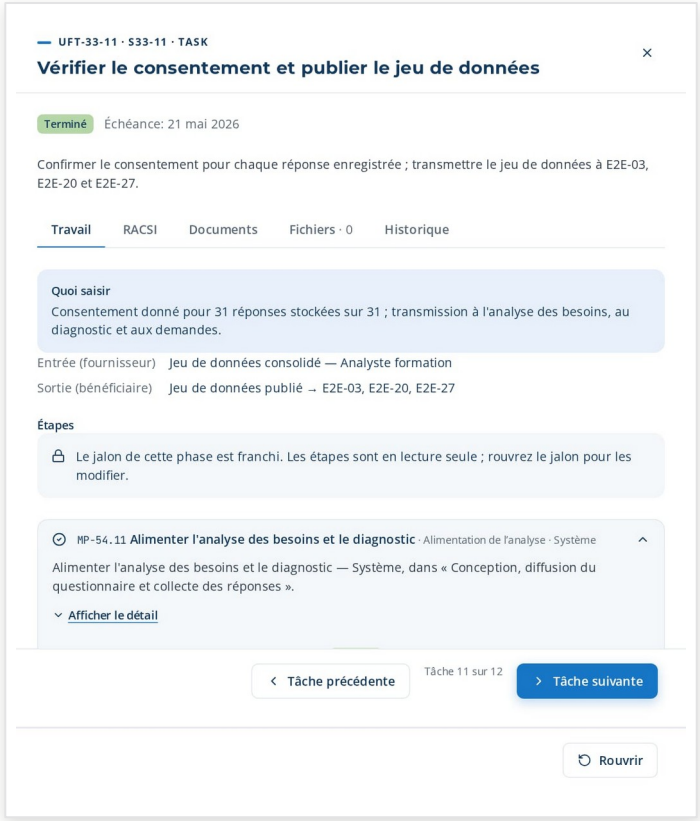


UFT-33-11 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

Du questionnaire à la collecte des réponses (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-33-06 **Diffuser le questionnaire**	**MP-54.6** Diffuser aux parties prenantes	Hicham Naciri 5 mai 2026	Diffuser aux 40 parties prenantes ; 40 envois journalisés.
UFT-33-07 **Envoyer les relances**	**MP-54.7** Envoyer les relances selon la cadence	Hicham Naciri 8 mai 2026	Relance 1 à J5 pour 17 non-répondants ; relance 2 à J10 pour 8.
UFT-33-08 **Collecter les réponses**	**MP-54.8** Collecter les réponses	Soukaina Bennani 11 mai 2026	Réponses : 34 collectées (22 en ligne, 12 hors ligne synchronisées).
UFT-33-09 **Valider la complétude**	**MP-54.9** Valider la complétude et le consentement	Yassine Berrada 14 mai 2026	Complétude : 31 complètes, 3 incomplètes signalées.
UFT-33-10 **Consolider les réponses**	**MP-54.10** Consolider les réponses	Yassine Berrada 17 mai 2026	Jeu consolidé : 31 réponses, 24 questions, par fonction et niveau.
UFT-33-11 **Vérifier le consentement et publier le jeu de données**	**MP-54.11** Alimenter l'analyse des besoins et le diagnostic **MP-54.12** Rendre compte du taux de réponse et de l'engagement	Yassine Berrada 20 mai 2026	Consentement donné pour 31 réponses stockées sur 31 ; transmission à l'analyse des besoins, au diagnostic et aux demandes.
UFT-33-12 **Rendre compte des réponses et de l'engagement**	**MP-54.12** Rendre compte du taux de réponse et de l'engagement	Yassine Berrada 23 mai 2026	Taux de réponse 85 % ; taux d'engagement 78 % ; complétude 91 % (RPT-034).

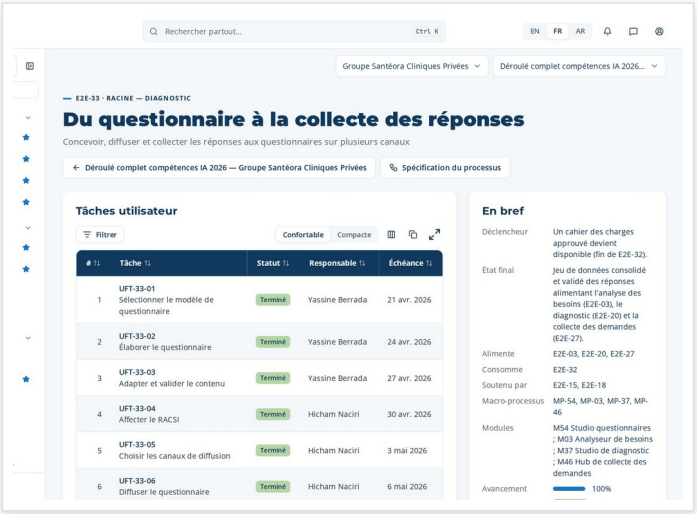

La page de E2E-33 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Alimente
E2E-03, E2E-20, E2E-27
Soutenu par
E2E-15, E2E-18

De la mission de conseil à la clôture

Gérer le cycle de vie complet d'une mission de conseil


DÉCLENCHEUR
Bon de commande client ou demande de mission reçu.

ÉTAT FINAL
Mission clôturée avec acceptation du client et REX enregistré.

9 tâches · 15 étapes
26 jours · 2 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-36 Gestion des missions de conseil · MP-01 Alignement stratégie et gouvernance · MP-19 Conduite du changement et adoption · MP-20 Qualité, risques et amélioration continue

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-19-01 **Enregistrer la mission et le bon de commande**	**MP-36.1** Enregistrer la mission et le bon de commande	Nadia Lahlou 20 avr. 2026	Mission « Ingénierie de formation 2026 — Groupe Santéora Cliniques Privées », BC-CL-221, 45 jours de conseil.
UFT-19-02 **Tenir la réunion de lancement**	**MP-36.2** Tenir la réunion de lancement	Nadia Lahlou 23 avr. 2026	Réunion de lancement le 10 février avec la DRH, le responsable formation et 4 responsables de fonction.
UFT-19-03 **Rédiger le compte rendu de réunion**	**MP-36.3** Rédiger le compte rendu de réunion	Nadia Lahlou 26 avr. 2026	Revoir le PV généré par l'IA : 6 décisions, 9 actions, RACSI extrait ; corriger 1 nom de responsable.
UFT-19-04 **S'aligner sur la stratégie du client**	**MP-01.1** Enregistrer les objectifs stratégiques de l'entreprise **MP-01.2** Relier les objectifs aux fonctions et aux sites	Nadia Lahlou 29 avr. 2026	Objectifs du client enregistrés : Triage IA et aide à la décision clinique et conformité ISO 7101 pour Soins cliniques et infirmiers.
UFT-19-05 **Planifier l'organigramme des tâches de la mission**	**MP-36.4** Planifier l'organigramme des tâches de la mission	Nadia Lahlou 2 mai 2026	WBS : 6 phases, 14 livrables, Gantt de février à novembre.

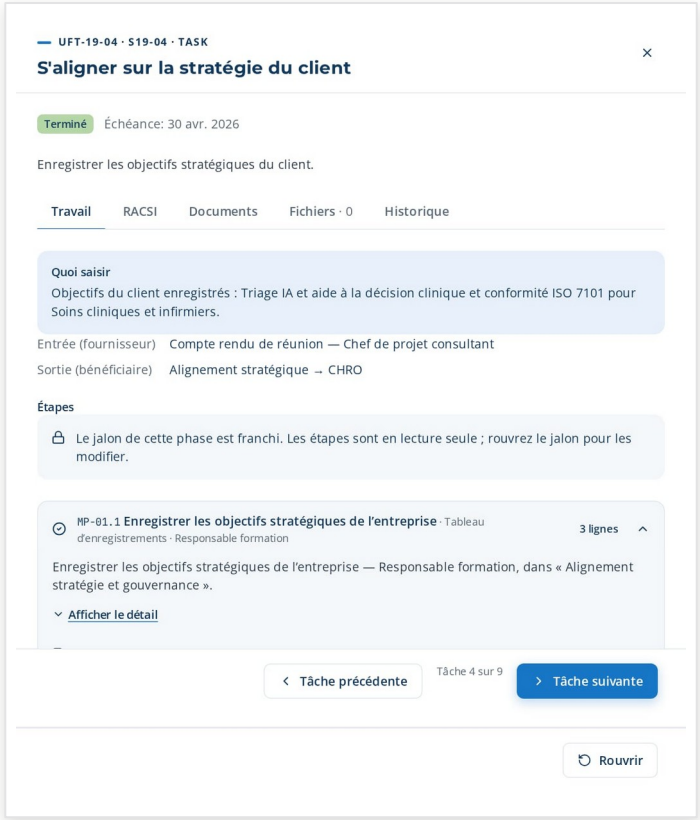


UFT-19-04 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

De la mission de conseil à la clôture (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-19-06 **Planifier l'accompagnement du changement**	**MP-19.1** Évaluer l'impact du changement **MP-19.2** Construire le plan d'adoption	Yassine Fassi 5 mai 2026	Plan de changement : 3 messages du sponsor, réseau de relais, 2 réunions plénières.
UFT-19-07 **Suivre les livrables de la mission**	**MP-36.5** Suivre les livrables de la mission **MP-20.5** Mener la revue qualité périodique	Nadia Lahlou 8 mai 2026	Livrables : 9 sur 14 livrés à temps, 1 en retard (SWOT), 4 planifiés.
UFT-19-08 **Remettre le rapport final et obtenir l'acceptation**	**MP-36.6** Remettre le rapport final **MP-36.7** Obtenir l'acceptation du client	Nadia Lahlou 11 mai 2026	Rapport final livré ; réception signée par la DRH le 28 novembre.
UFT-19-09 **Enregistrer le REX de la mission**	**MP-36.8** Enregistrer le REX de la mission **MP-12.6** Enregistrer une fiche REX **MP-12.5** Solliciter un REX à la clôture	Nadia Lahlou 14 mai 2026	REX : réussi — registre des parties prenantes ; moins bien — SWOT tardif ; cause — pas de suppléant ; note 4/5.

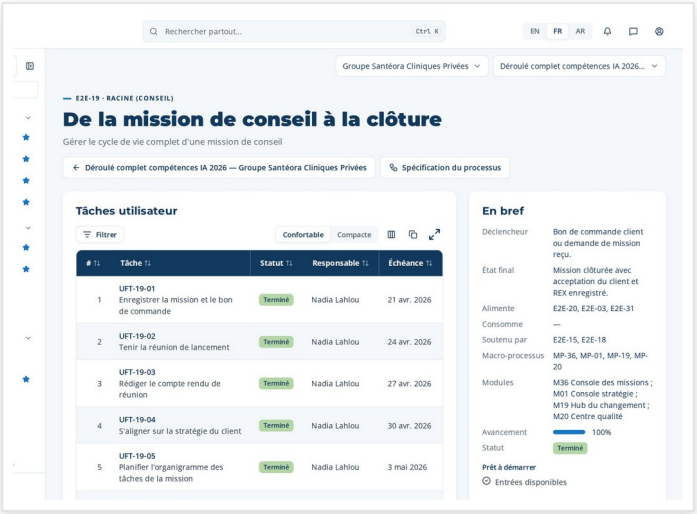

La page de E2E-19 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Alimente
E2E-20, E2E-03, E2E-31
Soutenu par
E2E-15, E2E-18

De la veille concurrentielle à la stratégie

Analyser l'environnement externe et alimenter la stratégie de formation


DÉCLENCHEUR
Cycle stratégique annuel ou demande de la direction d'une analyse de positionnement marché.

ÉTAT FINAL
Rapport de veille concurrentielle validé alimentant la stratégie de formation et le diagnostic organisationnel.

7 tâches · 12 étapes
20 jours · 2 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-43 Veille stratégique et concurrentielle · MP-01 Alignement stratégie et gouvernance · MP-37 Diagnostic organisationnel multi-axes · MP-04 Élaboration du rapport d'ingénierie de formation et de la feuille de route

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-24-01 **Définir le périmètre de veille**	**MP-43.1** Définir le périmètre de veille	Rim Ziani 20 avr. 2026	Périmètre : marché Établissements de santé au Maroc et à l'export ; horizon 3 ans ; focus sur Triage IA et aide à la décision clinique et Assistance IA en imagerie médicale.
UFT-24-02 **Réaliser les cinq forces de Porter**	**MP-43.2** Réaliser l'analyse des cinq forces de Porter	Rim Ziani 23 avr. 2026	Concurrence 4/5 ; nouveaux entrants 3/5 ; substituts 2/5 ; pouvoir des fournisseurs 3/5 ; pouvoir des clients 4/5.
UFT-24-03 **Cartographier les segments de marché**	**MP-43.3** Cartographier les segments de marché	Rim Ziani 26 avr. 2026	Segments : grands comptes (55 % du CA), revendeurs (30 %), petits clients directs (15 %).
UFT-24-04 **Analyser le positionnement des concurrents**	**MP-43.4** Analyser le positionnement des concurrents	Rim Ziani 29 avr. 2026	Le concurrent A est en avance sur Triage IA et aide à la décision clinique ; le concurrent B moins cher mais plus faible sur ISO 7101.

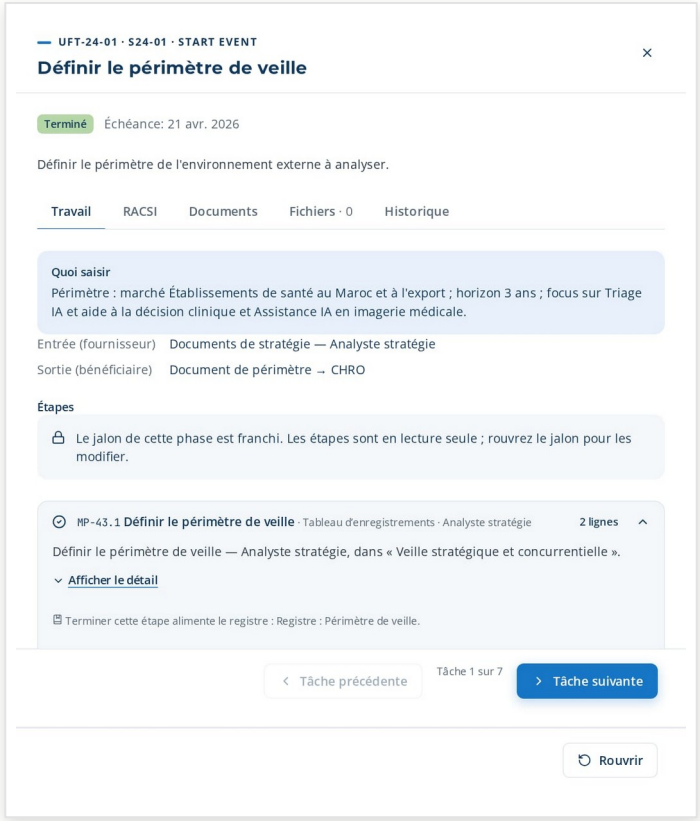


UFT-24-01 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

De la veille concurrentielle à la stratégie (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-24-05 **Suivre les tendances réglementaires et technologiques**	**MP-43.5** Suivre les évolutions réglementaires **MP-43.6** Suivre les tendances technologiques **MP-43.7** Se comparer au secteur	Rim Ziani 2 mai 2026	Tendances : révision de ISO 7101 prévue l'an prochain ; forte croissance de Planification IA des lits et des effectifs.
UFT-24-06 **Identifier les implications pour la formation**	**MP-43.8** Identifier les implications stratégiques pour la formation	Amine Lahlou 5 mai 2026	Implication formation : développer Triage IA et aide à la décision clinique chez les équipes grands comptes avant l'expansion du concurrent A.
UFT-24-07 **Publier le rapport de veille**	**MP-43.9** Produire le rapport de veille **MP-43.10** Alimenter la stratégie et le diagnostic avec la veille **MP-43.11** Mettre à jour la veille en continu *+ 1 autres étapes*	Rim Ziani 8 mai 2026	Publier le rapport RPT-007 de veille concurrentielle au comité de direction.

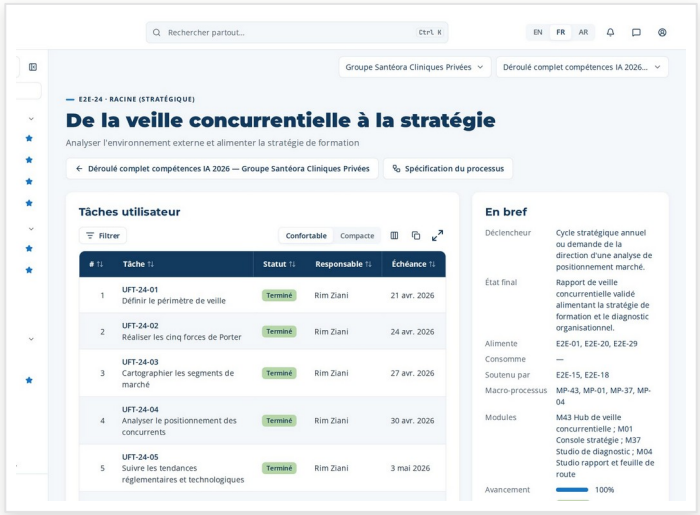

La page de E2E-24 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Alimente
E2E-01, E2E-20, E2E-29
Soutenu par
E2E-15, E2E-18

02

PHASE 2

Diagnostic

8 processus · 62 tâches · 100 étapes

16 mai 2026 – 14 juin 2026

Fermée par G2 — Diagnostic validé

E2E-20 Du diagnostic multi-axes au rapport de maturité

E2E-25 De l'architecture des emplois à la cartographie des compétences

E2E-26 De la GPEC au plan de formation

E2E-27 De la collecte des demandes à leur consolidation

E2E-28 De l'évaluation de la performance au tableau de bord RAG

E2E-29 Du SWOT fonctionnel aux axes d'amélioration

E2E-02 Des compétences au diagnostic des écarts

E2E-21 De l'impact du plan précédent à la mise à jour de la stratégie

Du diagnostic multi-axes au rapport de maturité

Mener le diagnostic à 5 axes, la maturité CMM et l'évaluation du leadership


DÉCLENCHEUR
Lancement de mission ou cahier des charges approuvé demandant un diagnostic.

ÉTAT FINAL
Rapport de diagnostic à 5 axes, maturité CMM et maturité du leadership validé avec le sponsor.

10 tâches · 17 étapes
29 jours · 4 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-37 Diagnostic organisationnel multi-axes · MP-38 Évaluation de la maturité organisationnelle (basée sur le CMM) · MP-42 Évaluation et développement de la maturité managériale · MP-02 Gestion des compétences · MP-03 Analyse des besoins et diagnostic

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-20-01 **Définir les axes et l'échantillon du diagnostic**	**MP-37.1** Définir les axes et l'échantillon du diagnostic	Nadia Lahlou 18 mai 2026	Axes : stratégie, organisation, processus, personnes, SI. Échantillon : 40 personnes (MS 8, MO 16, OP 16).
UFT-20-02 **Diffuser le questionnaire de diagnostic**	**MP-37.2** Diffuser le questionnaire de diagnostic **MP-37.4** Collecter les réponses au questionnaire	Nadia Lahlou 21 mai 2026	Questionnaire de diagnostic diffusé à 40 personnes ; 34 réponses (85 %).
UFT-20-03 **Mener les entretiens semi-directifs**	**MP-37.3** Mener les entretiens semi-directifs	Soukaina El Idrissi 24 mai 2026	Notes d'entretien (OP, Soins cliniques et infirmiers) : « Les procédures existent mais ne sont pas mises à jour depuis 2023. »
UFT-20-04 **Noter les axes du diagnostic**	**MP-37.5** Noter les axes du diagnostic	Soukaina El Idrissi 27 mai 2026	Notes des axes (1-5) : stratégie 3,4, organisation 2,8, processus 2,6, personnes 3,1, SI 2,2.
UFT-20-05 **Choisir le modèle de maturité**	**MP-38.1** Choisir les niveaux du modèle de maturité **MP-38.2** Définir les critères de preuve par niveau	Soukaina El Idrissi 30 mai 2026	Modèle de maturité : CMM 5 niveaux ; preuve du niveau 3 = processus documenté et appliqué.

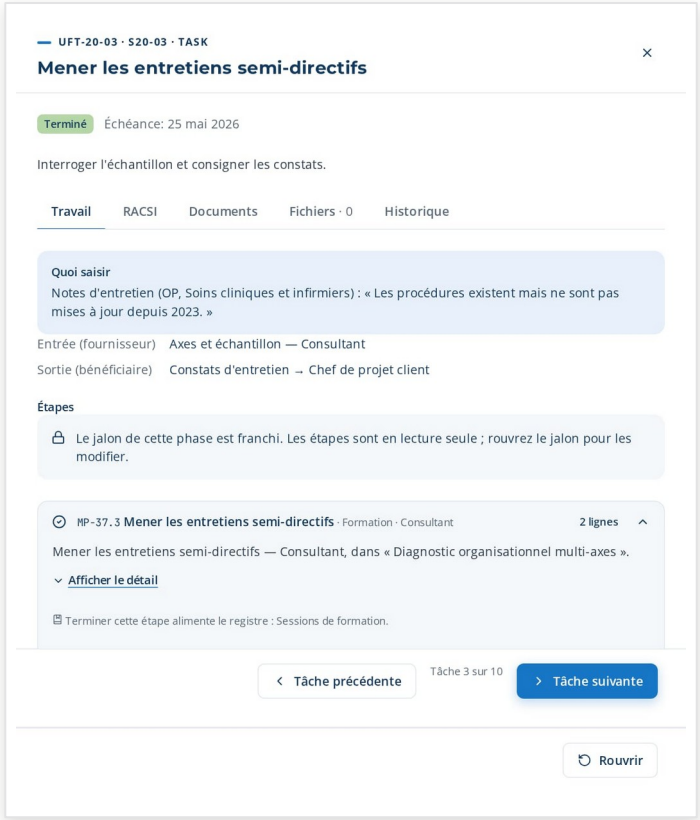


UFT-20-03 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

Du diagnostic multi-axes au rapport de maturité (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-20-06 **Noter la maturité des processus**	**MP-38.3** Noter la maturité par domaine de processus **MP-38.4** Calculer le profil de maturité	Soukaina El Idrissi 2 juin 2026	Maturité : gestion de la formation niveau 2 ; processus Soins cliniques et infirmiers niveau 3.
UFT-20-07 **Évaluer la maturité du leadership**	**MP-42.1** Lancer l'évaluation 360 du leadership **MP-42.2** Calculer le niveau de maturité managériale	Karim Chraibi 5 juin 2026	Leadership 360 : niveau moyen 3 (leadership d'équipe) sur 18 managers.
UFT-20-08 **Croiser compétences et besoins**	**MP-02.7** Valider l'inventaire des compétences **MP-03.2** Revoir la matrice des écarts par site et par fonction	Yassine Berrada 8 juin 2026	Recoupement : faiblesse de l'axe SI confirmée par l'écart Triage IA et aide à la décision clinique (-1,4).
UFT-20-09 **Rédiger les constats du diagnostic**	**MP-37.6** Rédiger les constats du diagnostic **MP-38.5** Produire le rapport de maturité	Soukaina El Idrissi 11 juin 2026	Modifier les constats IA : en garder 5, en fusionner 2, en ajouter un sur la documentation ISO 7101.
UFT-20-10 **Valider les constats avec le sponsor**	**MP-37.7** Valider les constats avec le sponsor **MP-38.6** Convenir de la maturité cible	Nadia Lahlou 14 juin 2026	Constats validés avec le sponsor ; maturité cible niveau 3 en 2026+1.

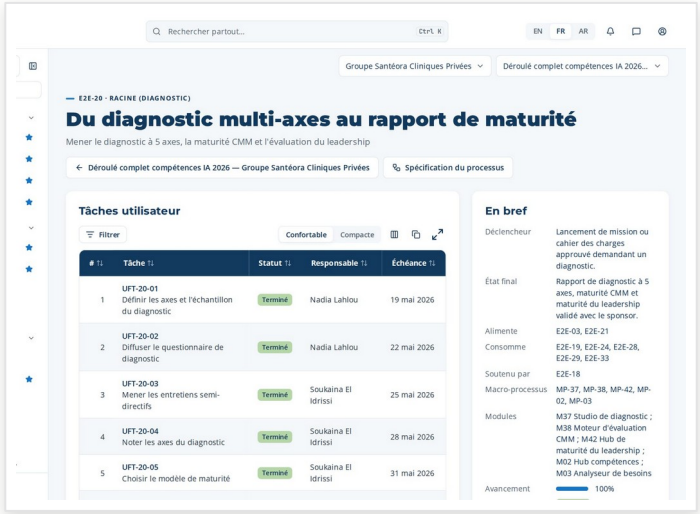

La page de E2E-20 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Alimente
E2E-03, E2E-21
Soutenu par
E2E-18

De l'architecture des emplois à la cartographie des compétences

Gérer organigrammes, fiches de poste et analyse des écarts


DÉCLENCHEUR
Changement organisationnel, création d'un nouveau rôle ou revue annuelle de l'architecture des emplois.

ÉTAT FINAL
Organigrammes, fiches de poste et cartographies de compétences approuvés avec analyse des écarts.

8 tâches · 12 étapes
23 jours · 2 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-44 Architecture des emplois et gestion des fiches de poste · MP-02 Gestion des compétences · MP-13 Développement des talents et des carrières · MP-37 Diagnostic organisationnel multi-axes

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-25-01 **Cartographier la structure organisationnelle**	**MP-44.1** Cartographier la structure organisationnelle	Mehdi Lahlou 18 mai 2026	Structure : 6 fonctions, 14 départements, 3 sites ; 212 postes.
UFT-25-02 **Concevoir les organigrammes**	**MP-44.2** Concevoir les organigrammes	Mehdi Lahlou 21 mai 2026	Organigramme « Soins cliniques et infirmiers » : directeur → 3 managers → 9 encadrants → opérateurs.
UFT-25-03 **Réaliser l'analyse des emplois**	**MP-44.3** Réaliser l'analyse des emplois	Karim Chraibi 24 mai 2026	Analyse de poste « Encadrant Soins cliniques et infirmiers » : 8 activités principales, dont 2 appuyées désormais par Triage IA et aide à la décision clinique.
UFT-25-04 **Rédiger les fiches de poste**	**MP-44.4** Rédiger les fiches de poste	Karim Chraibi 27 mai 2026	Fiche de poste rédigée : mission, activités, compétences (Triage IA et aide à la décision clinique niveau 3, ISO 7101 niveau 3), KPI.
UFT-25-05 **Valider avec les managers**	**MP-44.5** Valider les fiches avec les managers	Karim Chraibi 30 mai 2026	Validée par le manager Soins cliniques et infirmiers avec 2 modifications sur les activités.

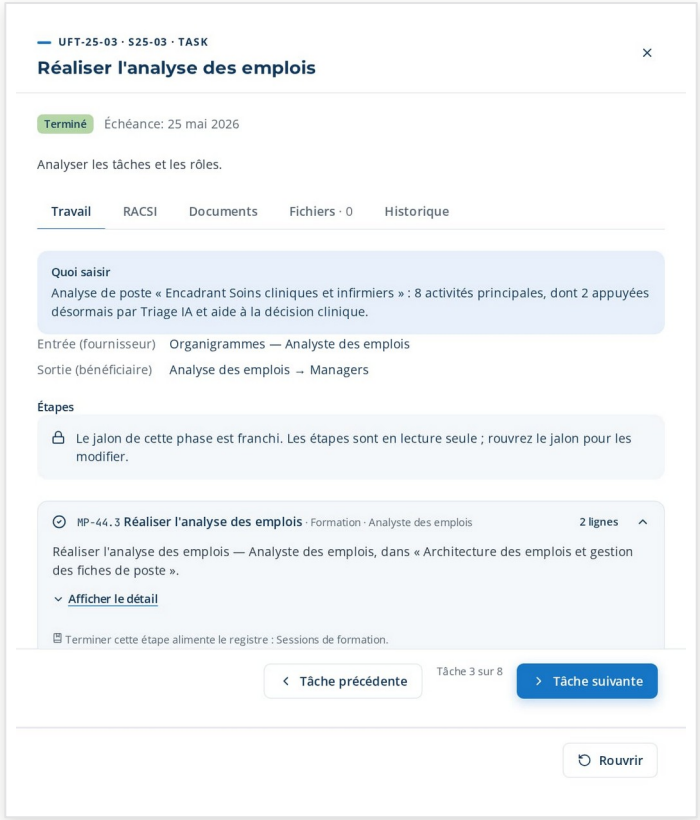


UFT-25-03 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

De l'architecture des emplois à la cartographie des compétences (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-25-06 **Analyser les écarts**	**MP-44.6** Analyser les écarts entre existant et réel	Karim Chraibi 2 juin 2026	Écart existant/réel : 11 fiches obsolètes ; 4 rôles avec de nouvelles tâches Triage IA et aide à la décision clinique.
UFT-25-07 **Identifier les rôles à développer**	**MP-44.7** Identifier les rôles à développer **MP-44.8** Mettre à jour l'architecture des emplois **MP-44.9** Aligner sur le référentiel de compétences	Karim Chraibi 5 juin 2026	Rôles « À développer » : encadrant data, technicien de maintenance 4.0.
UFT-25-08 **Publier l'architecture approuvée**	**MP-44.10** Publier les fiches de poste approuvées **MP-44.11** Suivre les évolutions de l'architecture des emplois **MP-44.12** Rendre compte de la santé de l'architecture	Mehdi Lahlou 8 juin 2026	Publier les 212 fiches approuvées et la cartographie à tous les salariés.

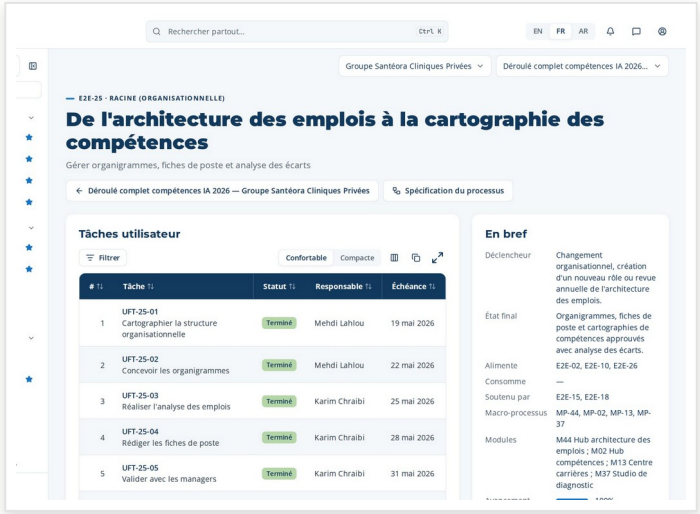

La page de E2E-25 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Alimente
E2E-02, E2E-10, E2E-26
Soutenu par
E2E-15, E2E-18

De la GPEC au plan de formation

Intégrer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans la formation


DÉCLENCHEUR
Cycle annuel de planification stratégique RH ou revue GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences).

ÉTAT FINAL
Plan de formation aligné sur la GPEC et les orientations stratégiques RH.

8 tâches · 12 étapes
23 jours · 4 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-45 GPEC et intégration stratégique RH (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) · MP-13 Développement des talents et des carrières · MP-04 Élaboration du rapport d'ingénierie de formation et de la feuille de route · MP-03 Analyse des besoins et diagnostic · MP-18 Gestion financière et budgétaire

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-26-01 **Définir le périmètre GPEC**	**MP-45.1** Définir le périmètre GPEC	Nadia Tazi 18 mai 2026	Périmètre GPEC : métiers Soins cliniques et infirmiers et systèmes d'information ; horizon 3 ans.
UFT-26-02 **Cartographier les orientations stratégiques RH**	**MP-45.2** Cartographier les orientations stratégiques RH **MP-45.3** Aligner la formation sur la GPEC	Mehdi Lahlou 21 mai 2026	Orientations RH : priorité à la mobilité interne ; 30 % des promotions issues des talents internes.
UFT-26-03 **Mettre à jour le socle de développement**	**MP-45.4** Mettre à jour le socle de développement **MP-45.5** Soutenir le développement du capital humain	Karim Chraibi 24 mai 2026	Socle de développement mis à jour : fiches, objectifs annuels, grille d'évaluation.
UFT-26-04 **Mettre à jour le répertoire des emplois et des compétences (REC)**	**MP-45.6** Mettre à jour le répertoire des emplois et des compétences (REC)	Nadia Tazi 27 mai 2026	REC mis à jour : 42 métiers, 3 nouveaux métiers liés à Triage IA et aide à la décision clinique.
UFT-26-05 **Redynamiser les évaluations périodiques**	**MP-45.7** Redynamiser les évaluations périodiques	Karim Chraibi 30 mai 2026	Évaluation périodique repensée : 2 entretiens par an, volet compétences ajouté.

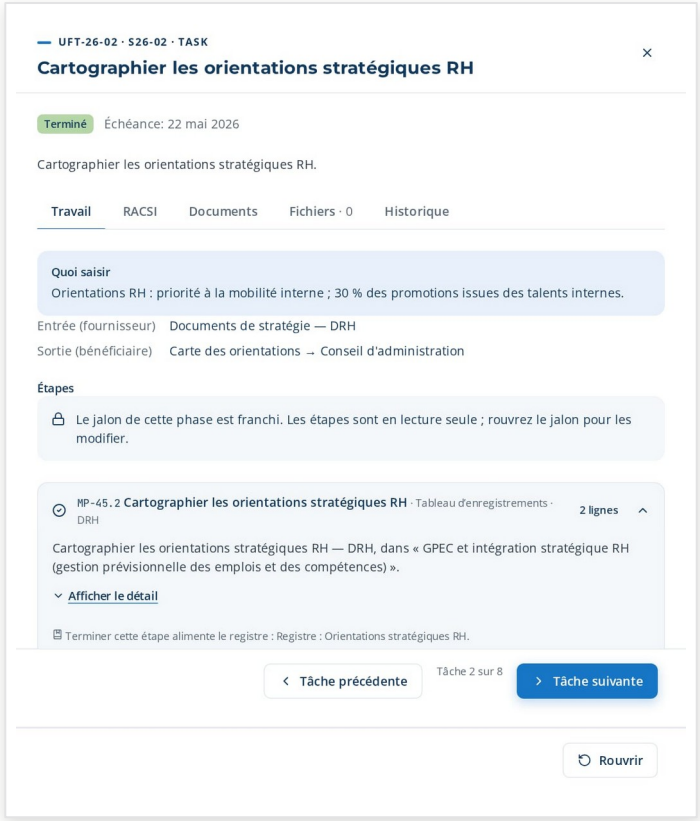

UFT-26-02 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

De la GPEC au plan de formation (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-26-06 **Concevoir les parcours de carrière**	**MP-45.8** Concevoir les parcours de carrière	Mehdi Lahlou 2 juin 2026	Chemin de carrière : opérateur → chef d'équipe → encadrant → manager Soins cliniques et infirmiers.
UFT-26-07 **Documenter la gestion des carrières**	**MP-45.9** Documenter le processus de gestion des carrières **MP-45.10** Mettre en place la rémunération collective	Mehdi Lahlou 5 juin 2026	Procédure de gestion des carrières documentée (v1) : éligibilité, comité, calendrier.
UFT-26-08 **Aligner la formation sur la GPEC**	**MP-45.11** Intégrer la GPEC aux besoins de formation **MP-45.12** Rendre compte de l'intégration GPEC	Amine Lahlou 8 juin 2026	Formation alignée sur la GPEC : 4 thèmes couvrent les 3 nouveaux métiers ; 2 thèmes retirés.



La page de E2E-26 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-45 GPEC et intégration stratégique RH (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences)
- MP-13 Développement des talents et des carrières
- MP-04 Élaboration du rapport d'ingénierie de formation et de la feuille de route
- MP-03 Analyse des besoins et diagnostic
- MP-18 Gestion financière et budgétaire

Alimente

E2E-03, E2E-30

Soutenu par

E2E-15, E2E-18

De la collecte des demandes à leur consolidation

Collecter les demandes de formation individuelles et collectives


DÉCLENCHEUR
Cycle annuel du plan de formation ou demande ponctuelle de collecte.

ÉTAT FINAL
Référentiel consolidé et priorisé des demandes intégré à l'analyse des besoins de formation.

7 tâches · 12 étapes
20 jours · 2 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-46 Collecte et consolidation des demandes de formation · MP-03 Analyse des besoins et diagnostic · MP-04 Élaboration du rapport d'ingénierie de formation et de la feuille de route · MP-08 Expérience et engagement des apprenants

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-27-01 **Concevoir les formulaires de collecte des demandes**	**MP-46.1** Concevoir les formulaires de collecte des demandes	Yassine Berrada 18 mai 2026	Formulaires : individuel (5 questions) et collectif par équipe (3 questions).
UFT-27-02 **Déployer la collecte des demandes individuelles**	**MP-46.2** Déployer la collecte des demandes individuelles	Yassine Berrada 21 mai 2026	Collecte individuelle ouverte du 1er au 20 mars ; 146 demandes reçues.
UFT-27-03 **Déployer la collecte des demandes collectives**	**MP-46.3** Déployer la collecte des demandes collectives	Yassine Berrada 24 mai 2026	Collecte collective : 18 demandes d'équipe reçues.
UFT-27-04 **Recueillir les recommandations des managers**	**MP-46.4** Recueillir les recommandations des managers	Nadia Lahlou 27 mai 2026	Recommandations des managers : 24 reçues, 9 marquées prioritaires.
UFT-27-05 **Consolider les demandes par fonction**	**MP-46.5** Consolider les demandes par fonction	Yassine Berrada 30 mai 2026	Consolidé : Soins cliniques et infirmiers 64 demandes, Opérations 41, Qualité 22, autres 37.

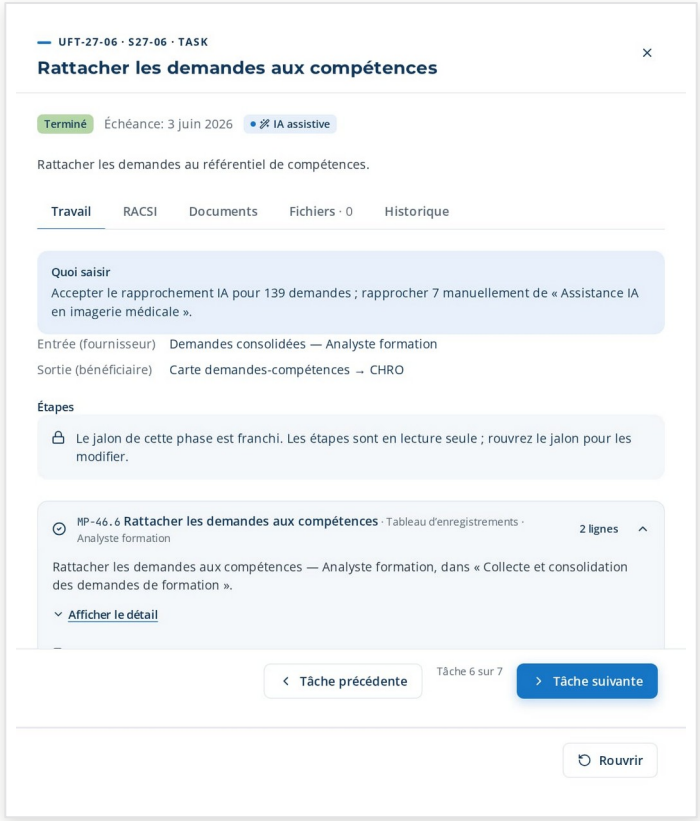


UFT-27-06 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

De la collecte des demandes à leur consolidation (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-27-06 **Rattacher les demandes aux compétences**	**MP-46.6** Rattacher les demandes aux compétences **MP-46.7** Prioriser les demandes	Yassine Berrada 2 juin 2026	Accepter le rapprochement IA pour 139 demandes ; rapprocher 7 manuellement de « Assistance IA en imagerie médicale ».
UFT-27-07 **Prioriser et valider les demandes**	**MP-46.8** Valider les demandes avec les managers **MP-46.9** Intégrer les demandes à l'analyse des besoins **MP-46.10** Analyser les tendances des demandes *+ 2 autres étapes*	Nadia Lahlou 5 juin 2026	Validées : 112 demandes (haute 38, moyenne 51, basse 23) ; 34 rejetées avec motif.

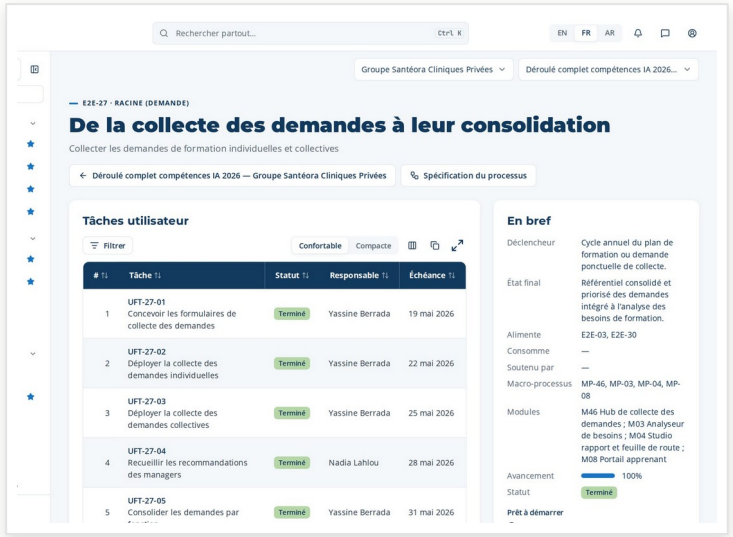

La page de E2E-27 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-46 Collecte et consolidation des demandes de formation
- MP-03 Analyse des besoins et diagnostic
- MP-04 Élaboration du rapport d'ingénierie de formation et de la feuille de route
- MP-08 Expérience et engagement des apprenants

Alimente

E2E-03, E2E-30

Soutenu par

—

De l'évaluation de la performance au tableau de bord RAG

Évaluer la performance MS/MO/OP avec des notes RAG


DÉCLENCHEUR
Cycle annuel de performance ou demande de la direction de visualiser la performance.

ÉTAT FINAL
Évaluation validée de la performance MS/MO/OP (management stratégique / management opérationnel / opérationnel) avec tableaux de bord RAG (vert/orange/rouge).

7 tâches · 12 étapes
20 jours · 1 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-47 Évaluation et visualisation des niveaux de performance (MS/MO/OP) · MP-10 Reporting et analyses · MP-37 Diagnostic organisationnel multi-axes · MP-04 Élaboration du rapport d'ingénierie de formation et de la feuille de route

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-28-01 **Définir le cadre MS/MO/OP**	**MP-47.1** Définir le cadre MS/MO/OP	Anas Hajji 18 mai 2026	MS = comité de direction ; MO = managers et encadrants ; OP = opérateurs et techniciens.
UFT-28-02 **Définir les critères RAG**	**MP-47.2** Définir les critères RAG	Anas Hajji 21 mai 2026	Vert ≥ 90 % de la cible ; Orange 70-89 % ; Rouge < 70 %.
UFT-28-03 **Collecter les données de performance par fonction**	**MP-47.3** Collecter les données de performance par fonction	Anas Hajji 24 mai 2026	Données collectées pour 6 fonctions : 18 KPI, 12 derniers mois.
UFT-28-04 **Évaluer la performance MS**	**MP-47.4** Évaluer la performance MS	Anas Hajji 27 mai 2026	MS : déploiement de la stratégie Orange (78 %) ; gouvernance Vert (92 %).
UFT-28-05 **Évaluer la performance MO**	**MP-47.5** Évaluer la performance MO	Anas Hajji 30 mai 2026	MO : management d'équipe Soins cliniques et infirmiers Rouge (64 %) ; planification Orange (81 %).
UFT-28-06 **Évaluer la performance OP**	**MP-47.6** Évaluer la performance OP **MP-47.7** Appliquer les notes RAG	Anas Hajji 2 juin 2026	OP : conformité ISO 7101 Orange (85 %) ; productivité Vert (93 %).

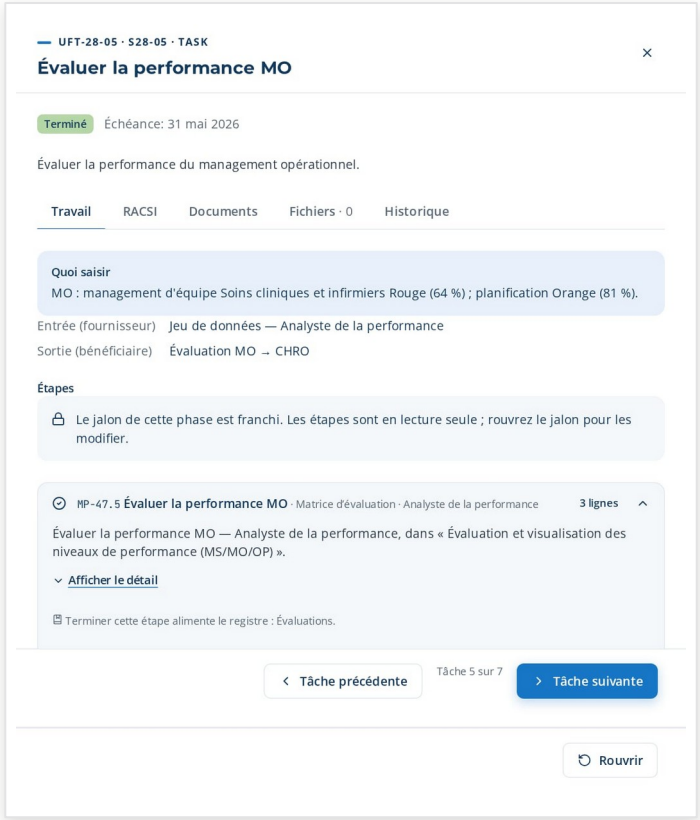


UFT-28-05 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

De l'évaluation de la performance au tableau de bord RAG (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-28-07 **Publier le tableau de bord RAG**	**MP-47.8** Visualiser les tableaux de bord de performance **MP-47.9** Identifier les écarts de performance **MP-47.10** Alimenter le rapport de diagnostic avec la performance *+ 2 autres étapes*	Anas Hajji 5 juin 2026	Publier le tableau RAG MS/MO/OP RPT-005 au comité de direction.

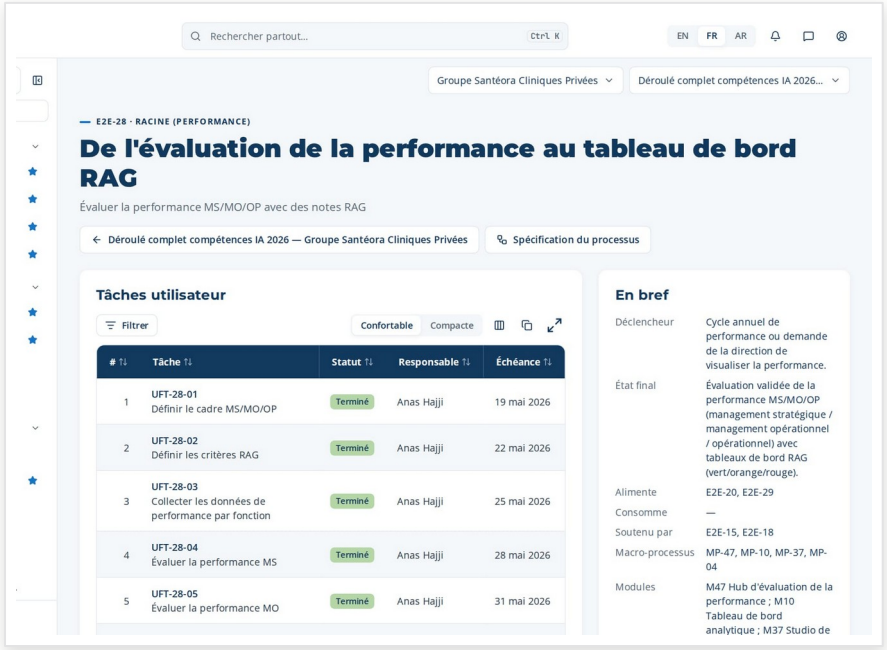

La page de E2E-28 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-47 Évaluation et visualisation des niveaux de performance (MS/MO/OP)
- MP-10 Reporting et analyses
- MP-37 Diagnostic organisationnel multi-axes
- MP-04 Élaboration du rapport d'ingénierie de formation et de la feuille de route

Alimente

E2E-20, E2E-29

Soutenu par

E2E-15, E2E-18

Du SWOT fonctionnel aux axes d'amélioration

Réaliser le SWOT par fonction et définir les axes d'amélioration


DÉCLENCHEUR
Phase de diagnostic d'une mission d'ingénierie de formation ou revue fonctionnelle annuelle.

ÉTAT FINAL
Rapports SWOT fonctionnels validés avec axes d'amélioration priorisés par fonction.

7 tâches · 12 étapes
20 jours · 3 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-48 Analyse SWOT fonctionnelle et axes d'amélioration · MP-37 Diagnostic organisationnel multi-axes · MP-04 Élaboration du rapport d'ingénierie de formation et de la feuille de route · MP-20 Qualité, risques et amélioration continue

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-29-01 **Définir le périmètre de la fonction**	**MP-48.1** Définir le périmètre de la fonction	Yassine Berrada 18 mai 2026	Fonction dans le périmètre : Soins cliniques et infirmiers (3 sites, 96 personnes).
UFT-29-02 **Réaliser le SWOT de la fonction**	**MP-48.2** Réaliser le SWOT de la fonction	Yassine Berrada 21 mai 2026	Atelier SWOT tenu avec le responsable de fonction et 6 encadrants.
UFT-29-03 **Identifier forces et faiblesses**	**MP-48.3** Identifier les forces **MP-48.4** Identifier les faiblesses	Yassine Berrada 24 mai 2026	Force : équipe expérimentée. Faiblesse : faible usage de Triage IA et aide à la décision clinique, registres papier.
UFT-29-04 **Identifier opportunités et menaces**	**MP-48.5** Identifier les opportunités **MP-48.6** Identifier les menaces	Yassine Berrada 27 mai 2026	Opportunité : Planification IA des lits et des effectifs. Menace : audits ISO 7101 plus stricts.
UFT-29-05 **Définir les axes d'amélioration**	**MP-48.7** Définir les axes d'amélioration	Nadia Lahlou 30 mai 2026	Axe 1 : numériser les registres de poste avec Triage IA et aide à la décision clinique. Axe 2 : certifier les encadrants sur ISO 7101.

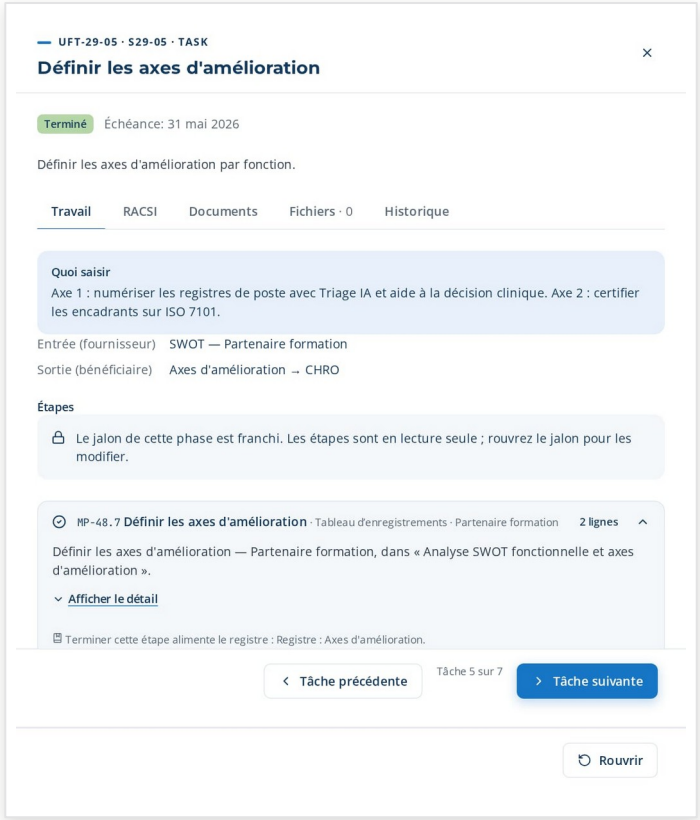


UFT-29-05 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

Du SWOT fonctionnel aux axes d'amélioration (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-29-06 **Valider avec les responsables de fonction**	**MP-48.8** Valider les axes avec les responsables de fonction	Nadia Lahlou 2 juin 2026	Validé par le responsable de fonction le 18 avril ; échéance de l'axe 2 reportée au T3.
UFT-29-07 **Prioriser les axes d'amélioration**	**MP-48.9** Prioriser les axes d'amélioration **MP-48.10** Alimenter le rapport de diagnostic avec le SWOT **MP-48.11** Suivre la mise en œuvre des améliorations *+ 1 autres étapes*	Amine Lahlou 5 juin 2026	Priorité : axe 1 (impact 5), axe 2 (impact 4).

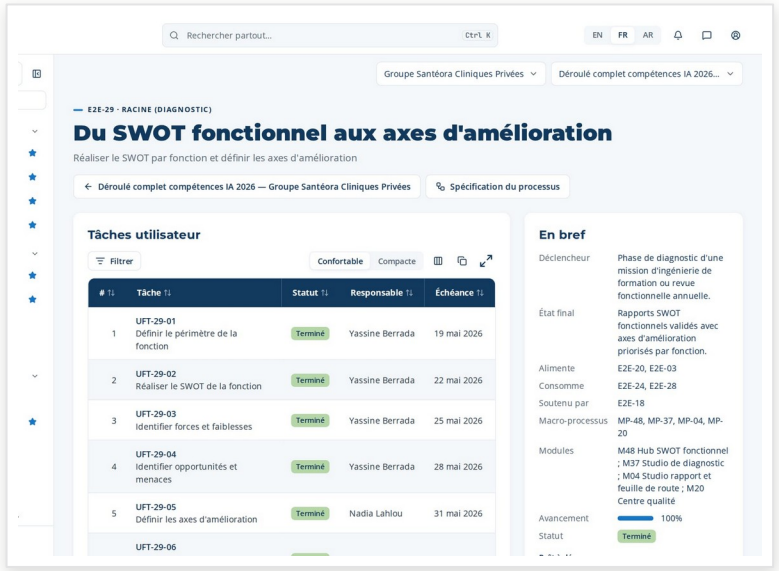

La page de E2E-29 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-48 Analyse SWOT fonctionnelle et axes d'amélioration
- MP-37 Diagnostic organisationnel multi-axes
- MP-04 Élaboration du rapport d'ingénierie de formation et de la feuille de route
- MP-20 Qualité, risques et amélioration continue

Alimente

E2E-20, E2E-03

Soutenu par

E2E-18

Des compétences au diagnostic des écarts

Produire un diagnostic validé des écarts de compétences


DÉCLENCHEUR
Plan annuel de formation approuvé ou campagne d'évaluation des compétences planifiée.

ÉTAT FINAL
Diagnostic validé des écarts de compétences transmis à l'analyse des besoins.

7 tâches · 11 étapes
20 jours · 4 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-02 Gestion des compétences · MP-03 Analyse des besoins et diagnostic · MP-28 Analytique prédictive de l'apprentissage et intelligence

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-02-01 **Maintenir le référentiel de compétences**	**MP-02.1** Définir les familles et niveaux de compétences	Yassine Berrada 18 mai 2026	Famille « Triage IA et aide à la décision clinique » : 4 compétences sur l'échelle 1-4 (Sensibilisé, Praticien, Autonome, Expert).
UFT-02-02 **Fixer les niveaux cibles par poste**	**MP-02.2** Fixer les niveaux cibles par poste	Karim Chraibi 21 mai 2026	Encadrant Soins cliniques et infirmiers : Triage IA et aide à la décision clinique = 3 ; ISO 7101 = 3. Opérateur Soins cliniques et infirmiers : Triage IA et aide à la décision clinique = 2.
UFT-02-03 **Lancer la campagne d'évaluation**	**MP-02.3** Lancer la campagne d'évaluation	Yassine Berrada 24 mai 2026	Campagne « Compétences 2026 » : population Soins cliniques et infirmiers et Opérations (212 personnes), 12 compétences, clôture le 30 avril.
UFT-02-04 **Recueillir les auto-évaluations et évaluations managers**	**MP-02.4** Soumettre les auto-évaluations et évaluations managers **MP-02.5** Consolider les résultats d'évaluation	Karim El Idrissi 27 mai 2026	Auto-évaluation Triage IA et aide à la décision clinique : 2 ; validation manager : 2 avec commentaire « besoin de pratique sur cas réels ».

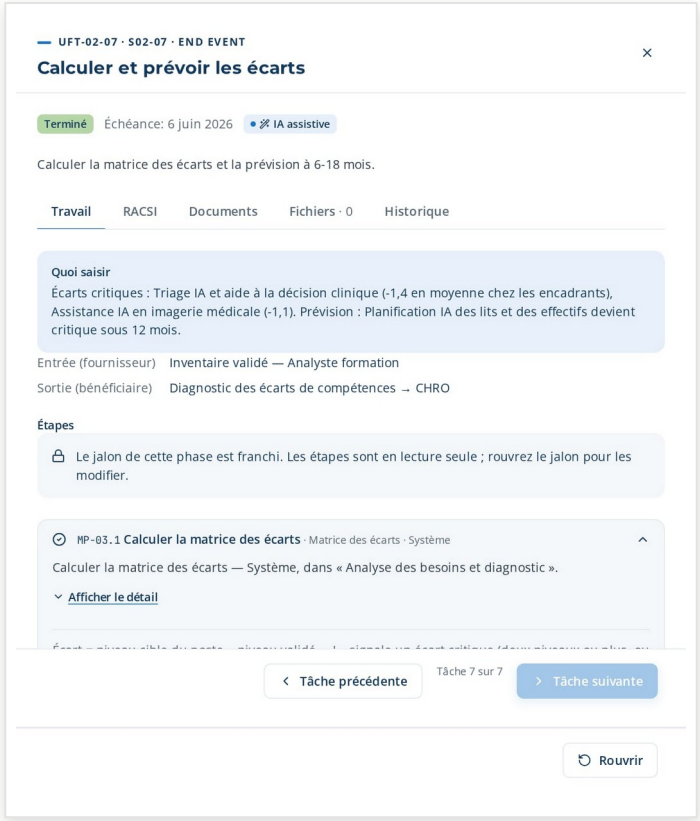


UFT-02-07 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

Des compétences au diagnostic des écarts (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-02-05 **Proposer une maîtrise à partir des preuves**	**MP-02.6** Proposer une maîtrise à partir des preuves	Yassine Berrada 30 mai 2026	Accepter 38 niveaux suggérés, en modifier 4 (preuves trop anciennes), en rejeter 1. Chaque changement est annoté.
UFT-02-06 **Valider l'inventaire des compétences**	**MP-02.7** Valider l'inventaire des compétences	Hicham Naciri 2 juin 2026	Inventaire validé : 212 salariés, 96 % d'évaluations complètes. Justification : échantillon contrôlé par site.
UFT-02-07 **Calculer et prévoir les écarts**	**MP-03.1** Calculer la matrice des écarts **MP-03.2** Revoir la matrice des écarts par site et par fonction **MP-28.3** Prévoir les écarts de compétences *+ 1 autres étapes*	Yassine Berrada 5 juin 2026	Écarts critiques : Triage IA et aide à la décision clinique (-1,4 en moyenne chez les encadrants), Assistance IA en imagerie médicale (-1,1). Prévision : Planification IA des lits et des effectifs devient critique sous 12 mois.

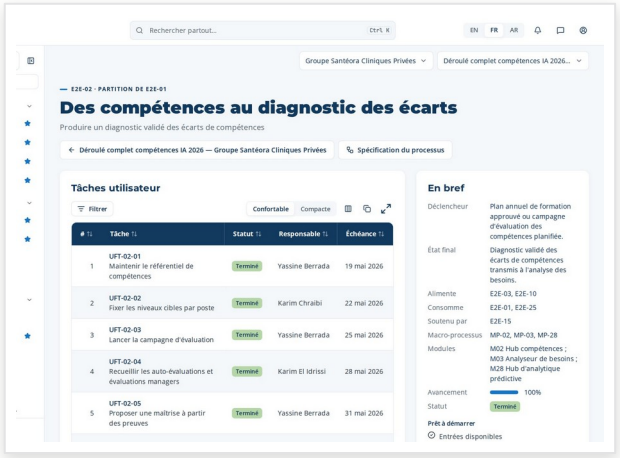

La page de E2E-02 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-02 Gestion des compétences
- MP-03 Analyse des besoins et diagnostic
- MP-28 Analytique prédictive de l'apprentissage et intelligence

Alimente

E2E-03, E2E-10

Soutenu par

E2E-15

De l'impact du plan précédent à la mise à jour de la stratégie

Évaluer l'impact du plan N-1 et mettre à jour la stratégie


DÉCLENCHEUR
Début d'un nouveau cycle de plan avec les données d'exécution N-1 disponibles.

ÉTAT FINAL
Conclusions d'impact N-1 intégrées à la mise à jour de la stratégie.

8 tâches · 12 étapes
23 jours · 4 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-39 Étude d'impact du plan de formation (N-1) · MP-09 Évaluation · MP-32 ROI de la formation et mesure de l'impact métier · MP-01 Alignement stratégie et gouvernance · MP-04 Élaboration du rapport d'ingénierie de formation et de la feuille de route

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-21-01 **Charger les données d'exécution du plan N-1**	**MP-39.1** Charger les données d'exécution du plan N-1	Yassine Berrada 18 mai 2026	Charger le plan N-1 : 28 sessions prévues, 23 réalisées, 1 410 000 MAD dépensés.
UFT-21-02 **Définir les critères d'impact**	**MP-39.2** Définir les critères d'impact	Yassine Berrada 21 mai 2026	Critères d'impact : application au poste, évolution des KPI, satisfaction, coût par apprenant.
UFT-21-03 **Interroger participants et managers**	**MP-39.3** Interroger participants et managers **MP-09.5** Enregistrer l'observation en situation de travail (niveau 3)	Yassine Berrada 24 mai 2026	Enquête envoyée à 190 participants et 34 managers ; 61 % de réponses.
UFT-21-04 **Comparer le prévu et le réalisé**	**MP-39.4** Comparer le prévu et le réalisé **MP-32.3** Isoler l'effet de la formation	Yassine Berrada 27 mai 2026	Prévu vs réalisé : 82 % des sessions, 94 % du budget ; 2 thèmes non réalisés.
UFT-21-05 **Revoir le ROI N-1**	**MP-32.4** Calculer le ROI Phillips **MP-32.5** Revoir le ROI avec la finance	Anas Hajji 30 mai 2026	ROI N-1 : Assistance IA en imagerie médicale 18 % ; thème sécurité 35 %.

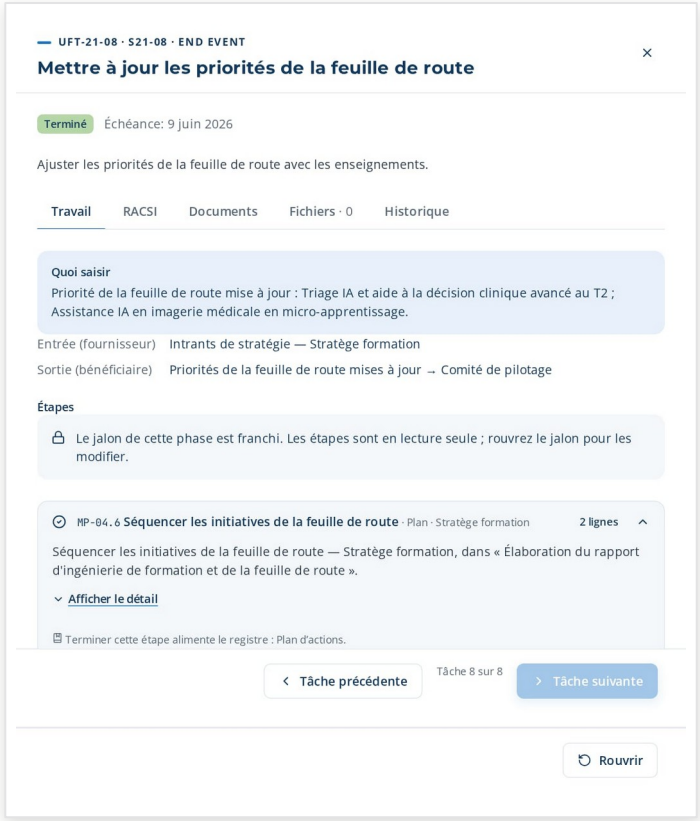


UFT-21-08 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

De l'impact du plan précédent à la mise à jour de la stratégie (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-21-06 **Rédiger les conclusions d'impact**	**MP-39.5** Rédiger les conclusions de l'étude d'impact	Yassine Berrada 2 juin 2026	Accepter les conclusions IA 1 à 3 ; réécrire la conclusion 4 (échantillon trop faible).
UFT-21-07 **Intégrer les conclusions à la stratégie**	**MP-39.6** Intégrer les conclusions à la mise à jour de la stratégie **MP-01.1** Enregistrer les objectifs stratégiques de l'entreprise	Hicham Naciri 5 juin 2026	Alimenter la stratégie : garder le format mixte ; arrêter les longues formations présentielles sur Assistance IA en imagerie médicale.
UFT-21-08 **Mettre à jour les priorités de la feuille de route**	**MP-04.6** Séquencer les initiatives de la feuille de route	Amine Lahlou 8 juin 2026	Priorité de la feuille de route mise à jour : Triage IA et aide à la décision clinique avancé au T2 ; Assistance IA en imagerie médicale en micro-apprentissage.

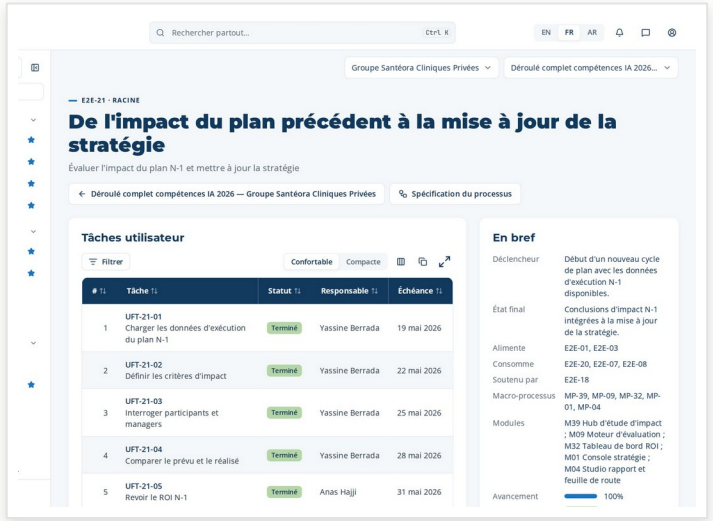

La page de E2E-21 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-39 Étude d'impact du plan de formation (N-1)
- MP-09 Évaluation
- MP-32 ROI de la formation et mesure de l'impact métier
- MP-01 Alignement stratégie et gouvernance
- MP-04 Élaboration du rapport d'ingénierie de formation et de la feuille de route

Alimente

E2E-01, E2E-03

Soutenu par

E2E-18

03

PHASE 3

Rapport d'ingénierie de formation et plan

7 processus · 50 tâches · 84 étapes

13 juin 2026 – 12 juil. 2026

Fermée par G3 — Rapport et feuille de route approuvés

E2E-01 De la stratégie au plan de formation

E2E-03 Des besoins au rapport d'ingénierie de formation et à la feuille de route

E2E-30 De la priorisation au plan de ressources

E2E-22 Du plan multi-sites au déploiement

E2E-23 De la soumission réglementaire à la validation

E2E-16 Du prestataire à la finance

HCPR-E2E-02 Des compétences critiques au plan de transformation — Établissements de santé

De la stratégie au plan de formation

Traduire la stratégie de l'entreprise en un plan annuel de formation approuvé et un budget


DÉCLENCHEUR
Ouverture du cycle stratégique annuel ou publication par le conseil d'objectifs révisés.

ÉTAT FINAL
Plan annuel de formation et enveloppe budgétaire approuvés par le comité de pilotage et verrouillés.

8 tâches · 16 étapes
23 jours · 6 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-01 Alignement stratégie et gouvernance · MP-02 Gestion des compétences · MP-03 Analyse des besoins et diagnostic · MP-04 Élaboration du rapport d'ingénierie de formation et de la feuille de route · MP-18 Gestion financière et budgétaire · MP-19 Conduite du changement et adoption

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-01-01 **Enregistrer les objectifs stratégiques**	**MP-01.1** Enregistrer les objectifs stratégiques de l'entreprise	Hicham Naciri 15 juin 2026	OS-1 : Triage IA et aide à la décision clinique utilisé par 80 % du personnel Soins cliniques et infirmiers fin 2026 (responsable : directeur des opérations, mesure trimestrielle). OS-2 : zéro écart majeur d'audit ISO 7101.
UFT-01-02 **Relier les objectifs aux fonctions et aux sites**	**MP-01.2** Relier les objectifs aux fonctions et aux sites	Amine Lahlou 18 juin 2026	OS-1 → Soins cliniques et infirmiers, Opérations, Systèmes d'information (tous sites). OS-2 → Qualité et HSE, Soins cliniques et infirmiers.
UFT-01-03 **Cadrer les priorités de compétences**	**MP-02.1** Définir les familles et niveaux de compétences **MP-02.2** Fixer les niveaux cibles par poste	Yassine Berrada 21 juin 2026	Familles de compétences prioritaires : Triage IA et aide à la décision clinique ; Assistance IA en imagerie médicale ; conformité ISO 7101. Niveau cible 3 (Autonome) pour les encadrants.

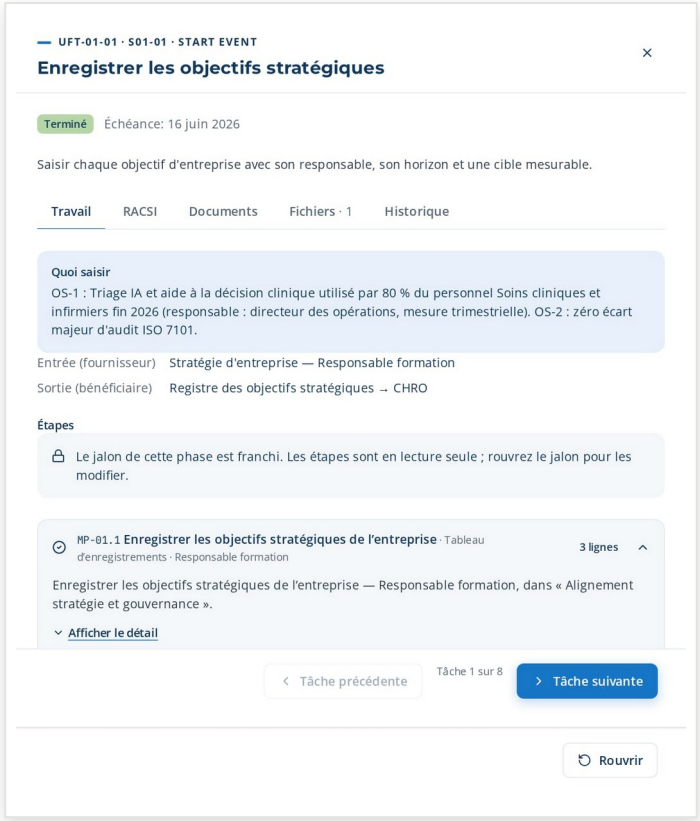


UFT-01-01 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

De la stratégie au plan de formation (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-01-04 **Pré-cadrer les besoins de formation**	**MP-03.1** Calculer la matrice des écarts **MP-03.2** Revoir la matrice des écarts par site et par fonction	Yassine Berrada 24 juin 2026	Besoins pré-cadrés : 42 % des encadrants Soins cliniques et infirmiers sous la cible sur Triage IA et aide à la décision clinique ; 18 salariés sous la cible sur ISO 7101.
UFT-01-05 **Définir l'enveloppe budgétaire**	**MP-01.3** Définir l'enveloppe budgétaire de la formation **MP-18.1** Répartir le budget par thème et par site **MP-18.2** Prévoir les remboursements OFPPT	Kawtar Chraibi 27 juin 2026	Budget formation brut 2026 : 1 850 000 MAD ; remboursement prévu (OFPPT/CSF) : 520 000 MAD ; enveloppe nette : 1 330 000 MAD.
UFT-01-06 **Planifier le changement et l'adoption**	**MP-19.1** Évaluer l'impact du changement **MP-19.2** Construire le plan d'adoption	Yassine Fassi 30 juin 2026	Impact du changement : élevé pour les encadrants Soins cliniques et infirmiers (nouvelles routines Triage IA et aide à la décision clinique). Sponsor : directeur des opérations. Relais : un par site.
UFT-01-07 **Constituer le dossier d'approbation du plan**	**MP-01.4** Planifier les jalons du comité de pilotage **MP-01.5** Constituer le dossier d'approbation du plan **MP-04.1** Consolider les livrables amont	Hicham Naciri 3 juil. 2026	Dossier d'approbation : 2 objectifs, budget net 1 330 000 MAD, 6 thèmes prioritaires, comité le 15 mars 2026.
UFT-01-08 **Approuver et verrouiller le plan annuel de formation**	**MP-01.6** Enregistrer la décision du comité de pilotage **MP-01.7** Verrouiller et diffuser le plan approuvé	Mehdi Lahlou 6 juil. 2026	Décision : Approuver. Justification : aligné sur OS-1 et OS-2 ; budget dans l'enveloppe. Plan verrouillé en version 1.

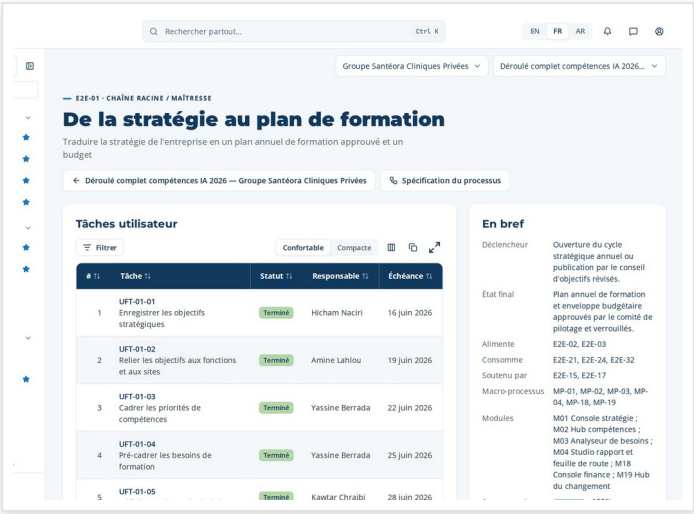

La page de E2E-01 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Alimente
E2E-02, E2E-03
Soutenu par
E2E-15, E2E-17

Des besoins au rapport d'ingénierie de formation et à la feuille de route

Produire le rapport d'ingénierie de formation et la feuille de route priorisée


DÉCLENCHEUR
Diagnostic validé des écarts, demandes consolidées, cahier des charges approuvé ou constats de diagnostic disponibles.

ÉTAT FINAL
Rapport d'ingénierie de formation et feuille de route priorisée approuvés et publiés.

10 tâches · 17 étapes
29 jours · 4 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-01 Alignement stratégie et gouvernance · MP-03 Analyse des besoins et diagnostic · MP-04 Élaboration du rapport d'ingénierie de formation et de la feuille de route · MP-18 Gestion financière et budgétaire · MP-20 Qualité, risques et amélioration continue

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-03-01 **Planifier les entretiens de diagnostic**	**MP-03.3** Planifier les entretiens de diagnostic	Yassine Berrada 15 juin 2026	Plan d'entretiens : 14 entretiens semi-directifs (4 MS, 6 MO, 4 OP), 45 minutes chacun, semaines 10-11.
UFT-03-02 **Enregistrer les constats d'entretien**	**MP-03.4** Enregistrer les constats d'entretien	Yassine Berrada 18 juin 2026	Constat (MO, Soins cliniques et infirmiers) : « Les encadrants n'ont pas confiance dans les données Triage IA et aide à la décision clinique ; ils ressaisissent sur papier. »
UFT-03-03 **Regrouper les besoins en thèmes**	**MP-03.5** Regrouper les besoins en thèmes de formation	Yassine Berrada 21 juin 2026	Accepter le thème « Triage IA et aide à la décision clinique pour les encadrants » ; fusionner deux doublons sur Assistance IA en imagerie médicale ; scinder « ISO 7101 » en sensibilisation et auditeur.
UFT-03-04 **Prioriser les besoins selon l'impact**	**MP-03.6** Prioriser les besoins selon l'impact métier	Amine Lahlou 24 juin 2026	Triage IA et aide à la décision clinique : impact 5, urgence 4. Assistance IA en imagerie médicale : impact 4, urgence 3. ISO 7101 : impact 4, urgence 5.

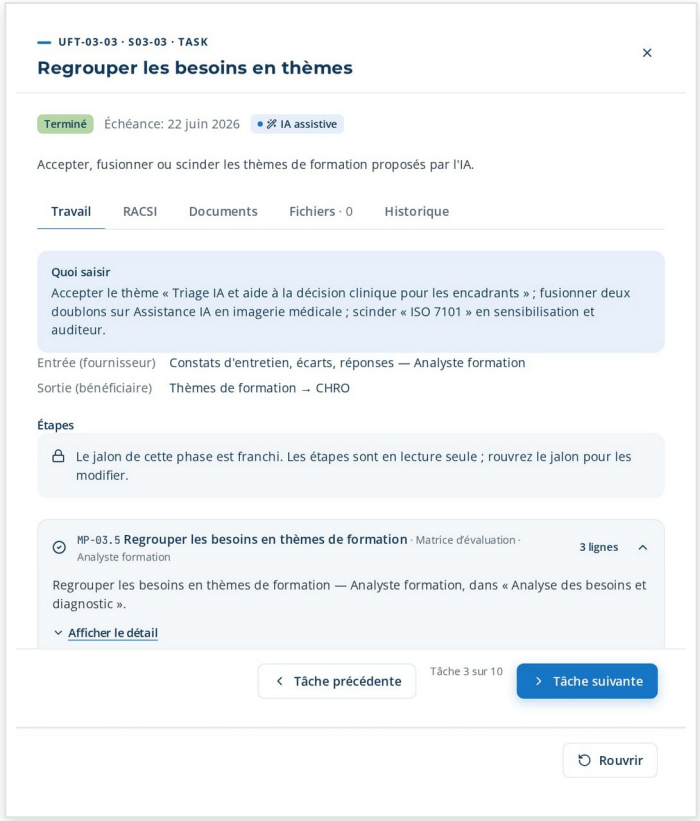


UFT-03-03 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

Des besoins au rapport d'ingénierie de formation et à la feuille de route (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-03-05 **Valider le registre des besoins**	**MP-03.7** Valider le registre des besoins	Hicham Naciri 27 juin 2026	Registre des besoins validé : 23 besoins, 6 thèmes. Justification : couvre OS-1 et OS-2 ; revu par le sponsor.
UFT-03-06 **Consolider les intrants d'ingénierie**	**MP-04.1** Consolider les livrables amont **MP-04.2** Vérifier la complétude des intrants	Yassine Berrada 30 juin 2026	Intrants complets : périmètre, 187 réponses, matrice des écarts, tableau RAG, SWOT, demandes. Manquants : aucun.
UFT-03-07 **Rédiger le rapport d'ingénierie de formation**	**MP-04.3** Générer le projet de rapport **MP-04.4** Modifier et compléter les sections du rapport	Amine Lahlou 3 juil. 2026	Section 3 « Diagnostic » : modifier le brouillon IA, ajouter la citation d'entretien sur Triage IA et aide à la décision clinique, garder le tableau RAG.
UFT-03-08 **Mener la revue qualité**	**MP-04.5** Réaliser la revue qualité du rapport **MP-20.5** Mener la revue qualité périodique	Soukaina Bennani 6 juil. 2026	Revue qualité : 11/12 points conformes ; corriger « sources citées pour chaque chiffre ». Résultat : validé après correction.
UFT-03-09 **Séquencer et budgéter la feuille de route**	**MP-04.6** Séquencer les initiatives de la feuille de route **MP-18.1** Répartir le budget par thème et par site	Amine Lahlou 9 juil. 2026	Feuille de route : T2 Triage IA et aide à la décision clinique (6 groupes) ; T3 ISO 7101 (4 groupes) ; T4 Assistance IA en imagerie médicale (3 groupes). Total 1 240 000 MAD.
UFT-03-10 **Approuver et publier le rapport et la feuille de route**	**MP-04.7** Soumettre la feuille de route pour approbation **MP-04.8** Enregistrer l'approbation de la feuille de route **MP-04.9** Publier le rapport et la feuille de route approuvés *+ 1 autres étapes*	Hicham Naciri 12 juil. 2026	Décision : Approuver le rapport et la feuille de route v1. Justification : dans le budget, reliés à OS-1/OS-2. Publier à toutes les parties prenantes.

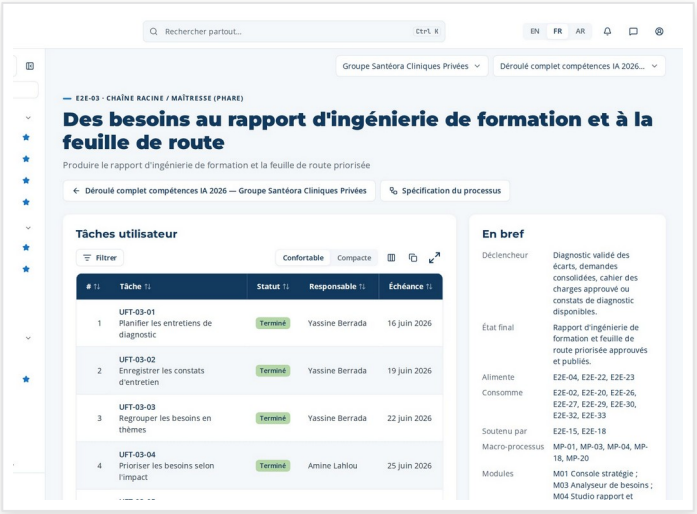

La page de E2E-03 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Alimente
E2E-04, E2E-22, E2E-23
Soutenu par
E2E-15, E2E-18

De la priorisation au plan de ressources

Prioriser les thèmes et planifier jours, groupes, formateurs et budget


DÉCLENCHEUR
Thèmes de formation consolidés à prioriser et dont les ressources sont à planifier.

ÉTAT FINAL
Plan de formation priorisé approuvé avec jours par thème, planification des groupes, affectation des formateurs et budget.

7 tâches · 12 étapes
20 jours · 5 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-49 Priorisation du plan de formation et planification des ressources · MP-04 Élaboration du rapport d'ingénierie de formation et de la feuille de route · MP-18 Gestion financière et budgétaire · MP-11 Administration et opérations · MP-07 Réalisation et mise en œuvre de la formation

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-30-01 **Consolider les thèmes de formation**	**MP-49.1** Consolider les thèmes de formation	Yassine Berrada 15 juin 2026	Liste consolidée : 9 thèmes issus des besoins, demandes, GPEC et SWOT.
UFT-30-02 **Définir les critères de priorisation**	**MP-49.2** Définir les critères de priorisation	Amine Lahlou 18 juin 2026	Critères : impact stratégique 40 %, urgence 30 %, nombre d'apprenants 20 %, coût 10 %.
UFT-30-03 **Prioriser les thèmes**	**MP-49.3** Prioriser les thèmes	Amine Lahlou 21 juin 2026	Rang 1 Triage IA et aide à la décision clinique (score 86) ; rang 2 ISO 7101 (81) ; rang 3 Assistance IA en imagerie médicale (74).
UFT-30-04 **Estimer les jours par thème**	**MP-49.4** Estimer les jours par thème	Hamza Sefrioui 24 juin 2026	Triage IA et aide à la décision clinique : 3 jours par groupe ; ISO 7101 : 2 jours ; Assistance IA en imagerie médicale : 1,5 jour.

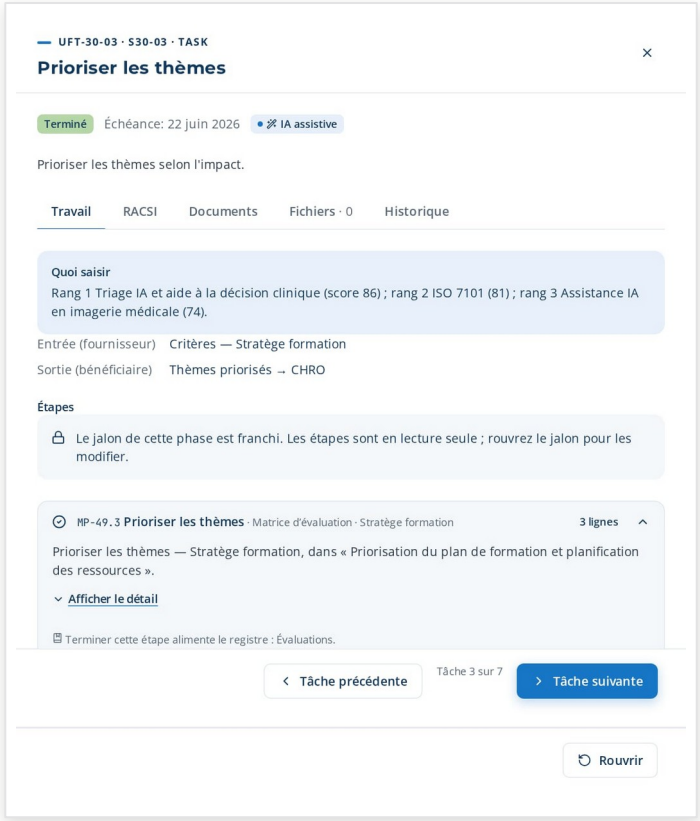


UFT-30-03 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

De la priorisation au plan de ressources (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-30-05 **Définir les groupes par thème**	**MP-49.5** Définir le nombre de groupes par thème **MP-49.6** Affecter les formateurs	Hamza Sefrioui 27 juin 2026	Triage IA et aide à la décision clinique : 6 groupes de 12 ; ISO 7101 : 4 groupes ; Assistance IA en imagerie médicale : 3 groupes.
UFT-30-06 **Affecter formateurs et budget**	**MP-49.7** Estimer le budget du plan **MP-49.8** Séquencer la réalisation **MP-49.9** Valider le plan en gouvernance	Kawtar Chraibi 30 juin 2026	Formateurs : 2 internes, prestataire A ; budget 1 240 000 MAD (dans l'enveloppe).
UFT-30-07 **Publier le plan de formation priorisé**	**MP-49.10** Publier le plan priorisé **MP-49.11** Suivre l'exécution du plan **MP-49.12** Rendre compte de l'utilisation des ressources	Hicham Naciri 3 juil. 2026	Publier le plan de formation priorisé RPT-002 2026 à toutes les parties prenantes.

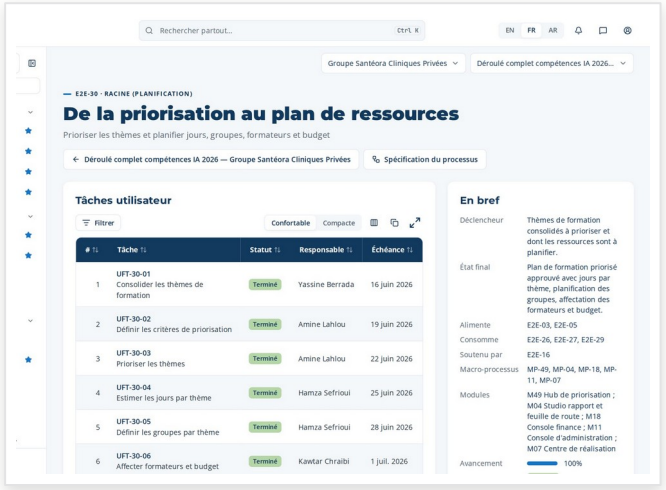

La page de E2E-30 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-49 Priorisation du plan de formation et planification des ressources
- MP-04 Élaboration du rapport d'ingénierie de formation et de la feuille de route
- MP-18 Gestion financière et budgétaire
- MP-11 Administration et opérations
- MP-07 Réalisation et mise en œuvre de la formation

Alimente

E2E-03, E2E-05

Soutenu par

E2E-16

Du plan multi-sites au déploiement

Adapter et déployer les plans sur les sites


DÉCLENCHEUR
Feuille de route approuvée pour une organisation à plusieurs sites ou entités.

ÉTAT FINAL
Plans de site adaptés, validés et déployés, avec escalade des écarts.

8 tâches · 12 étapes
23 jours · 4 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-40 Déploiement du plan de formation multi-sites / multi-entités · MP-04 Élaboration du rapport d'ingénierie de formation et de la feuille de route · MP-07 Réalisation et mise en œuvre de la formation · MP-11 Administration et opérations · MP-23 Localisation, accessibilité et inclusion

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-22-01 **Découper le plan par site**	**MP-40.1** Découper le plan par site	Hicham Naciri 15 juin 2026	Découper le plan en 3 sites : Casablanca 55 %, Tanger 30 %, Agadir 15 %.
UFT-22-02 **Adapter le plan de site aux contraintes locales**	**MP-40.2** Adapter le plan de site aux contraintes locales	Imane Hajji 18 juin 2026	Tanger : contraintes de postes → sessions de 4 heures au lieu de journées complètes.
UFT-22-03 **Localiser les supports du site**	**MP-23.1** Demander une traduction **MP-23.3** Valider la traduction **MP-23.6** Revoir l'équité de participation *+ 1 autres étapes*	Ghita Bouzidi 21 juin 2026	Supports d'Agadir traduits en AR ; validés par l'expert du site.
UFT-22-04 **Valider le plan de site**	**MP-40.3** Valider le plan de site	Hicham Naciri 24 juin 2026	Plans des sites validés au siège ; écart budgétaire dans ±5 %.
UFT-22-05 **Planifier les sessions du site**	**MP-07.1** Créer la session de formation **MP-11.1** Réserver salles et équipements	Reda Hajji 27 juin 2026	Planning Tanger : 8 sessions, salles réservées, 2 formateurs.
UFT-22-06 **Déployer le planning du site**	**MP-40.4** Déployer le planning du site	Imane Hajji 30 juin 2026	Plannings déployés et communiqués aux directeurs de site.

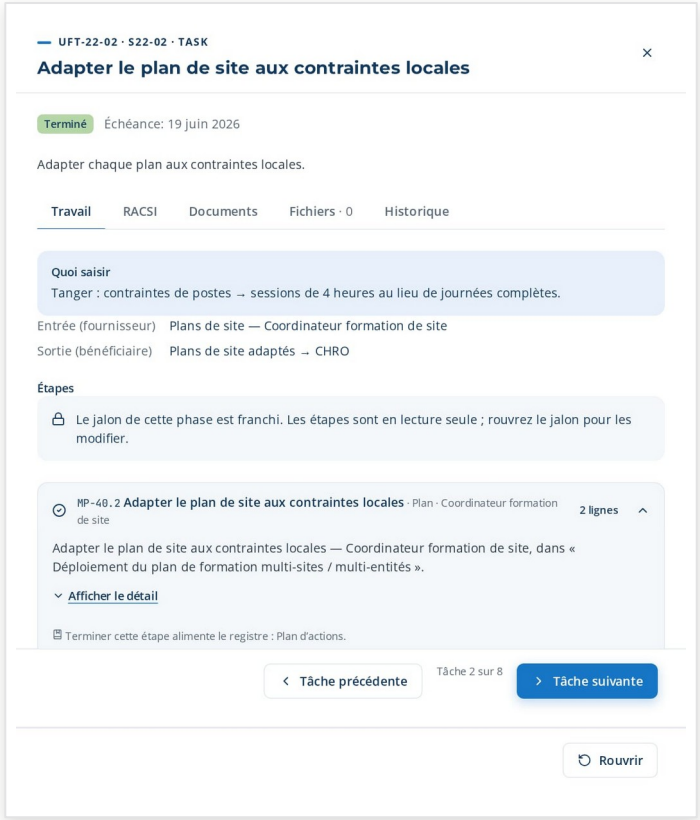


UFT-22-02 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

Du plan multi-sites au déploiement (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-22-07 **Consolider le statut des sites**	**MP-40.5** Consolider le statut des sites	Hicham Naciri 3 juil. 2026	Statut : Casablanca 70 %, Tanger 45 %, Agadir 20 % réalisés.
UFT-22-08 **Escalader un écart de site**	**MP-40.6** Escalader un écart de site	Hicham Naciri 6 juil. 2026	Escalader l'écart d'Agadir (-25 %) à la DRH avec un plan de rattrapage.

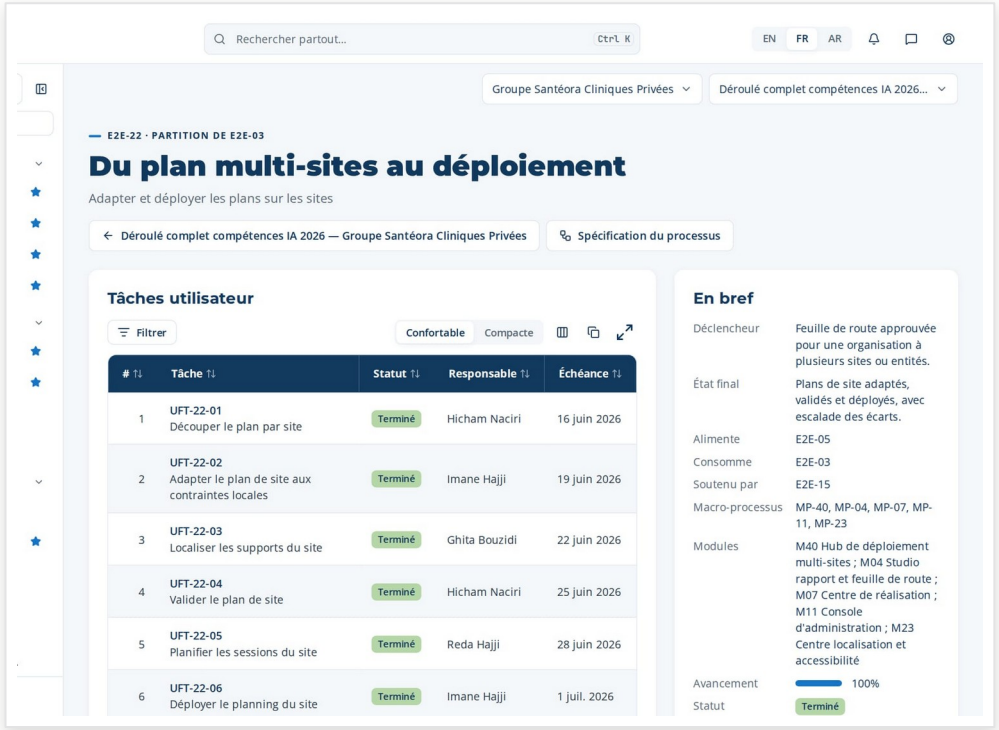

La page de E2E-22 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-40 Déploiement du plan de formation multi-sites / multi-entités
- MP-04 Élaboration du rapport d'ingénierie de formation et de la feuille de route
- MP-07 Réalisation et mise en œuvre de la formation
- MP-11 Administration et opérations
- MP-23 Localisation, accessibilité et inclusion

Alimente

E2E-05

Soutenu par

E2E-15

De la soumission réglementaire à la validation

Soumettre et faire valider les plans de formation auprès des organismes réglementaires


DÉCLENCHEUR
Plan approuvé nécessitant une validation ou un financement externe (ex. OFPPT, GIAC-Agro).

ÉTAT FINAL
Plan validé par l'organisme réglementaire et preuves archivées.

7 tâches · 10 étapes
20 jours · 2 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-41 Validation externe du plan de formation et conformité réglementaire · MP-14 Gestion de la conformité et des certifications · MP-18 Gestion financière et budgétaire · MP-20 Qualité, risques et amélioration continue

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-23-01 **Choisir le modèle réglementaire**	**MP-41.1** Choisir le modèle réglementaire	Rachid Kettani 15 juin 2026	Modèle : contrats spéciaux de formation OFPPT (CSF) — dossier plan.
UFT-23-02 **Générer le dossier de soumission**	**MP-41.2** Générer le dossier de soumission **MP-20.5** Mener la revue qualité périodique	Rachid Kettani 18 juin 2026	Dossier de dépôt généré : plan, thèmes, prestataires, coûts ; contrôle qualité réussi.
UFT-23-03 **Soumettre le plan à l'organisme réglementaire**	**MP-41.3** Soumettre le plan à l'organisme réglementaire	Rachid Kettani 21 juin 2026	Déposé au comité régional le 5 mars ; référence GSF-2026-118.
UFT-23-04 **Suivre le statut de la soumission**	**MP-41.4** Suivre le statut de la soumission	Rachid Kettani 24 juin 2026	Statut : pièce complémentaire demandée (agrément du prestataire) — envoyée le 12 mars.
UFT-23-05 **Enregistrer la décision du régulateur**	**MP-41.5** Enregistrer la décision du régulateur **MP-14.1** Enregistrer une exigence réglementaire	Rachid Kettani 27 juin 2026	Décision : approuvé avec un plafond de 520 000 MAD.

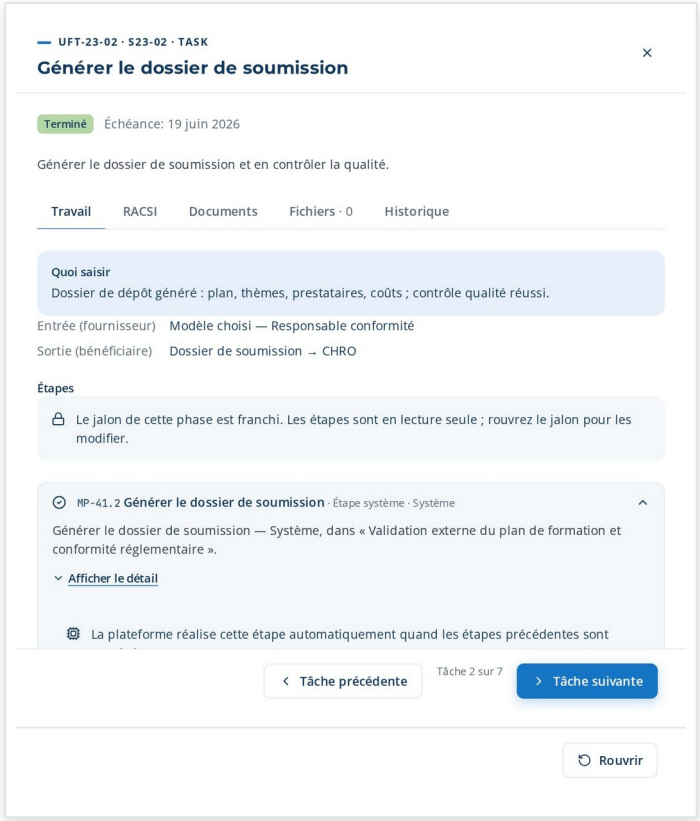


UFT-23-02 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

De la soumission réglementaire à la validation (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-23-06 **Déposer les demandes de remboursement**	**MP-18.5** Déposer les demandes de remboursement	Kawtar Chraibi 30 juin 2026	Demandes de remboursement déposées pour 12 actions réalisées : 318 000 MAD.
UFT-23-07 **Archiver les preuves de soumission**	**MP-41.6** Archiver les preuves de soumission **MP-18.6** Clôturer la période budgétaire	Rachid Kettani 3 juil. 2026	Archiver dossier, décision et demandes ; conservation 10 ans.

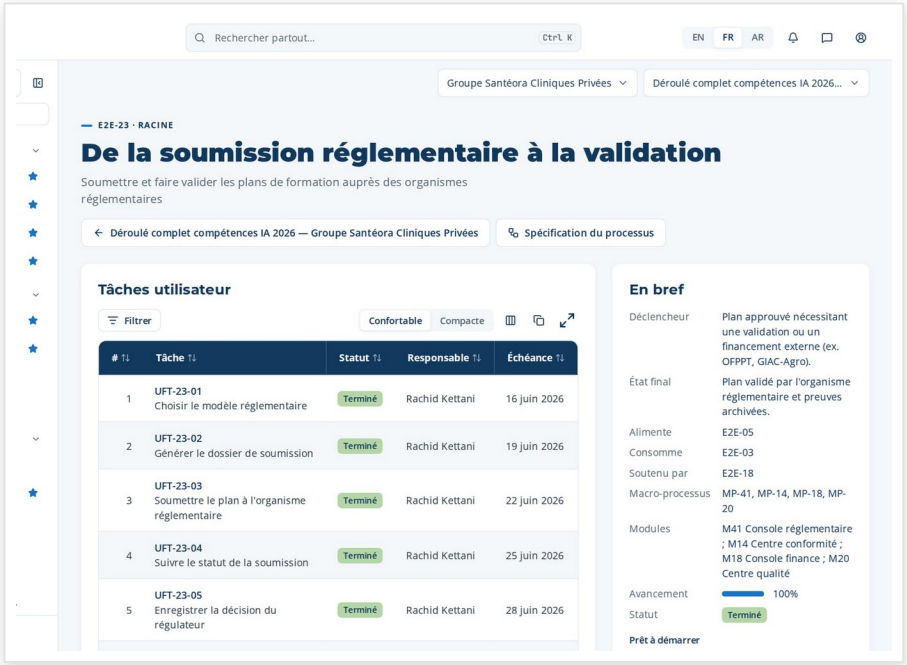

La page de E2E-23 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-41 Validation externe du plan de formation et conformité réglementaire
- MP-14 Gestion de la conformité et des certifications
- MP-18 Gestion financière et budgétaire
- MP-20 Qualité, risques et amélioration continue

Alimente

E2E-05

Soutenu par

E2E-18

Du prestataire à la finance

Gérer les prestataires de la sélection au paiement


DÉCLENCHEUR
Besoin de formation nécessitant un prestataire externe.

ÉTAT FINAL
Prestataire choisi, commande émise et paiement approuvé sur la base de la présence.

6 tâches · 10 étapes
17 jours · 3 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-15 Gestion des prestataires et partenaires · MP-18 Gestion financière et budgétaire · MP-11 Administration et opérations

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-16-01 **Émettre un appel d'offres**	**MP-15.1** Émettre un appel d'offres	Youssef Hajji 15 juin 2026	Appel d'offres « Formation Triage IA et aide à la décision clinique » envoyé à 4 prestataires, réponses le 15 mai.
UFT-16-02 **Noter les offres des prestataires**	**MP-15.2** Noter les offres des prestataires	Youssef Hajji 18 juin 2026	Notes : prestataire A 82, B 76, C 64 (prix 40 %, expertise 40 %, références 20 %).
UFT-16-03 **Enregistrer et vérifier le prestataire**	**MP-15.3** Enregistrer la fiche prestataire **MP-15.4** Vérifier l'accréditation du prestataire	Youssef Hajji 21 juin 2026	Enregistrer le prestataire A ; agrément OFPPT vérifié, valable jusqu'en décembre.
UFT-16-04 **Émettre le bon de commande**	**MP-15.5** Émettre le bon de commande **MP-18.3** Enregistrer les engagements et coûts réels	Youssef Hajji 24 juin 2026	Bon de commande PO-2026-044 : 180 000 MAD sur la ligne budgétaire « Triage IA et aide à la décision clinique ».
UFT-16-05 **Rapprocher facture, commande et présence**	**MP-15.6** Rapprocher facture, commande et présence **MP-11.5** Rapprocher présences et factures	Reda Hajji 27 juin 2026	Facture rapprochée du bon de commande et de la présence (3 jours × 12 apprenants) : conforme.

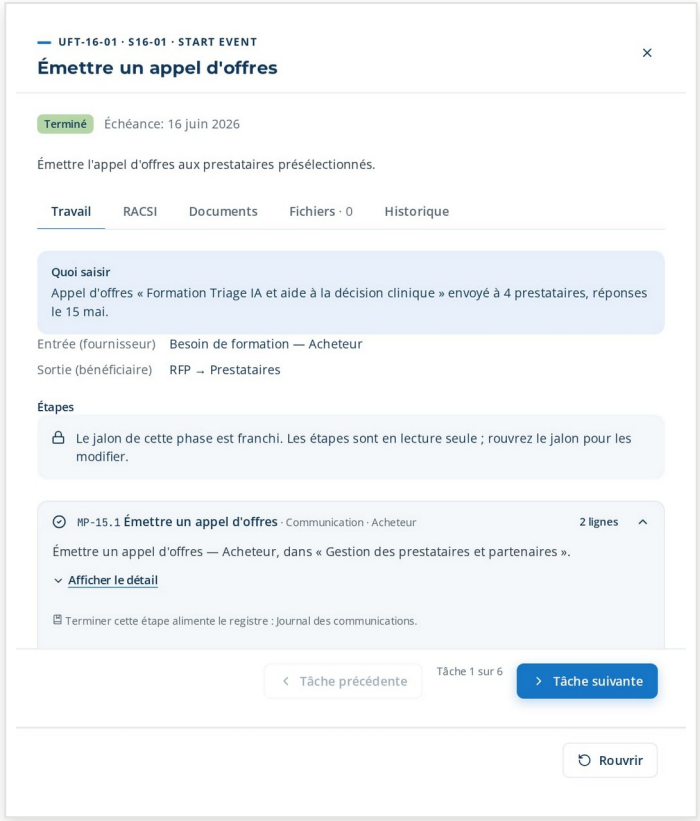


UFT-16-01 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

Du prestataire à la finance (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-16-06 **Approuver le paiement du prestataire**	**MP-15.7** Approuver le paiement du prestataire **MP-18.4** Comparer les dépenses au budget	Kawtar Chraibi 30 juin 2026	Approuver le paiement de 180 000 MAD ; évaluation du prestataire 4/5.

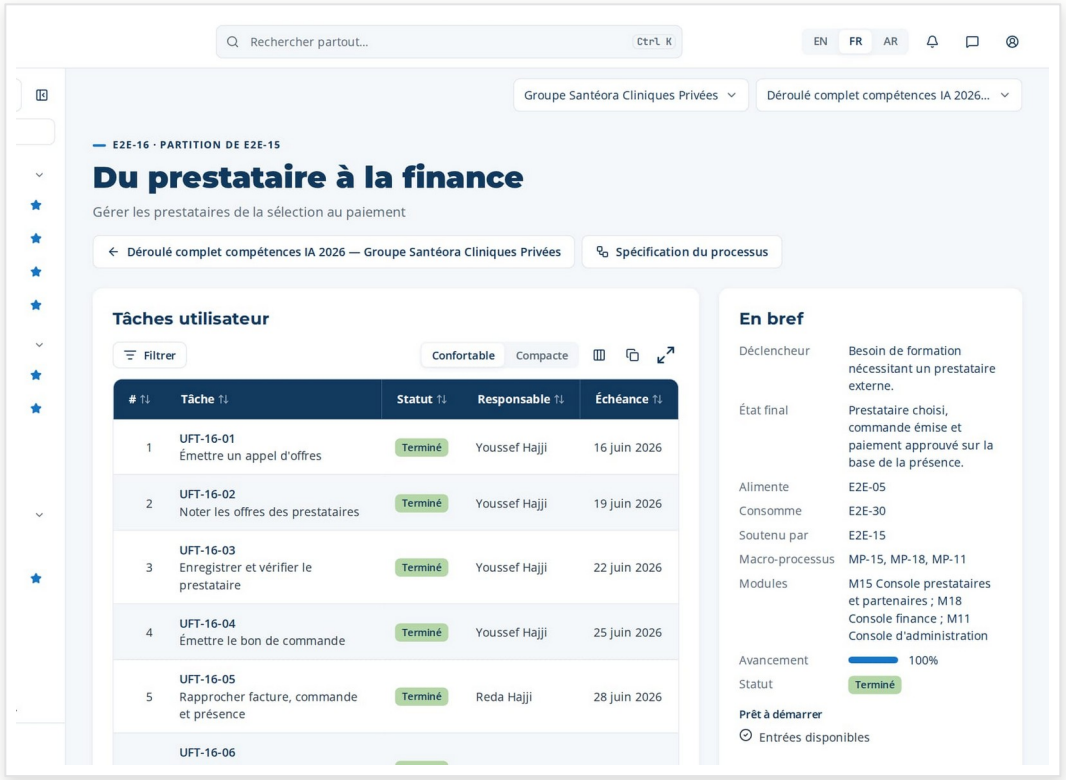

La page de E2E-16 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-15 Gestion des prestataires et partenaires
- MP-18 Gestion financière et budgétaire
- MP-11 Administration et opérations

Alimente

E2E-05

Soutenu par

E2E-15

Des compétences critiques au plan de transformation — Établissements de santé

Transformer les écarts de compétences critiques et les cas d'usage numériques et IA en plan de transformation.


DÉCLENCHEUR
Cycle annuel du plan ou évolution technologique dans le secteur Établissements de santé.

ÉTAT FINAL
Parcours de transformation approuvés.

4 tâches · 7 étapes
11 jours · 4 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-02 Gestion des compétences · MP-03 Analyse des besoins et diagnostic · MP-05 Conception pédagogique et ingénierie des cursus · HCPR-MP-02 HCPR-MP-02

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-HCPR-E2-01 **Lister les compétences critiques Soins cliniques et infirmiers**	**MP-02.1** Définir les familles et niveaux de compétences **MP-03.1** Calculer la matrice des écarts	Yassine Berrada 15 juin 2026	Compétences critiques : 6 pour Soins cliniques et infirmiers, chacune au niveau cible 3.
UFT-HCPR-E2-02 **Lister les cas d'usage numériques et IA**	**MP-03.3** Planifier les entretiens de diagnostic	Amine Lahlou 18 juin 2026	Cas d'usage : Triage IA et aide à la décision clinique ; Assistance IA en imagerie médicale ; Planification IA des lits et des effectifs.
UFT-HCPR-E2-03 **Prévoir les rôles impactés**	**MP-03.5** Regrouper les besoins en thèmes de formation **MP-28.3** Prévoir les écarts de compétences	Anas Hajji 21 juin 2026	Rôles impactés : encadrants (élevé), opérateurs (moyen) ; accepter la prévision IA.
UFT-HCPR-E2-04 **Approuver les parcours de transformation**	**MP-05.2** Définir le parcours d'apprentissage et les modules **MP-05.7** Approuver le document de conception	Ghita Bouzidi 24 juin 2026	Approuver 2 parcours : « Triage IA et aide à la décision clinique pour encadrants », « Assistance IA en imagerie médicale pour opérateurs ».

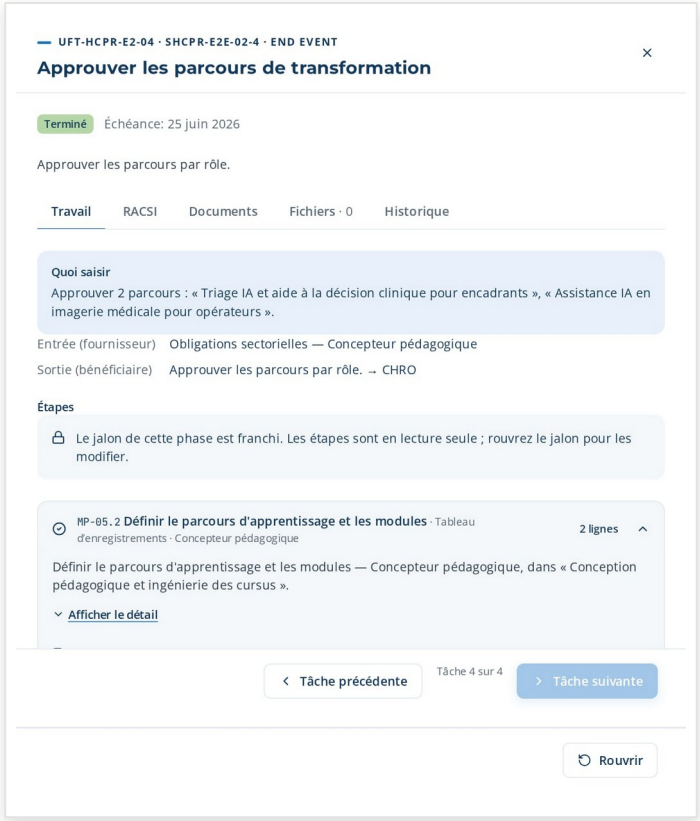

UFT-HCPR-E2-04 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

04

PHASE 4

Conception et déploiement

5 processus · 39 tâches · 99 étapes

11 juil. 2026 – 6 août 2026

Fermée par G4 — Prêt pour le déploiement

E2E-04 De la feuille de route à la conception des cursus

E2E-05 De la conception à la réalisation

E2E-06 Du parcours apprenant à l'engagement

E2E-13 Du contenu à la curation puis au retrait

E2E-14 Formation de l'entreprise étendue

De la feuille de route à la conception des cursus

Convertir la feuille de route en cartes de cursus, parcours et documents de conception


DÉCLENCHEUR
Rapport d'ingénierie de formation et feuille de route approuvés publiés.

ÉTAT FINAL
Cartes de cursus, parcours d'apprentissage et documents de conception approuvés.

8 tâches · 15 étapes
23 jours · 3 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-04 Élaboration du rapport d'ingénierie de formation et de la feuille de route · MP-05 Conception pédagogique et ingénierie des cursus · MP-06 Gestion des contenus et des ressources · MP-23 Localisation, accessibilité et inclusion

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-04-01 **Créer la carte des cursus**	**MP-05.1** Créer la carte des cursus à partir de la feuille de route	Ghita Bouzidi 13 juil. 2026	Cartographie « Triage IA et aide à la décision clinique » : 3 parcours (opérateurs, encadrants, managers), 9 modules.
UFT-04-02 **Définir les parcours et modules**	**MP-05.2** Définir le parcours d'apprentissage et les modules	Ghita Bouzidi 16 juil. 2026	Parcours « Encadrants — Triage IA et aide à la décision clinique » : 4 modules, 3 jours en mixte (1 jour e-learning, 2 jours d'atelier).
UFT-04-03 **Rédiger les objectifs pédagogiques**	**MP-05.3** Rédiger les objectifs pédagogiques par module	Ghita Bouzidi 19 juil. 2026	Objectif M1 : « À la fin, l'encadrant lit le tableau de bord Triage IA et aide à la décision clinique et décide l'action d'équipe en 5 minutes. »
UFT-04-04 **Proposer la structure des modules**	**MP-05.4** Proposer la structure des modules	Ghita Bouzidi 22 juil. 2026	Accepter la structure proposée (intro, démo, pratique, quiz) ; remplacer le quiz par un cas réel Soins cliniques et infirmiers.

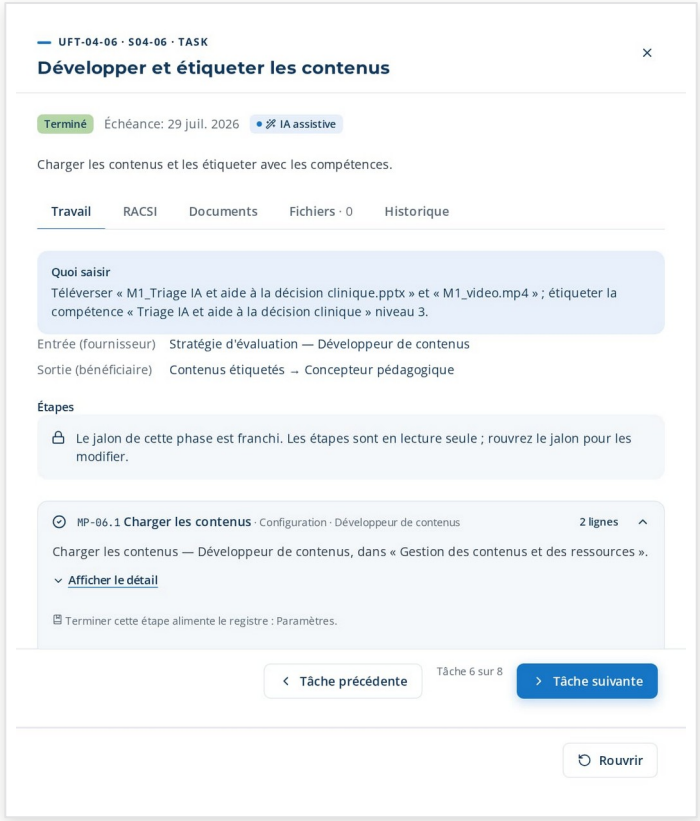


UFT-04-06 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

De la feuille de route à la conception des cursus (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-04-05 **Définir la stratégie d'évaluation**	**MP-05.5** Définir la stratégie d'évaluation	Ghita Bouzidi 25 juil. 2026	Évaluation : test avant/après (niveau 2) et observation du manager à 30 jours (niveau 3).
UFT-04-06 **Développer et étiqueter les contenus**	**MP-06.1** Charger les contenus **MP-06.2** Valider le format du paquet **MP-06.5** Étiqueter le contenu avec les compétences	Anas Hajji 28 juil. 2026	Téléverser « M1_Triage IA et aide à la décision clinique.pptx » et « M1_video.mp4 » ; étiqueter la compétence « Triage IA et aide à la décision clinique » niveau 3.
UFT-04-07 **Localiser et vérifier l'accessibilité**	**MP-23.1** Demander une traduction **MP-23.2** Rédiger une traduction automatique **MP-23.3** Valider la traduction *+ 2 autres étapes*	Ghita Bouzidi 31 juil. 2026	Demander les versions FR et AR ; valider la traduction IA ; contrôle d'accessibilité : 0 anomalie bloquante.
UFT-04-08 **Approuver le document de conception**	**MP-05.6** Revoir la conception avec l'expert métier **MP-05.7** Approuver le document de conception	Hicham Naciri 3 août 2026	Décision : conception approuvée. Commentaire : revue expert faite le 12 mai ; prêt pour le déploiement.

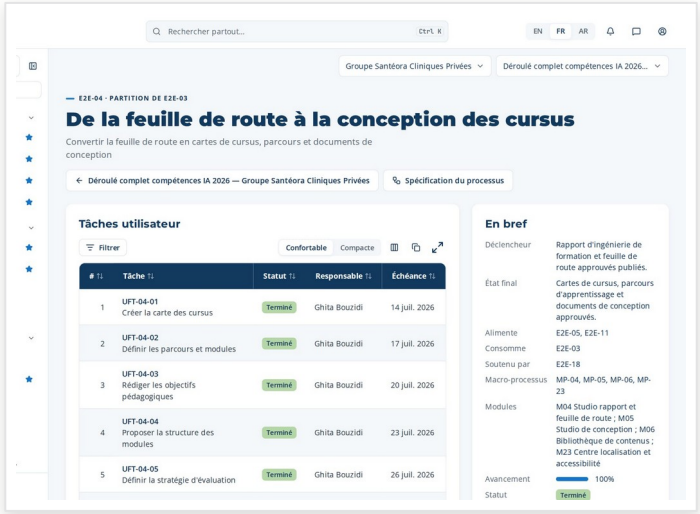

La page de E2E-04 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Alimente
E2E-05, E2E-11
Soutenu par
E2E-18

De la conception à la réalisation

Réaliser la formation selon toutes les modalités


DÉCLENCHEUR
Document de conception approuvé et plan de formation priorisé.

ÉTAT FINAL
Formation réalisée selon toutes les modalités avec présence et achèvement enregistrés.

9 tâches · 27 étapes
26 jours · 4 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-05 Conception pédagogique et ingénierie des cursus · MP-06 Gestion des contenus et des ressources · MP-07 Réalisation et mise en œuvre de la formation · MP-11 Administration et opérations · MP-17 Gestion des identités, des accès et de la sécurité · MP-25 Micro-apprentissage et apprentissage dans le flux de travail · MP-30 Apprentissage immersif (RV/RA/simulation)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-05-01 **Publier le contenu au catalogue**	**MP-06.3** Soumettre le contenu à la revue de l'expert **MP-06.4** Enregistrer la décision de revue **MP-06.6** Publier le contenu au catalogue	Anas Hajji 13 juil. 2026	Publier le module « M1 Triage IA et aide à la décision clinique » au catalogue ; public : encadrants ; langues EN/FR/AR.
UFT-05-02 **Réserver la logistique**	**MP-11.1** Réserver salles et équipements **MP-11.2** Gérer les agendas des formateurs	Reda Hajji 16 juil. 2026	Salle « Formation A » (20 places) du 3 au 5 juin ; vidéoprojecteur ; agenda du formateur bloqué.
UFT-05-03 **Planifier les sessions**	**MP-07.1** Créer la session de formation **MP-07.2** Vérifier les conflits de planning	Reda Hajji 19 juil. 2026	Session S-01 « Triage IA et aide à la décision clinique — encadrants », 3-5 juin, 12 places, aucun conflit.
UFT-05-04 **Inscrire les apprenants et envoyer les convocations**	**MP-07.3** Inscrire les apprenants à la session **MP-07.4** Envoyer les convocations **MP-17.1** Provisionner les utilisateurs via SSO	Reda Hajji 22 juil. 2026	Inscrire 12 encadrants ; convocations envoyées par e-mail et SMS dans la langue de chacun.

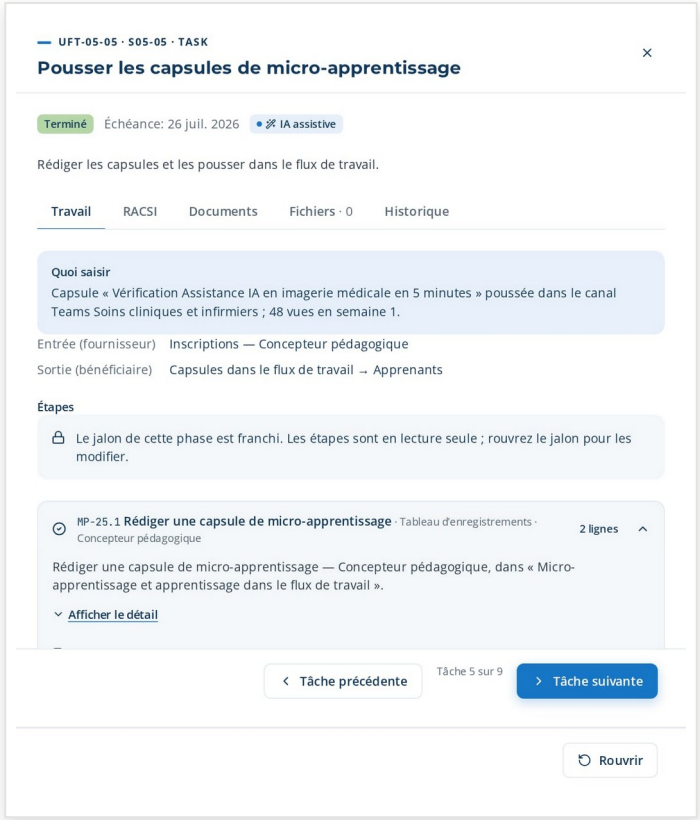


UFT-05-05 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

De la conception à la réalisation (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-05-05 **Pousser les capsules de micro-apprentissage**	**MP-25.1** Rédiger une capsule de micro-apprentissage **MP-25.2** Générer un projet de capsule à partir d'une source **MP-25.3** Pousser la capsule vers un canal collaboratif *+ 2 autres étapes*	Ghita Bouzidi 25 juil. 2026	Capsule « Vérification Assistance IA en imagerie médicale en 5 minutes » poussée dans le canal Teams Soins cliniques et infirmiers ; 48 vues en semaine 1.
UFT-05-06 **Mener les simulations immersives**	**MP-30.1** Définir le scénario de simulation **MP-30.2** Configurer la notation de la simulation **MP-30.3** Lancer la séance de simulation *+ 3 autres étapes*	Zineb Kettani 28 juil. 2026	Simulation « incident Soins cliniques et infirmiers » : score 78/100 ; notes de débriefing enregistrées ; preuves sauvegardées.
UFT-05-07 **Enregistrer la présence**	**MP-07.5** Enregistrer la présence	Zineb Kettani 31 juil. 2026	Présence S-01 : 11 présents, 1 absent (justifié). Feuille d'émargement jointe.
UFT-05-08 **Clôturer les sessions**	**MP-07.6** Clôturer la session et enregistrer l'achèvement	Reda Hajji 3 août 2026	Clôturer S-01 : 11 réussites enregistrées ; attestation remise à chaque participant.
UFT-05-09 **Rapprocher et archiver la période**	**MP-11.5** Rapprocher présences et factures **MP-11.6** Archiver les dossiers de la période **MP-11.3** Importer les dossiers de formation externes *+ 1 autres étapes*	Reda Hajji 6 août 2026	Rapprocher la facture INV-2026-118 (3 jours × 12 apprenants) de la présence ; archiver la période T2.

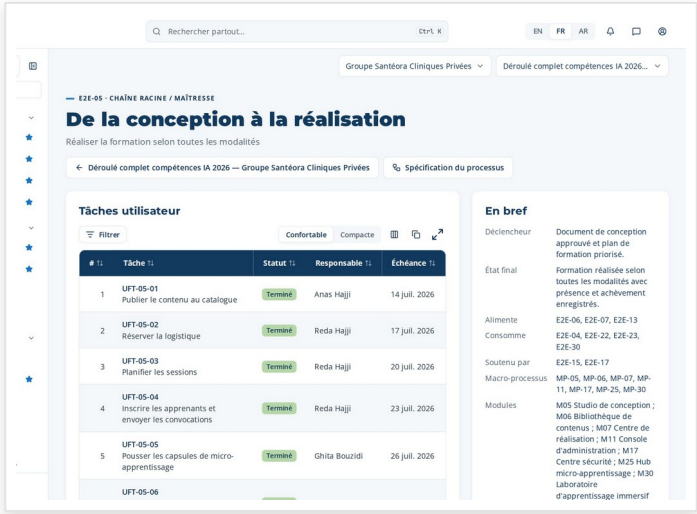

La page de E2E-05 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Alimente
E2E-06, E2E-07, E2E-13
Soutenu par
E2E-15, E2E-17

Du parcours apprenant à l'engagement

Offrir une expérience d'apprentissage personnalisée et engageante


DÉCLENCHEUR
Apprenant inscrit à un parcours ou à une session.

ÉTAT FINAL
Parcours apprenant personnalisé terminé avec engagement mesuré.

8 tâches · 33 étapes
23 jours · 5 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-08 Expérience et engagement des apprenants · MP-24 Personnalisation par l'IA et apprentissage adaptatif · MP-25 Micro-apprentissage et apprentissage dans le flux de travail · MP-26 Réseaux d'apprentissage social et collaboratif · MP-27 Ludification et mécanismes d'engagement

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-06-01 **Générer le plan d'apprentissage personnel**	**MP-08.1** Générer le plan d'apprentissage personnel	Yassine Berrada 13 juil. 2026	Plan personnel généré pour chaque apprenant : 3 éléments sur Triage IA et aide à la décision clinique, 1 capsule sur Assistance IA en imagerie médicale.
UFT-06-02 **Recommander des éléments d'apprentissage**	**MP-08.2** Recommander des éléments d'apprentissage **MP-24.1** Activer la personnalisation par périmètre	Reda Sefrioui 16 juil. 2026	Accepter 2 recommandations, en rejeter 1 (« déjà maîtrisé »). Le résultat est journalisé.
UFT-06-03 **Adapter le parcours à la performance**	**MP-24.2** Définir les règles d'adaptation **MP-24.3** Adapter le parcours à la performance de l'apprenant **MP-24.4** Enregistrer la réponse de l'apprenant à l'adaptation	Ghita Bouzidi 19 juil. 2026	Règle : si le score du quiz < 60 %, ajouter la capsule de remédiation « bases Triage IA et aide à la décision clinique ».

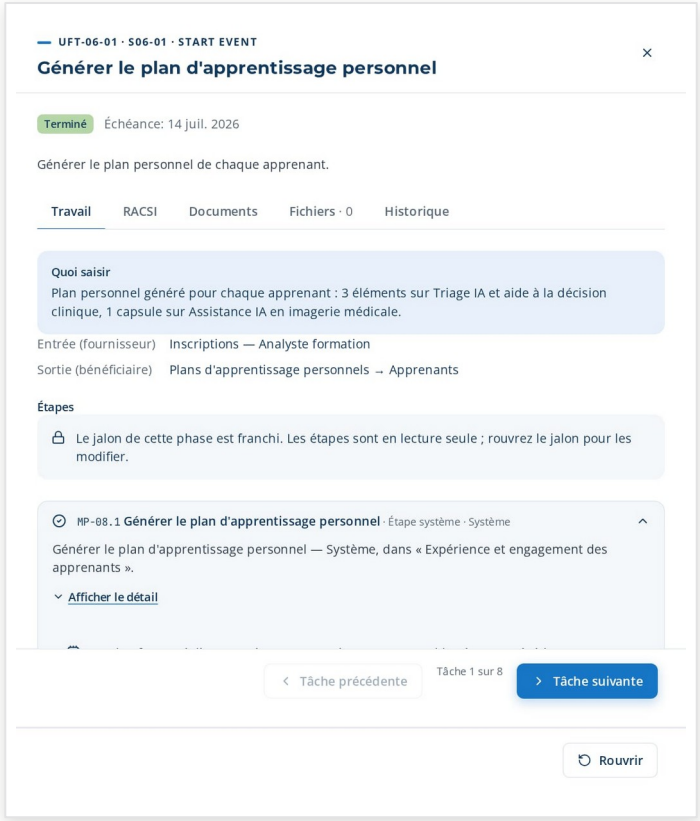


UFT-06-01 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

Du parcours apprenant à l'engagement (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-06-04 **Animer l'apprentissage social**	**MP-26.1** Créer une cohorte d'apprentissage **MP-26.2** Inviter les membres du groupe **MP-26.3** Publier une question ou une réponse *+ 3 autres étapes*	Asmae Ziani 22 juil. 2026	Créer la cohorte « Encadrants Triage IA et aide à la décision clinique 2026 » et inviter 12 membres ; première question postée.
UFT-06-05 **Animer la ludification**	**MP-27.1** Définir les règles de points et de badges **MP-27.2** Configurer le périmètre du classement **MP-27.3** Attribuer des points à l'achèvement *+ 2 autres étapes*	Ghita Bouzidi 25 juil. 2026	Badge « Praticien Triage IA et aide à la décision clinique » pour 3 modules terminés ; 10 points par capsule.
UFT-06-06 **Associer et mener le coaching**	**MP-21.1** Demander un coaching **MP-21.2** Associer un coach à l'apprenant **MP-21.3** Planifier les séances de coaching *+ 3 autres étapes*	Nadia Lahlou 28 juil. 2026	Associer le coach « Encadrant senior Soins cliniques et infirmiers » à 3 apprenants ; 4 séances d'une heure.
UFT-06-07 **Recueillir les retours des apprenants**	**MP-08.3** S'inscrire à l'élément recommandé **MP-08.4** Donner un retour sur l'apprentissage	Reda Sefrioui 31 juil. 2026	Retour : 4,4/5 ; commentaire « plus de cas réels Soins cliniques et infirmiers ».
UFT-06-08 **Suivre l'engagement et relancer**	**MP-08.5** Suivre les indicateurs d'engagement **MP-08.6** Déclencher une relance de réengagement **MP-24.5** Revoir l'acceptation des recommandations *+ 5 autres étapes*	Yassine Berrada 3 août 2026	Engagement 81 % ; relance envoyée à 9 apprenants inactifs ; risque d'abandon élevé pour 2 apprenants.

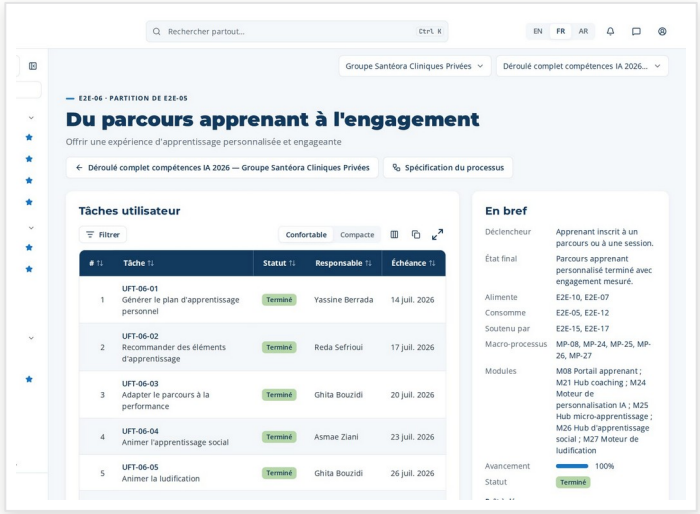

La page de E2E-06 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Alimente
E2E-10, E2E-07
Soutenu par
E2E-15, E2E-17

Du contenu à la curation puis au retrait

Publier, maintenir et retirer les contenus


DÉCLENCHEUR
Nouveau contenu publié ou contenu dont la date de revue est dépassée.

ÉTAT FINAL
Catalogue sélectionné, maintenu et contenus obsolètes retirés.

7 tâches · 12 étapes
20 jours · 3 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-06 Gestion des contenus et des ressources · MP-29 Moteur de curation et d'agrégation de contenus · MP-33 Contenus générés par les utilisateurs et partage de connaissances entre pairs

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-13-01 **Agréger les catalogues fournisseurs**	**MP-29.1** Agréger les catalogues fournisseurs	Hicham Naciri 13 juil. 2026	Agréger 2 catalogues fournisseurs (LinkedIn Learning, Coursera) : 1 240 éléments importés.
UFT-13-02 **Recommander des éléments sélectionnés**	**MP-29.2** Recommander des éléments sélectionnés	Hicham Naciri 16 juil. 2026	Garder les 15 éléments les mieux classés sur Triage IA et aide à la décision clinique ; rejeter 3 éléments de plus de 3 ans.
UFT-13-03 **Approuver et organiser les collections**	**MP-29.3** Approuver l'élément sélectionné **MP-29.4** Organiser une collection	Hicham Naciri 19 juil. 2026	Collection « Kit de démarrage Triage IA et aide à la décision clinique » : 8 éléments, public encadrants, revue dans 12 mois.
UFT-13-04 **Revoir les contenus entre pairs**	**MP-33.1** Soumettre un contenu utilisateur **MP-33.2** Vérifier le contenu au regard de la politique **MP-33.3** Relecture par les pairs	Hamza Lahlou 22 juil. 2026	Vidéo pair « Comment nous utilisons Assistance IA en imagerie médicale au poste » revue par un expert : approuvée avec 1 correction.
UFT-13-05 **Promouvoir et noter les contenus**	**MP-33.5** Transmettre le contenu approuvé à la curation **MP-33.6** Noter un contenu utilisateur	Asmae Ziani 25 juil. 2026	Envoyer le contenu pair approuvé à la curation ; note moyenne des apprenants 4,5/5.

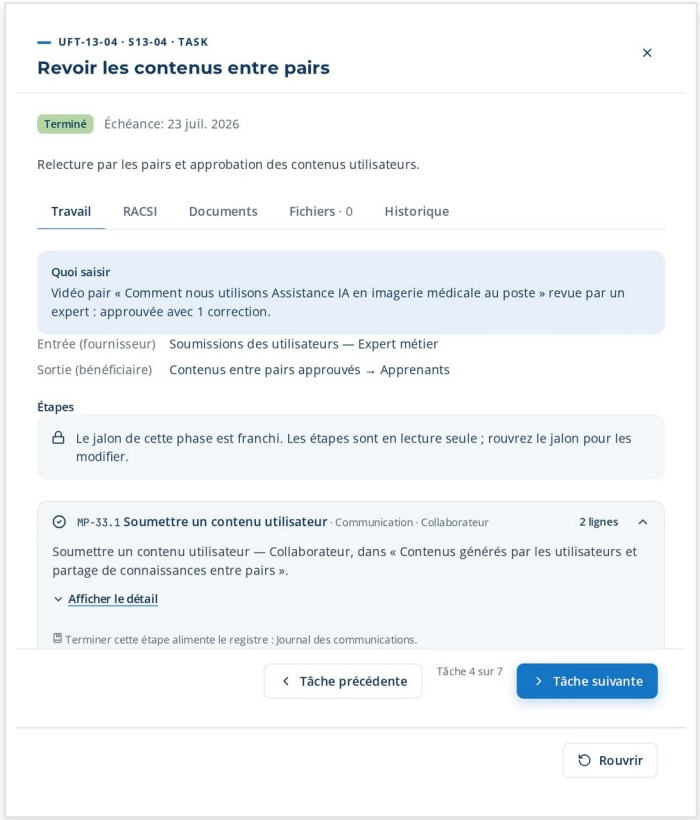


UFT-13-04 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

Du contenu à la curation puis au retrait (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-13-06 **Signaler les contenus dont la date de revue est dépassée**	**MP-29.5** Signaler les contenus dont la date de revue est dépassée	Hicham Naciri 28 juil. 2026	14 éléments dépassant la date de revue signalés ; propriétaires notifiés.
UFT-13-07 **Retirer les contenus obsolètes**	**MP-29.6** Retirer les contenus obsolètes **MP-25.6** Retirer une capsule à faible valeur	Hicham Naciri 31 juil. 2026	Retirer 6 éléments obsolètes et 2 capsules à faible valeur ; santé de la bibliothèque 92 %.

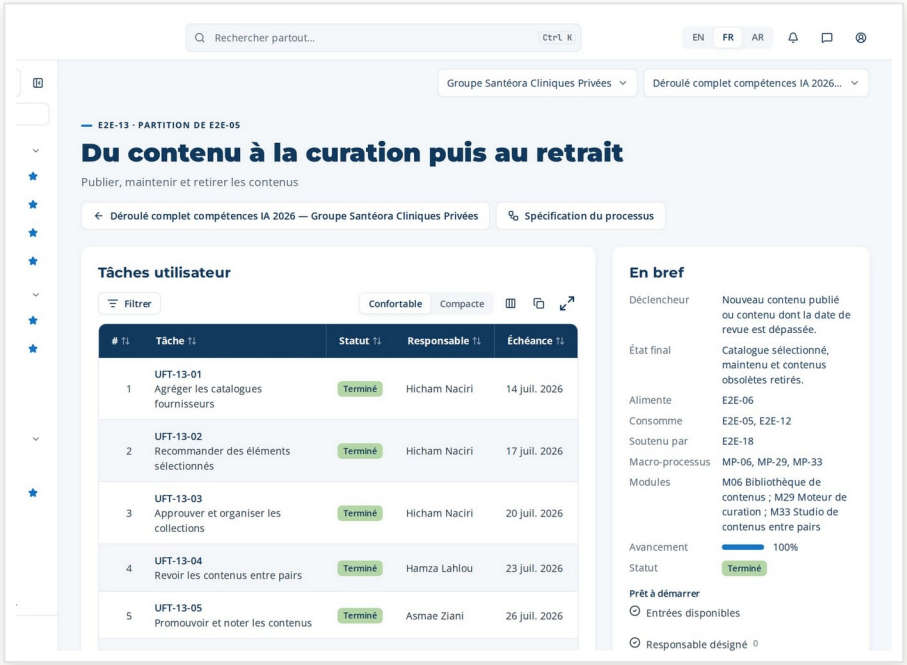

La page de E2E-13 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-06 Gestion des contenus et des ressources
- MP-29 Moteur de curation et d'agrégation de contenus
- MP-33 Contenus générés par les utilisateurs et partage de connaissances entre pairs

Alimente

E2E-06

Soutenu par

E2E-18

Formation de l'entreprise étendue

Certifier les partenaires et former les clients


DÉCLENCHEUR
Lancement d'un programme de formation partenaires, revendeurs ou clients.

ÉTAT FINAL
Apprenants externes formés, facturés et certifiés.

7 tâches · 12 étapes
20 jours · 3 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-22 Entreprise étendue et formation externe · MP-07 Réalisation et mise en œuvre de la formation · MP-14 Gestion de la conformité et des certifications · MP-18 Gestion financière et budgétaire

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-14-01 **Créer un sous-portail externe**	**MP-22.1** Créer un sous-portail externe	Yassine Naciri 13 juil. 2026	Sous-portail « Académie partenaires — Groupe Santéora Cliniques Privées » créé pour distributeurs et installateurs.
UFT-14-02 **Configurer le catalogue et les tarifs**	**MP-22.2** Configurer le catalogue externe et les tarifs **MP-18.1** Répartir le budget par thème et par site	Yassine Naciri 16 juil. 2026	Catalogue : « ISO 7101 pour partenaires » 1 200 MAD ; « Certification Triage IA et aide à la décision clinique » 2 400 MAD.
UFT-14-03 **Traiter le paiement et inscrire**	**MP-22.3** Traiter le paiement en ligne **MP-22.4** Inscrire l'apprenant externe	Yassine Naciri 19 juil. 2026	18 paiements en ligne traités ; 18 apprenants externes inscrits.
UFT-14-04 **Réaliser les sessions externes**	**MP-07.1** Créer la session de formation **MP-07.5** Enregistrer la présence	Reda Hajji 22 juil. 2026	Session P-01 (virtuelle), 18 invités, 16 présents.
UFT-14-05 **Suivre l'achèvement externe**	**MP-22.5** Suivre l'achèvement externe	Yassine Naciri 25 juil. 2026	Achèvement : 15 sur 16 ont réussi le quiz final.

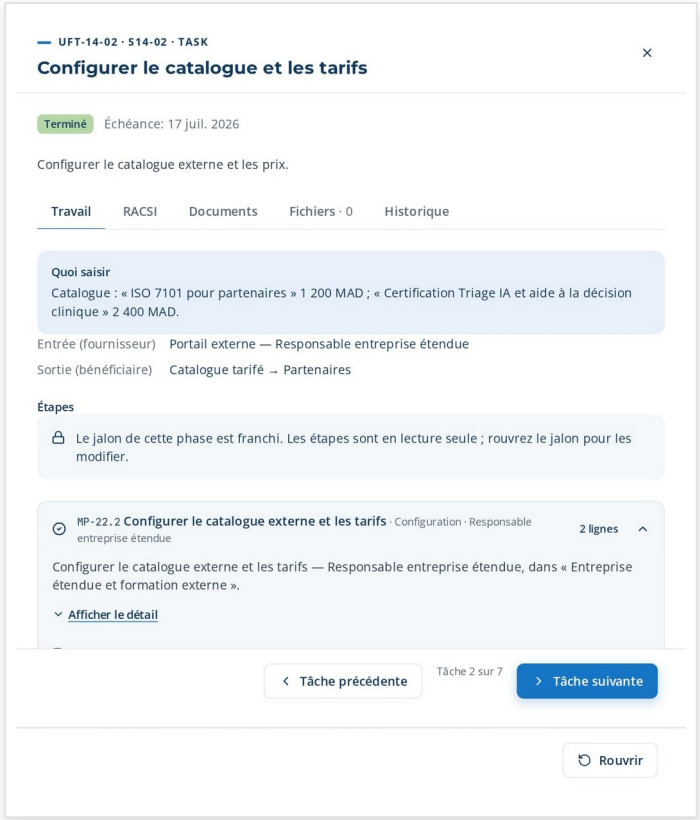


UFT-14-02 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

Formation de l'entreprise étendue (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-14-06 **Délivrer la certification partenaire**	**MP-22.6** Délivrer la certification partenaire **MP-14.4** Délivrer le certificat à l'achèvement	Yassine Naciri 28 juil. 2026	Émettre 15 certificats partenaires valables 2 ans.
UFT-14-07 **Rapprocher les revenus externes**	**MP-18.3** Enregistrer les engagements et coûts réels **MP-18.4** Comparer les dépenses au budget	Kawtar Chraibi 31 juil. 2026	Chiffre d'affaires 43 200 MAD rapproché avec l'ERP ; 0 impayé.

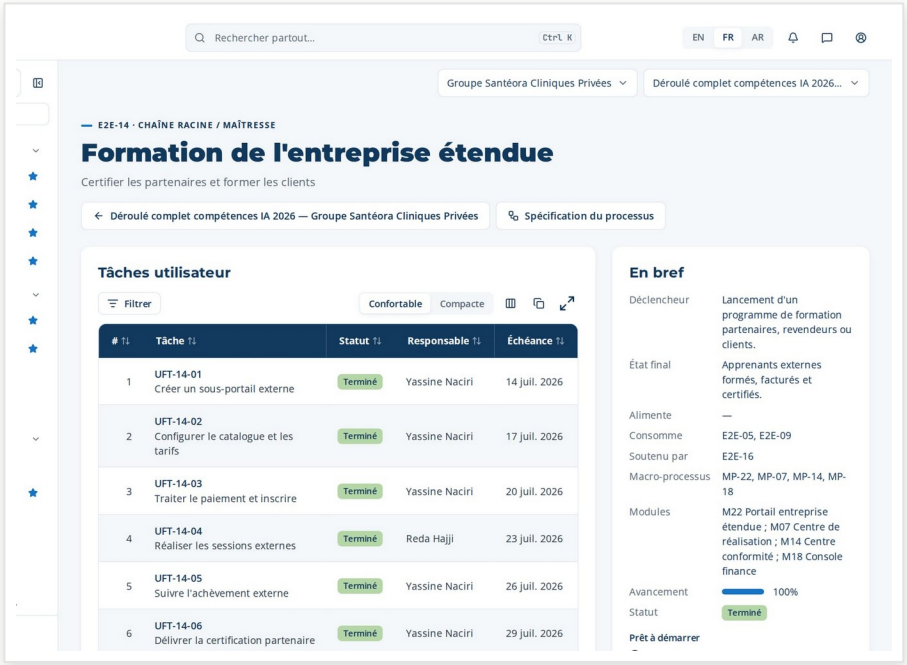

La page de E2E-14 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-22 Entreprise étendue et formation externe
- MP-07 Réalisation et mise en œuvre de la formation
- MP-14 Gestion de la conformité et des certifications
- MP-18 Gestion financière et budgétaire

Alimente

—

Soutenu par

E2E-16

05

PHASE 5

Évaluation, conformité et impact

4 processus · 26 tâches · 43 étapes

8 août 2026 – 31 août 2026

Fermée par G5 — Évaluation et impact validés

E2E-07 De l'évaluation des acquis à l'évaluation de l'efficacité

E2E-08 De l'apprentissage au ROI

E2E-09 De la conformité à la certification

HCPR-E2E-01 Conformité et préparation à la certification — Établissements de santé

De l'évaluation des acquis à l'évaluation de l'efficacité

Mesurer l'efficacité de la formation et la progression des compétences


DÉCLENCHEUR
Session ou parcours de formation terminé.

ÉTAT FINAL
Efficacité mesurée sur les niveaux Kirkpatrick 1 à 3 et progression des compétences calculée.

8 tâches · 12 étapes
23 jours · 4 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-09 Évaluation · MP-10 Reporting et analyses · MP-20 Qualité, risques et amélioration continue

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-07-01 **Créer l'instrument d'évaluation**	**MP-09.1** Créer l'instrument d'évaluation	Ghita Bouzidi 10 août 2026	Instrument « Test Triage IA et aide à la décision clinique M1 » : 15 questions, seuil de réussite 70 %.
UFT-07-02 **Rédiger la banque de questions**	**MP-09.2** Générer un projet de banque de questions	Ghita Bouzidi 13 août 2026	Garder 12 questions rédigées par l'IA, réécrire 3 avec le vocabulaire Soins cliniques et infirmiers ; valider chacune.
UFT-07-03 **Recueillir le questionnaire de satisfaction (niveau 1)**	**MP-09.3** Recueillir le questionnaire de satisfaction (niveau 1)	Yassine Berrada 16 août 2026	Enquête à chaud S-01 : 11 réponses, satisfaction 4,3/5.
UFT-07-04 **Enregistrer les résultats d'apprentissage (niveau 2)**	**MP-09.4** Enregistrer les résultats d'apprentissage (niveau 2)	Zineb Kettani 19 août 2026	Niveau 2 : pré-test moyen 48 %, post-test 81 % (+33 points).
UFT-07-05 **Enregistrer l'observation en situation de travail (niveau 3)**	**MP-09.5** Enregistrer l'observation en situation de travail (niveau 3)	Karim El Idrissi 22 août 2026	Niveau 3 (J+30) : 9 encadrants sur 11 appliquent la routine Triage IA et aide à la décision clinique chaque jour.

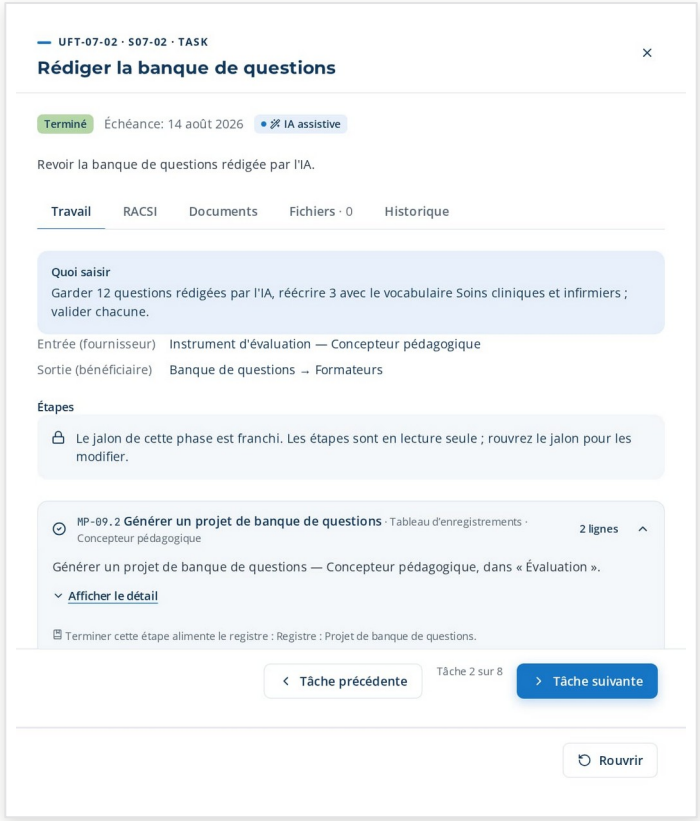

UFT-07-02 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

De l'évaluation des acquis à l'évaluation de l'efficacité (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-07-06 **Calculer la progression des compétences**	**MP-09.6** Calculer la progression des compétences **MP-10.3** Actualiser le calcul des indicateurs	Yassine Berrada 25 août 2026	Progression : Triage IA et aide à la décision clinique de 1,8 à 2,7 (cible 3).
UFT-07-07 **Revoir les résultats d'évaluation**	**MP-09.7** Revoir les résultats d'évaluation **MP-20.5** Mener la revue qualité périodique	Yassine Berrada 28 août 2026	Revue : module M3 sous 70 % de réussite → action d'amélioration confiée au concepteur.
UFT-07-08 **Publier le rapport d'évaluation**	**MP-10.4** Exporter le rapport **MP-10.6** Partager les enseignements avec les parties prenantes **MP-10.2** Configurer les widgets du tableau de bord	Yassine Berrada 31 août 2026	Exporter le rapport Kirkpatrick RPT-016 (PDF) et le partager au comité de pilotage.



La page de E2E-07 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-09 Évaluation
- MP-10 Reporting et analyses
- MP-20 Qualité, risques et amélioration continue

Alimente

E2E-08, E2E-21

Soutenu par

E2E-18

De l'apprentissage au ROI

Valider le ROI et l'impact métier


DÉCLENCHEUR
Résultats d'évaluation disponibles pour un thème choisi pour une étude de ROI.

ÉTAT FINAL
ROI Phillips validé avec la finance et rapport d'impact métier publié.

7 tâches · 12 étapes
20 jours · 3 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-09 Évaluation · MP-10 Reporting et analyses · MP-18 Gestion financière et budgétaire · MP-32 ROI de la formation et mesure de l'impact métier

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-08-01 **Choisir le thème de l'étude ROI**	**MP-32.1** Choisir le thème de l'étude ROI	Anas Hajji 10 août 2026	Étude ROI sur le thème « Triage IA et aide à la décision clinique » — population : 36 encadrants, 3 sites.
UFT-08-02 **Définir les indicateurs métier**	**MP-32.2** Définir les indicateurs métier **MP-10.1** Définir le jeu d'indicateurs par public	Anas Hajji 13 août 2026	Indicateurs : taux de reprise, minutes d'arrêt par poste, heures de ressaisie.
UFT-08-03 **Collecter les données de coûts**	**MP-18.3** Enregistrer les engagements et coûts réels **MP-18.4** Comparer les dépenses au budget	Kawtar Chraibi 16 août 2026	Coûts : conception 60 000 MAD ; animation 180 000 MAD ; temps des participants 95 000 MAD.
UFT-08-04 **Isoler l'effet de la formation**	**MP-32.3** Isoler l'effet de la formation **MP-09.6** Calculer la progression des compétences	Anas Hajji 19 août 2026	Groupe témoin : site B (non formé). Bénéfice isolé : 410 000 MAD par an.
UFT-08-05 **Calculer le ROI Phillips**	**MP-32.4** Calculer le ROI Phillips	Anas Hajji 22 août 2026	ROI = (410 000 − 335 000) / 335 000 = 22 % ; ratio bénéfice-coût 1,22.

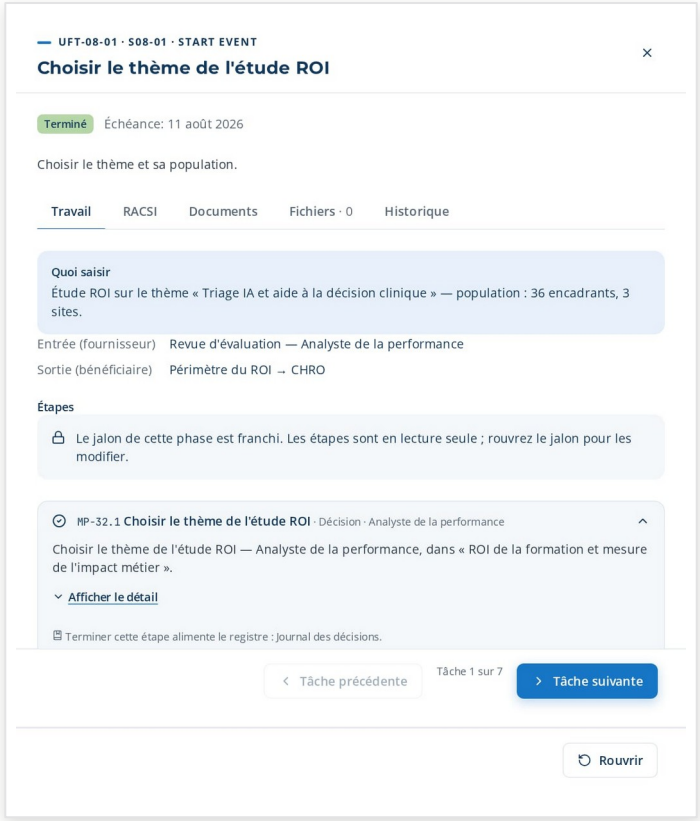


UFT-08-01 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

De l'apprentissage au ROI (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-08-06 **Revoir le ROI avec la finance**	**MP-32.5** Revoir le ROI avec la finance	Kawtar Chraibi 25 août 2026	Revue finance : hypothèses acceptées ; arrêt valorisé à 180 MAD la minute.
UFT-08-07 **Publier le rapport d'impact métier**	**MP-32.6** Publier le rapport d'impact métier **MP-10.4** Exporter le rapport **MP-10.5** Interroger les données via l'assistant IA	Hicham Naciri 28 août 2026	Publier le rapport RPT-012 ROI et impact métier à la direction générale.

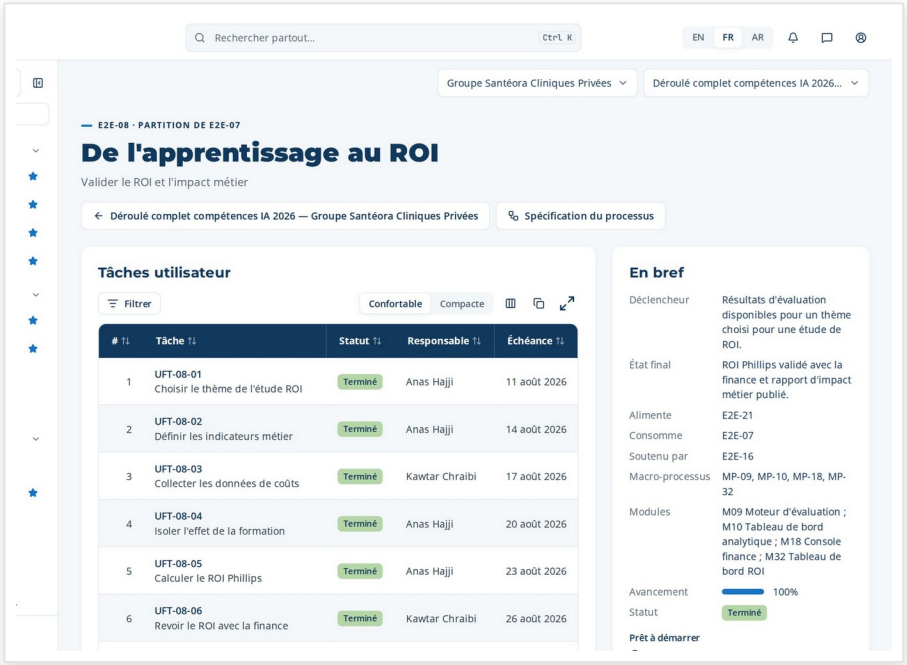

La page de E2E-08 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-09 Évaluation
- MP-10 Reporting et analyses
- MP-18 Gestion financière et budgétaire
- MP-32 ROI de la formation et mesure de l'impact métier

Alimente

E2E-21

Soutenu par

E2E-16

De la conformité à la certification

Garantir un personnel conforme avec des certifications valides


DÉCLENCHEUR
Nouvelle exigence réglementaire ou certification proche de l'expiration.

ÉTAT FINAL
Personnel conforme avec certifications valides et extrait d'audit disponible.

7 tâches · 11 étapes
20 jours · 3 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-14 Gestion de la conformité et des certifications · MP-07 Réalisation et mise en œuvre de la formation · MP-09 Évaluation · MP-10 Reporting et analyses

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-09-01 **Enregistrer une exigence réglementaire**	**MP-14.1** Enregistrer une exigence réglementaire	Rachid Kettani 10 août 2026	Exigence « Sensibilisation ISO 7101 », tous les 24 mois, source : clause compétences de ISO 7101.
UFT-09-02 **Affecter les formations obligatoires**	**MP-14.2** Affecter les formations obligatoires par poste	Rachid Kettani 13 août 2026	Affecter aux postes : opérateur Soins cliniques et infirmiers, encadrant Soins cliniques et infirmiers, contrôleur qualité.
UFT-09-03 **Réaliser les sessions obligatoires**	**MP-07.3** Inscrire les apprenants à la session **MP-07.5** Enregistrer la présence	Reda Hajji 16 août 2026	Inscrire 24 salariés à la session « Sensibilisation ISO 7101 » ; présence enregistrée.
UFT-09-04 **Évaluer et certifier**	**MP-09.4** Enregistrer les résultats d'apprentissage (niveau 2) **MP-14.4** Délivrer le certificat à l'achèvement	Zineb Kettani 19 août 2026	Résultat 86 % ; certificat « Sensibilisation ISO 7101 » émis, valable jusqu'à 2026+2.
UFT-09-05 **Calculer la validité des certifications**	**MP-14.3** Calculer la validité des certifications	Rachid Kettani 22 août 2026	Validité : 212 valides, 9 expirent sous 60 jours, 3 expirés.

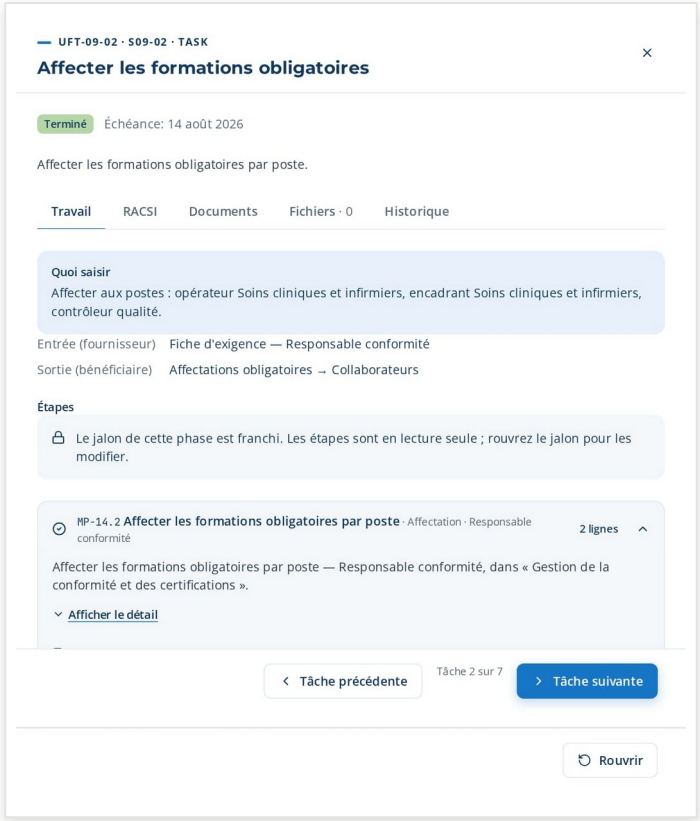


UFT-09-02 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

De la conformité à la certification (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-09-06 **Gérer les renouvellements**	**MP-14.5** Lancer l'inscription au renouvellement **MP-14.6** Confirmer l'achèvement du renouvellement	Rachid Kettani 25 août 2026	Lancer le renouvellement pour les 12 salariés ; confirmer 10 réussites, 2 reprogrammés.
UFT-09-07 **Produire l'extrait d'audit de conformité**	**MP-14.7** Produire l'extrait d'audit de conformité **MP-10.4** Exporter le rapport	Rachid Kettani 28 août 2026	Exporter l'extrait d'audit de conformité ISO 7101 (XLSX) pour l'auditeur externe.

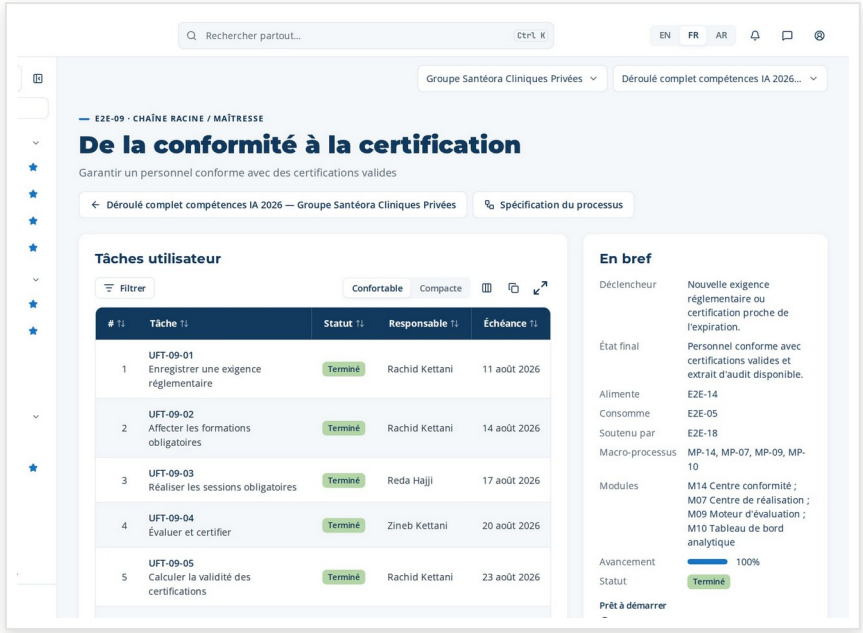

La page de E2E-09 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-14 Gestion de la conformité et des certifications
- MP-07 Réalisation et mise en œuvre de la formation
- MP-09 Évaluation
- MP-10 Reporting et analyses

Alimente

E2E-14

Soutenu par

E2E-18

Conformité et préparation à la certification — Établissements de santé

Maintenir les rôles réglementés Établissements de santé certifiés selon ISO 7101.


DÉCLENCHEUR
Nouvelle exigence ISO 7101 ou expiration de certification.

ÉTAT FINAL
Extrait de conformité sectorielle émis, rôles critiques certifiés.

4 tâches · 8 étapes
11 jours · 2 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-01 Alignement stratégie et gouvernance · MP-02 Gestion des compétences · MP-14 Gestion de la conformité et des certifications · HCPR-MP-01 HCPR-MP-01

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-HCPR-E1-01 **Enregistrer les obligations ISO 7101**	**MP-01.1** Enregistrer les objectifs stratégiques de l'entreprise **MP-14.1** Enregistrer une exigence réglementaire	Rachid Kettani 10 août 2026	Obligation « Formation ISO 7101 », tous les 12 mois, responsable conformité.
UFT-HCPR-E1-02 **Relier les obligations aux postes**	**MP-01.2** Relier les objectifs aux fonctions et aux sites **MP-14.2** Affecter les formations obligatoires par poste	Karim Chraibi 13 août 2026	Reliée à 5 postes Soins cliniques et infirmiers (38 salariés).
UFT-HCPR-E1-03 **Suivre la validité des certifications**	**MP-02.1** Définir les familles et niveaux de compétences **MP-14.3** Calculer la validité des certifications	Rachid Kettani 16 août 2026	Validité : 33 valides, 5 expirent sous 60 jours.
UFT-HCPR-E1-04 **Émettre l'extrait de conformité**	**MP-02.2** Fixer les niveaux cibles par poste **MP-14.7** Produire l'extrait d'audit de conformité	Rachid Kettani 19 août 2026	Extrait émis pour l'audit ISO 7101 du 15 octobre.

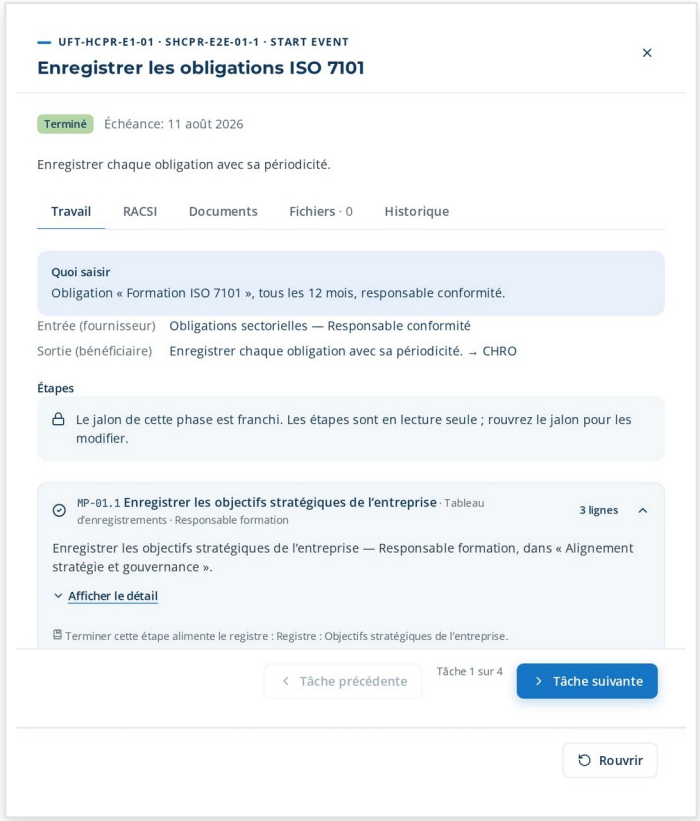

UFT-HCPR-E1-01 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

06

PHASE 6

Talents, savoirs et amélioration continue

4 processus · 30 tâches · 51 étapes

5 sept. 2026 – 28 sept. 2026

Fermée par G6 — Clôture et amélioration continue

E2E-10 Du talent à la mobilité

E2E-11 De l'intégration à la productivité

E2E-12 De la capture au transfert des savoirs

E2E-31 De la mission à la feuille de route

Du talent à la mobilité

Favoriser la mobilité interne et la progression de carrière


DÉCLENCHEUR
Poste interne publié ou revue annuelle de carrière.

ÉTAT FINAL
Mobilité interne décidée avec plan de reconversion affecté.

8 tâches · 18 étapes
23 jours · 4 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-13 Développement des talents et des carrières · MP-31 Place de marché des talents par compétences et mobilité interne · MP-02 Gestion des compétences · MP-08 Expérience et engagement des apprenants

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-10-01 **Modéliser les parcours de carrière**	**MP-13.1** Modéliser le parcours de carrière **MP-13.2** Relier les étapes du parcours aux cibles de compétences	Mehdi Lahlou 7 sept. 2026	Parcours : opérateur Soins cliniques et infirmiers → chef d'équipe → encadrant, avec cibles de compétences par étape.
UFT-10-02 **Publier un poste interne**	**MP-31.1** Publier un poste interne **MP-31.2** Définir les compétences requises	Karim Chraibi 10 sept. 2026	Poste « Chef d'équipe Soins cliniques et infirmiers », compétences requises : Triage IA et aide à la décision clinique niveau 3, leadership niveau 2.
UFT-10-03 **Rapprocher les collaborateurs du poste**	**MP-31.3** Rapprocher les collaborateurs du poste **MP-02.7** Valider l'inventaire des compétences	Karim Chraibi 13 sept. 2026	Revoir 6 correspondances IA ; garder 4 candidats au score supérieur à 75 %.
UFT-10-04 **Postuler à un poste interne**	**MP-31.4** Postuler à un poste interne	Reda Sefrioui 16 sept. 2026	Candidature avec note de motivation et accord du manager actuel.
UFT-10-05 **Présélectionner les candidats**	**MP-31.5** Présélectionner les candidats	Karim El Idrissi 19 sept. 2026	Liste restreinte : 2 candidats ; entretiens les 20 et 21 juin.

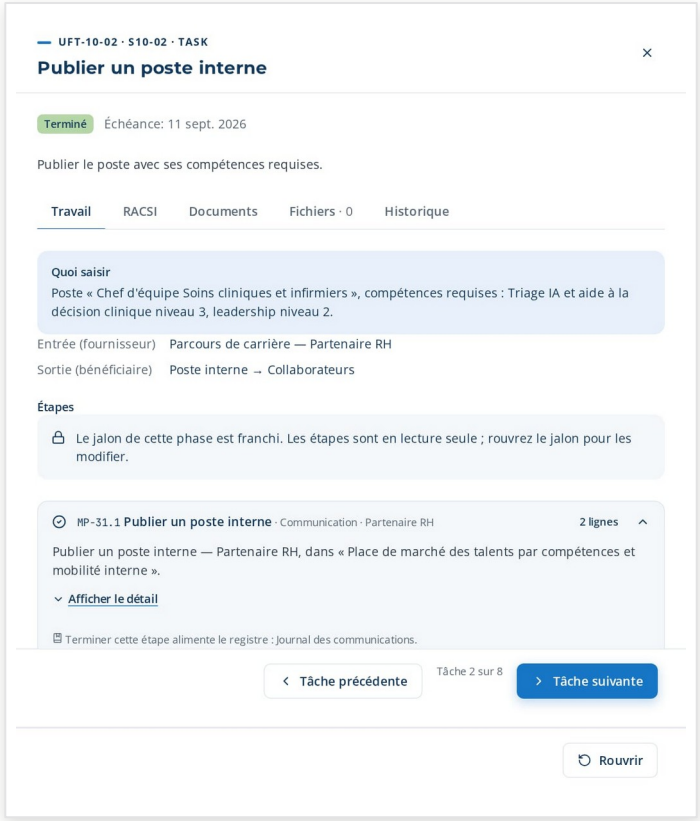


UFT-10-02 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

Du talent à la mobilité (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-10-06 **Planifier le développement individuel**	**MP-13.3** Créer le plan de développement individuel **MP-13.4** Proposer des actions de développement **MP-42.3** Construire le plan de développement du leadership *+ 1 autres étapes*	Karim El Idrissi 22 sept. 2026	Plan de développement : 2 modules Triage IA et aide à la décision clinique, 1 atelier leadership, 3 mois de mentorat.
UFT-10-07 **Affecter un plan de reconversion**	**MP-31.6** Affecter un plan de reconversion **MP-08.1** Générer le plan d'apprentissage personnel	Karim Chraibi 25 sept. 2026	Affecter le parcours de reconversion « Triage IA et aide à la décision clinique pour chefs d'équipe » au candidat retenu.
UFT-10-08 **Revoir carrières et succession**	**MP-13.5** Mener la revue de carrière **MP-13.6** Mettre à jour la préparation à la succession **MP-42.5** Revoir le vivier de dirigeants *+ 1 autres étapes*	Mehdi Lahlou 28 sept. 2026	Préparation à la succession mise à jour : 2 prêts maintenant, 3 prêts sous 12 mois.

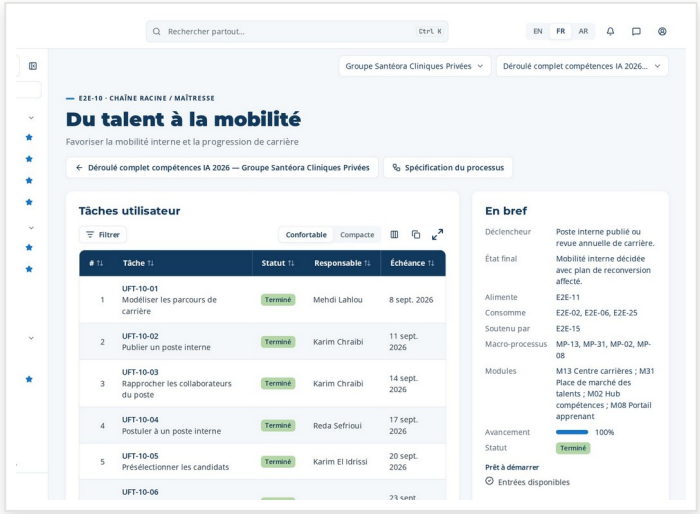

La page de E2E-10 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Alimente
E2E-11
Soutenu par
E2E-15

De l'intégration à la productivité

Accélérer l'atteinte de la productivité


DÉCLENCHEUR
Nouvelle recrue ou mobilité interne confirmée.

ÉTAT FINAL
Collaborateur productif dans le délai cible et intégration clôturée.

7 tâches · 11 étapes
20 jours · 4 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-35 Intégration et montée en compétences rapide · MP-07 Réalisation et mise en œuvre de la formation · MP-08 Expérience et engagement des apprenants · MP-13 Développement des talents et des carrières

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-11-01 **Créer le dossier d'intégration**	**MP-35.1** Créer le dossier d'intégration	Karim El Idrissi 7 sept. 2026	Dossier d'intégration du nouveau technicien Soins cliniques et infirmiers, arrivée le 1er juillet, parrain désigné.
UFT-11-02 **Générer le parcours 30-60-90 jours**	**MP-35.2** Générer le parcours 30-60-90 jours **MP-08.1** Générer le plan d'apprentissage personnel	Karim Chraibi 10 sept. 2026	Parcours 30-60-90 : J30 sécurité et ISO 7101 ; J60 Triage IA et aide à la décision clinique ; J90 autonomie au poste.
UFT-11-03 **S'inscrire aux sessions d'intégration**	**MP-07.3** Inscrire les apprenants à la session **MP-07.4** Envoyer les convocations	Reda Hajji 13 sept. 2026	Inscrire à la session d'accueil du 2 juillet ; convocation envoyée.
UFT-11-04 **Réaliser les tâches d'intégration**	**MP-35.3** Réaliser les tâches d'intégration	Reda Sefrioui 16 sept. 2026	Tâches réalisées : badge, compte informatique, visite sécurité, rencontre équipe.
UFT-11-05 **Tenir les points d'étape**	**MP-35.4** Tenir le point d'étape **MP-21.3** Planifier les séances de coaching	Karim El Idrissi 19 sept. 2026	Point J30 : conforme ; accompagnement nécessaire sur la saisie Triage IA et aide à la décision clinique.

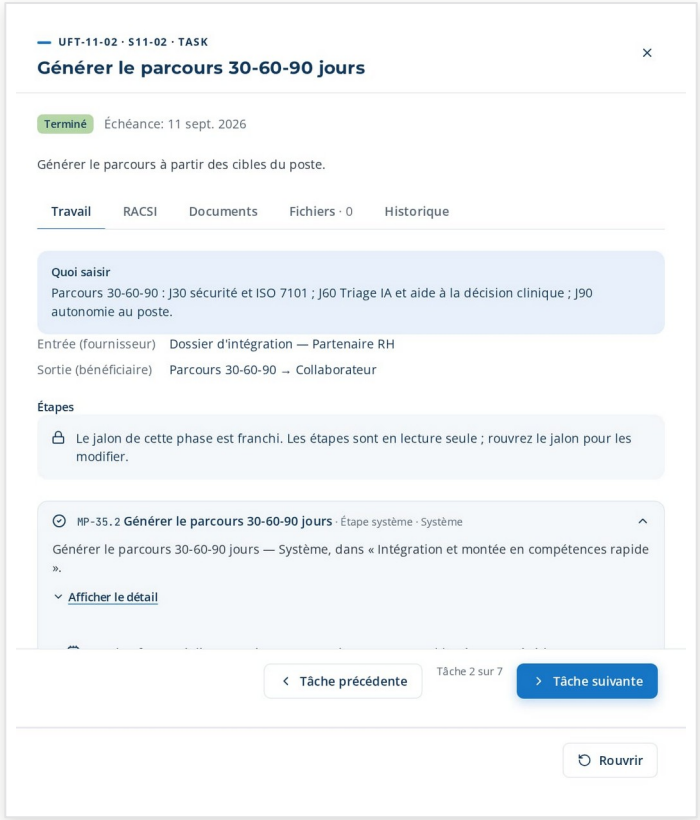


UFT-11-02 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

De l'intégration à la productivité (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-11-06 **Évaluer le délai d'atteinte de la productivité**	**MP-35.5** Évaluer le délai d'atteinte de la productivité	Karim El Idrissi 22 sept. 2026	Délai de productivité : 74 jours (cible 90).
UFT-11-07 **Clôturer l'intégration**	**MP-35.6** Clôturer l'intégration **MP-13.3** Créer le plan de développement individuel	Karim Chraibi 25 sept. 2026	Clôturer l'intégration ; rattacher le plan de développement de l'année 1.

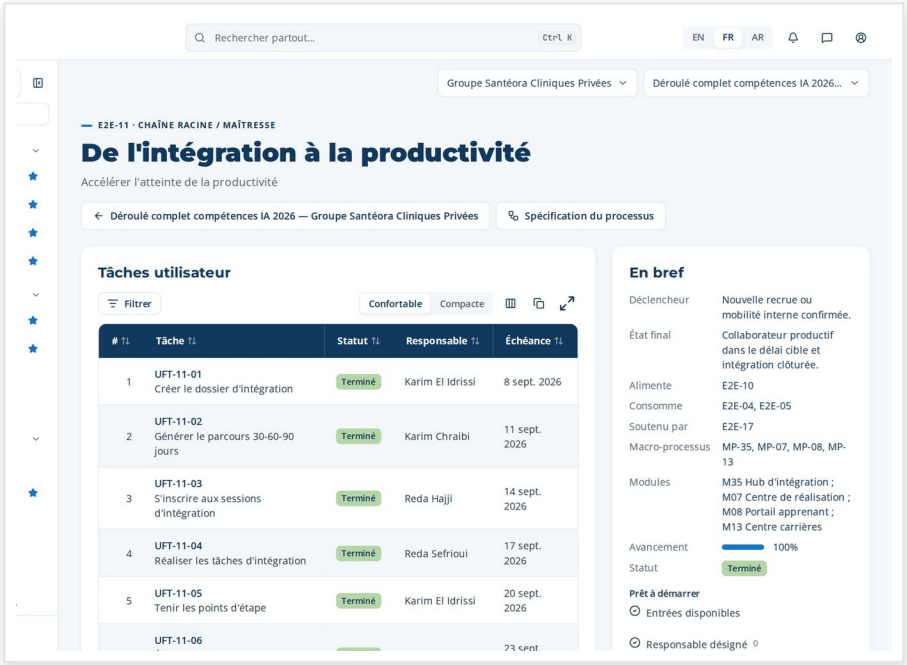

La page de E2E-11 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-35 Intégration et montée en compétences rapide
- MP-07 Réalisation et mise en œuvre de la formation
- MP-08 Expérience et engagement des apprenants
- MP-13 Développement des talents et des carrières

Alimente

E2E-10

Soutenu par

E2E-17

De la capture au transfert des savoirs

Capturer et transférer les savoirs institutionnels


DÉCLENCHEUR
Expert critique identifié comme partant, en retraite ou détenteur de savoirs à risque.

ÉTAT FINAL
Savoirs capturés, publiés et transférés à un successeur validé.

7 tâches · 10 étapes
20 jours · 4 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-34 Capture et transfert des savoirs d'experts · MP-12 Culture d'apprentissage et gestion des connaissances · MP-33 Contenus générés par les utilisateurs et partage de connaissances entre pairs · MP-06 Gestion des contenus et des ressources

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-12-01 **Identifier les experts critiques**	**MP-34.1** Identifier les experts critiques	Karim Chraibi 7 sept. 2026	Expert critique : ingénieur senior Soins cliniques et infirmiers, départ à la retraite dans 8 mois ; risque de perte : élevé.
UFT-12-02 **Planifier les séances de capture**	**MP-34.2** Planifier les séances de capture	Asmae Ziani 10 sept. 2026	Plan de capture : 4 séances de 90 minutes sur le dépannage et les pratiques ISO 7101.
UFT-12-03 **Enregistrer l'entretien d'expert**	**MP-34.3** Enregistrer l'entretien d'expert	Asmae Ziani 13 sept. 2026	Entretien 1 enregistré (82 minutes) ; transcription jointe.
UFT-12-04 **Structurer les savoirs**	**MP-34.4** Structurer les savoirs à partir de la transcription	Asmae Ziani 16 sept. 2026	Accepter la structure IA : 5 modes de défaillance, 12 contrôles, 3 règles de décision ; corriger 2 termes techniques.
UFT-12-05 **Publier un article de connaissance**	**MP-12.1** Publier un article de connaissance **MP-12.2** Indexer l'article pour la recherche **MP-33.4** Approuver la publication	Asmae Ziani 19 sept. 2026	Publier l'article « Guide de dépannage — Soins cliniques et infirmiers » en EN/FR/AR ; indexé pour la recherche.

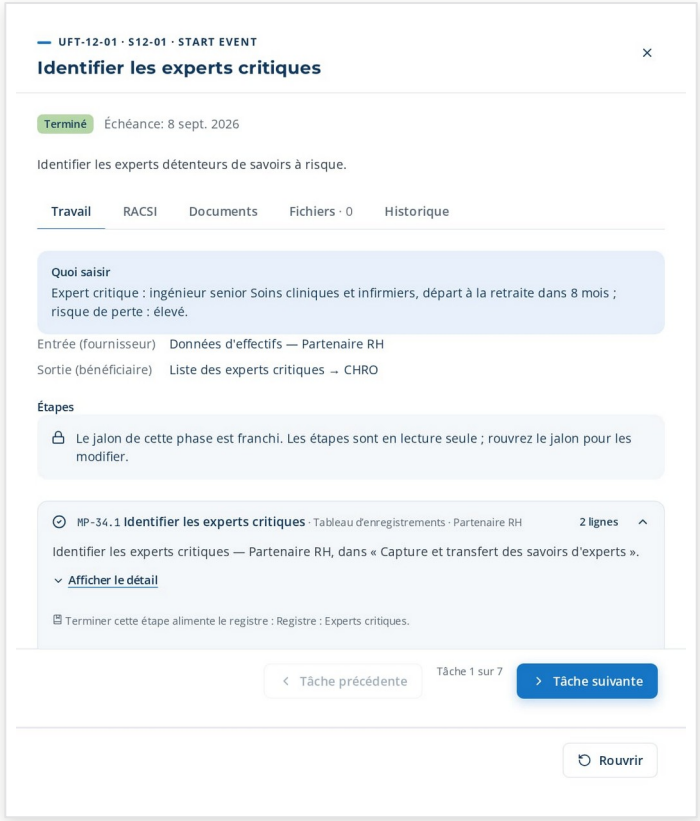


UFT-12-01 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

De la capture au transfert des savoirs (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-12-06 **Affecter le parcours au successeur**	**MP-34.5** Affecter le parcours au successeur **MP-06.6** Publier le contenu au catalogue	Karim El Idrissi 22 sept. 2026	Affecter le parcours du successeur : article + 3 séances en binôme avec l'expert.
UFT-12-07 **Valider l'achèvement du transfert**	**MP-34.6** Valider l'achèvement du transfert	Hamza Lahlou 25 sept. 2026	Transfert validé : le successeur a résolu seul 4 cas tests sur 5.

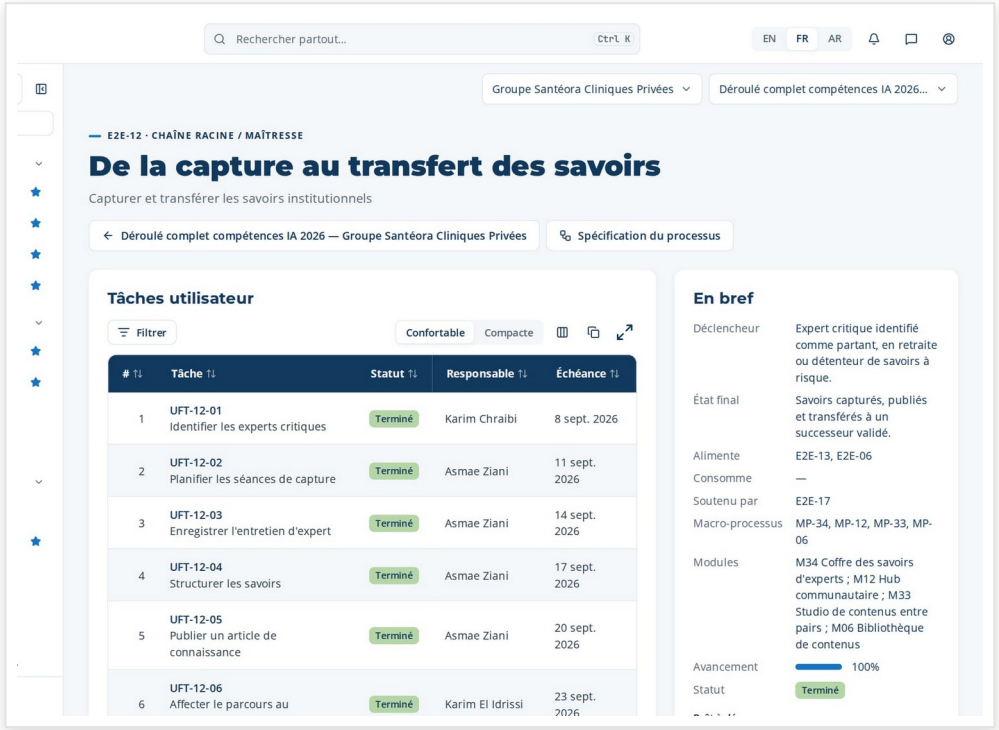

La page de E2E-12 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-34 Capture et transfert des savoirs d'experts
- MP-12 Culture d'apprentissage et gestion des connaissances
- MP-33 Contenus générés par les utilisateurs et partage de connaissances entre pairs
- MP-06 Gestion des contenus et des ressources

Alimente

E2E-13, E2E-06

Soutenu par

E2E-17

De la mission à la feuille de route

Définir la feuille de route post-mission et l'amélioration continue


DÉCLENCHEUR
Clôture de la mission d'ingénierie de formation en cours (E2E-19).

ÉTAT FINAL
Feuille de route post-mission approuvée avec missions futures et plan d'amélioration continue.

8 tâches · 12 étapes
23 jours · 5 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-50 Feuille de route post-mission et amélioration continue · MP-36 Gestion des missions de conseil · MP-19 Conduite du changement et adoption · MP-12 Culture d'apprentissage et gestion des connaissances · MP-16 Gouvernance des données, de l'IA et des intégrations

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-31-01 **Consolider les constats de la mission**	**MP-50.1** Consolider les constats de la mission	Nadia Lahlou 7 sept. 2026	Constats : 6 livrables, 3 enseignements, 2 sujets ouverts (SI, organisation).
UFT-31-02 **Définir les perspectives**	**MP-50.2** Définir les perspectives	Nadia Lahlou 10 sept. 2026	Perspectives : programme Planification IA des lits et des effectifs, deuxième vague pour le niveau OP.
UFT-31-03 **Planifier le coaching individuel**	**MP-50.3** Planifier le coaching individuel	Amine Lahlou 13 sept. 2026	Coaching individuel : 6 managers, 6 séances chacun sur 6 mois.
UFT-31-04 **Planifier l'optimisation organisationnelle**	**MP-50.4** Planifier l'optimisation organisationnelle	Mehdi Lahlou 16 sept. 2026	Optimisation organisationnelle : fusionner 2 cellules de planification ; mettre à jour 11 fiches.
UFT-31-05 **Planifier la réhabilitation du SI**	**MP-50.5** Planifier la réhabilitation du SI	Omar El Idrissi 19 sept. 2026	Réhabilitation SI : connecter SIRH et plateforme de formation ; supprimer 2 tableurs.

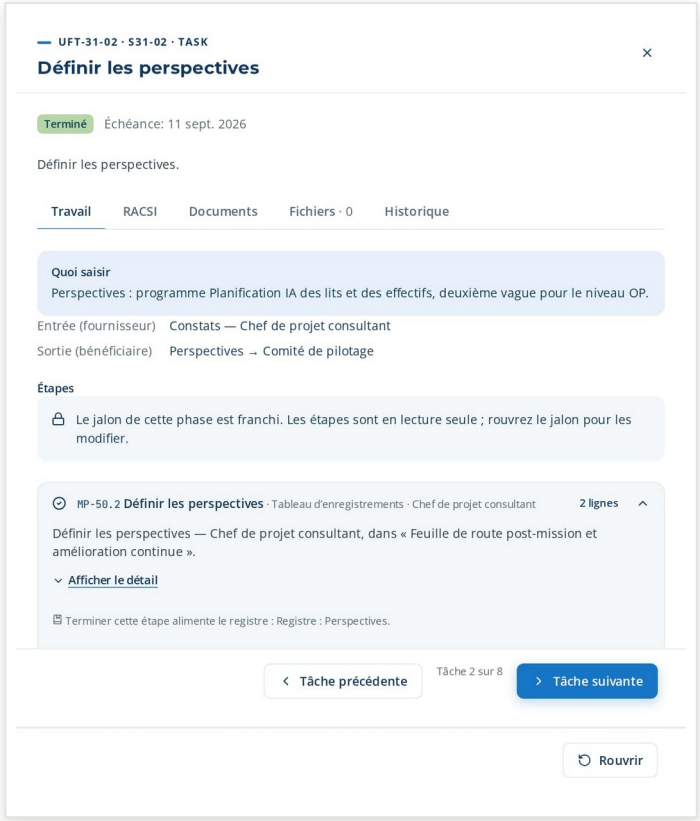


UFT-31-02 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

De la mission à la feuille de route (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-31-06 **Définir les indicateurs et tableaux de bord**	**MP-50.6** Définir les indicateurs et tableaux de bord	Anas Hajji 22 sept. 2026	KPI : couverture de formation, délai d'acquisition, ROI par thème ; tableau de bord mensuel.
UFT-31-07 **Prioriser les missions futures**	**MP-50.7** Prioriser les missions futures **MP-50.8** Valider la feuille de route avec la direction	Nadia Lahlou 25 sept. 2026	Missions prioritaires : 1 réhabilitation SI, 2 coaching, 3 optimisation organisationnelle.
UFT-31-08 **Publier la feuille de route**	**MP-50.9** Publier la feuille de route post-mission **MP-50.10** Suivre l'exécution de la feuille de route **MP-50.11** Améliorer la feuille de route en continu *+ 1 autres étapes*	Nadia Lahlou 28 sept. 2026	Publier la feuille de route post-mission RPT-010 au comité de direction.

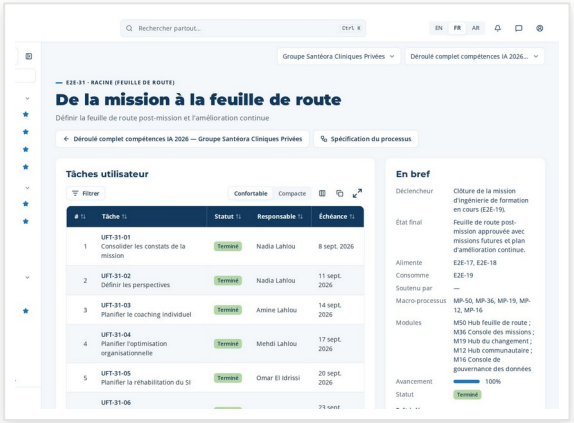

La page de E2E-31 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-50 Feuille de route post-mission et amélioration continue
- MP-36 Gestion des missions de conseil
- MP-19 Conduite du changement et adoption
- MP-12 Culture d'apprentissage et gestion des connaissances
- MP-16 Gouvernance des données, de l'IA et des intégrations

Alimente

E2E-17, E2E-18

Soutenu par

—

00

PHASE 0

Catalyseurs (transverses à toutes les phases)

3 processus · 21 tâches · 34 étapes
18 avr. 2026 – 31 juil. 2026
Sur toutes les phases

E2E-15 Données, IA et intégrations
E2E-17 Du changement à l'adoption
E2E-18 Qualité, risques et amélioration

Données, IA et intégrations

Gouverner les données, l'IA et les intégrations


DÉCLENCHEUR
Nouvelle intégration, source de données ou cas d'usage IA à gouverner.

ÉTAT FINAL
Intégrations, données et IA gouvernées, avec santé, conservation et usage revus.

7 tâches · 11 étapes
20 jours · 3 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-16 Gouvernance des données, de l'IA et des intégrations · MP-17 Gestion des identités, des accès et de la sécurité · MP-10 Reporting et analyses · MP-24 Personnalisation par l'IA et apprentissage adaptatif · MP-28 Analytique prédictive de l'apprentissage et intelligence

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-15-01 **Enregistrer une intégration externe**	**MP-16.1** Enregistrer une intégration externe	Loubna Mansouri 20 avr. 2026	Enregistrer l'intégration « SIRH — Workday » (INT-HR-01) ; référence d'identifiants stockée chiffrée.
UFT-15-02 **Mapper les champs et vérifier la santé**	**MP-16.2** Mapper les champs de l'intégration **MP-16.3** Vérifier la santé de l'intégration	Omar El Idrissi 23 avr. 2026	Mapper les champs : employee_id → matricule ; position → poste. Test de santé : succès.
UFT-15-03 **Lancer la synchronisation SIRH**	**MP-16.4** Lancer la synchronisation SIRH **MP-16.5** Revoir les rejets de synchronisation	Omar El Idrissi 26 avr. 2026	Synchronisation : 1 204 fiches mises à jour, 3 rejetées (poste manquant) — corrigées.
UFT-15-04 **Définir une règle de conservation des données**	**MP-16.6** Définir une règle de conservation des données	Yassine Berrada 29 avr. 2026	Conservation : réponses aux questionnaires 3 ans ; dossiers de formation 10 ans.
UFT-15-05 **Tenir le registre des cas d'usage IA**	**MP-16.7** Tenir le registre des cas d'usage IA	Loubna Mansouri 2 mai 2026	Ajouter le cas d'usage « Synthèse des rapports de poste » (Assistif), version 1.

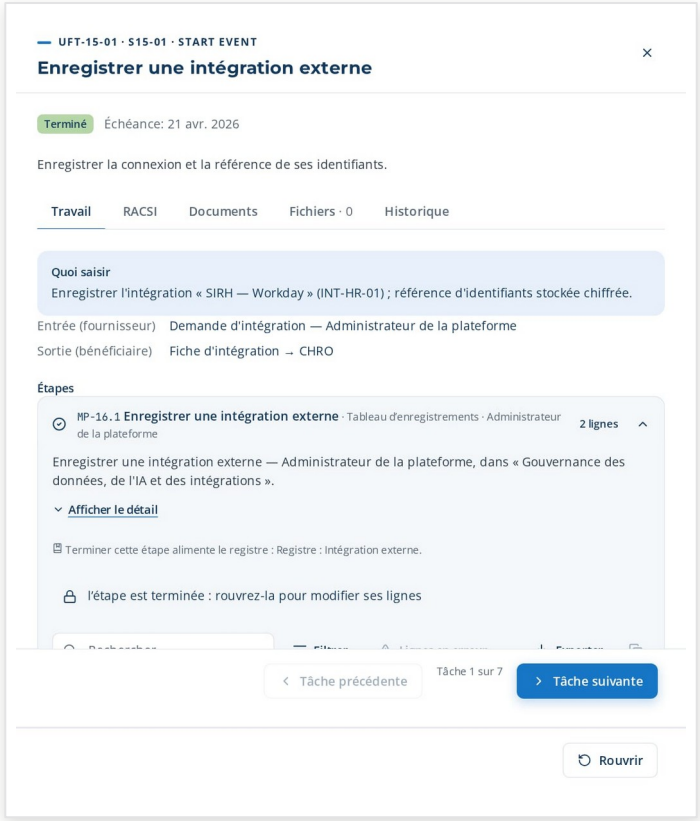


UFT-15-01 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

Données, IA et intégrations (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-15-06 **Définir l'activation de l'IA par périmètre**	**MP-16.8** Définir l'activation de l'IA par périmètre **MP-24.1** Activer la personnalisation par périmètre	Loubna Mansouri 5 mai 2026	Activer AIUC-35 et AIUC-36 pour l'organisation ; forçage Off pour le projet pilote B.
UFT-15-07 **Revoir le journal d'usage de l'IA**	**MP-16.9** Revoir le journal d'usage de l'IA **MP-28.2** Valider la qualité du jeu de données	Omar El Idrissi 8 mai 2026	Revue d'usage : 412 suggestions — 71 % acceptées, 20 % modifiées, 9 % rejetées.

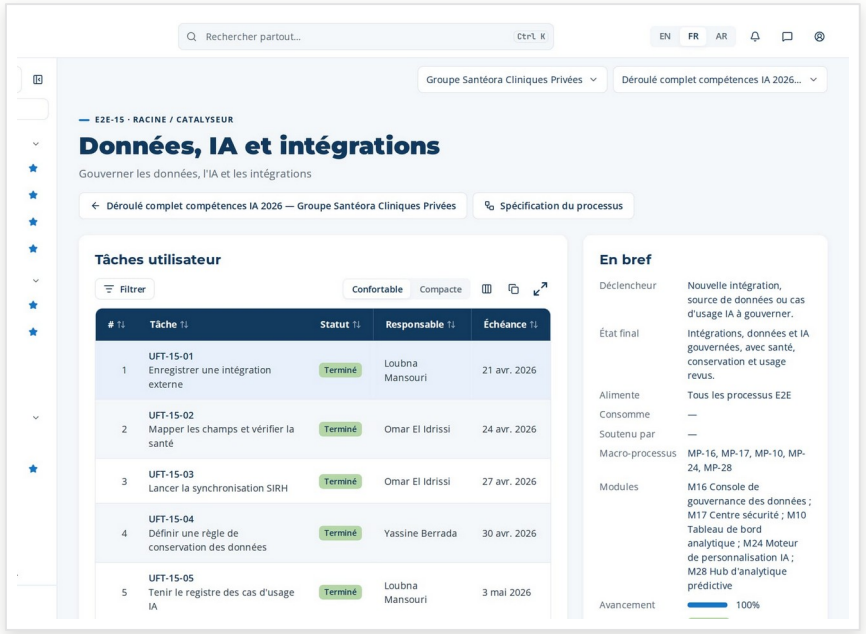

La page de E2E-15 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-16 Gouvernance des données, de l'IA et des intégrations
- MP-17 Gestion des identités, des accès et de la sécurité
- MP-10 Reporting et analyses
- MP-24 Personnalisation par l'IA et apprentissage adaptatif
- MP-28 Analytique prédictive de l'apprentissage et intelligence

Alimente

All E2E processes

Soutenu par

—

Du changement à l'adoption

Favoriser une adoption durable et le changement de culture


DÉCLENCHEUR
Plan approuvé ou nouvelle capacité de la plateforme nécessitant une adoption.

ÉTAT FINAL
Adoption durable atteinte et groupes à faible adoption renforcés.

7 tâches · 11 étapes
20 jours · 3 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-19 Conduite du changement et adoption · MP-12 Culture d'apprentissage et gestion des connaissances · MP-08 Expérience et engagement des apprenants · MP-26 Réseaux d'apprentissage social et collaboratif

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-17-01 **Évaluer l'impact du changement**	**MP-19.1** Évaluer l'impact du changement	Yassine Fassi 13 juil. 2026	Impact : encadrants Soins cliniques et infirmiers élevé, opérateurs moyen, fonctions support faible.
UFT-17-02 **Construire le plan d'adoption**	**MP-19.2** Construire le plan d'adoption	Yassine Fassi 16 juil. 2026	Plan d'adoption : message du sponsor, 6 relais, points de 15 minutes chaque semaine pendant 8 semaines.
UFT-17-03 **Lancer la campagne de communication**	**MP-19.3** Lancer la campagne de communication	Yassine Fassi 19 juil. 2026	Campagne « Triage IA et aide à la décision clinique — pourquoi c'est important » par e-mail, intranet et écrans.
UFT-17-04 **Ouvrir l'espace communautaire**	**MP-12.3** Créer un espace communautaire **MP-12.4** Modérer les publications **MP-26.1** Créer une cohorte d'apprentissage	Asmae Ziani 22 juil. 2026	Espace communautaire « Questions Triage IA et aide à la décision clinique » ouvert ; règles de modération publiées.
UFT-17-05 **Suivre l'usage et l'adoption**	**MP-19.4** Suivre l'usage et l'adoption **MP-08.5** Suivre les indicateurs d'engagement	Yassine Berrada 25 juil. 2026	Utilisateurs actifs hebdomadaires : 64 % de la population cible.

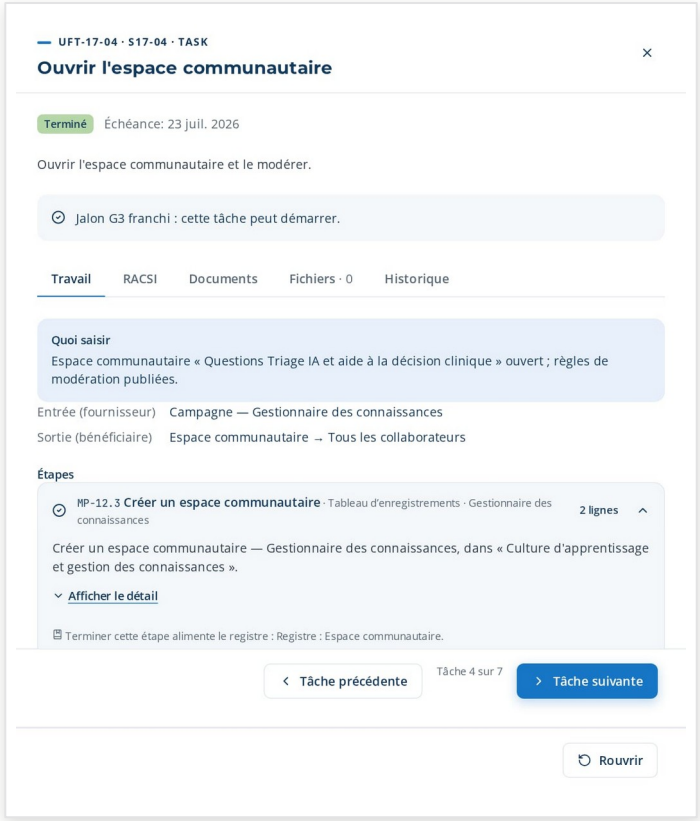


UFT-17-04 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

Du changement à l'adoption (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-17-06 **Identifier les groupes à faible adoption**	**MP-19.5** Identifier les groupes à faible adoption	Yassine Fassi 28 juil. 2026	Faible adoption confirmée pour l'équipe de nuit (31 %) ; un groupe rejeté (faux positif).
UFT-17-07 **Mener les actions de renforcement**	**MP-19.6** Mener les actions de renforcement **MP-08.6** Déclencher une relance de réengagement	Yassine Fassi 31 juil. 2026	Renforcement : coaching de l'équipe de nuit ; adoption à 58 % après 4 semaines.

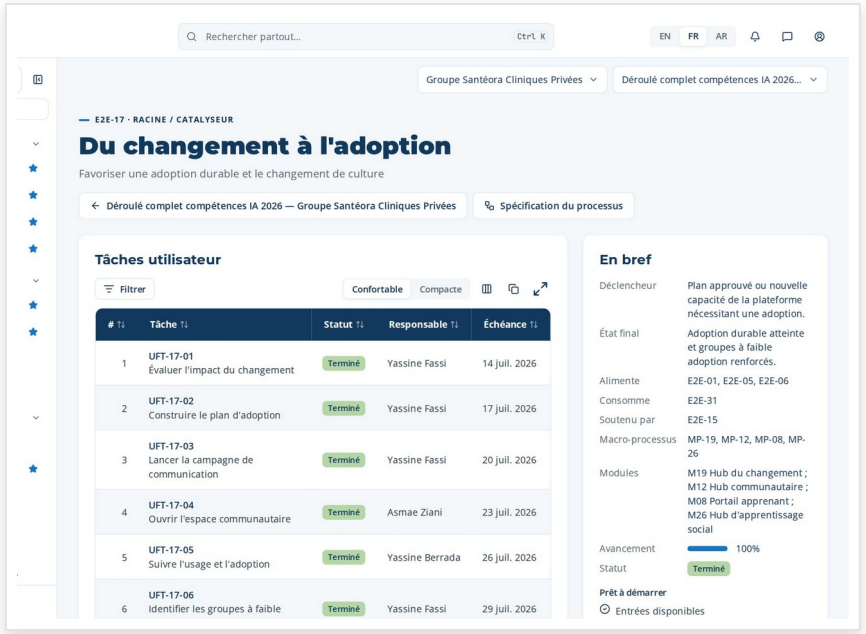

La page de E2E-17 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-19 Conduite du changement et adoption
- MP-12 Culture d'apprentissage et gestion des connaissances
- MP-08 Expérience et engagement des apprenants
- MP-26 Réseaux d'apprentissage social et collaboratif

Alimente

E2E-01, E2E-05, E2E-06

Soutenu par

E2E-15

Qualité, risques et amélioration

Améliorer les processus et maîtriser les risques


DÉCLENCHEUR
Risque enregistré, revue qualité périodique due ou test de contrôle planifié.

ÉTAT FINAL
Risques maîtrisés, actions évaluées par une autre personne, contrôles notés.

7 tâches · 12 étapes
20 jours · 2 responsables · 100 %

Macro-processus : MP-20 Qualité, risques et amélioration continue · MP-16 Gouvernance des données, de l'IA et des intégrations · MP-17 Gestion des identités, des accès et de la sécurité · MP-09 Évaluation

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-18-01 **Enregistrer un risque ou une opportunité**	**MP-20.1** Enregistrer un risque ou une opportunité	Soukaina Bennani 20 avr. 2026	Risque « Formateurs indisponibles au T3 » : probabilité 3, impact 4, score 12.
UFT-18-02 **Affecter une action de maîtrise**	**MP-20.2** Affecter une action de maîtrise	Soukaina Bennani 23 avr. 2026	Action : contractualiser un second prestataire ; responsable acheteur ; évaluateur responsable qualité.
UFT-18-03 **Exécuter l'action d'amélioration**	**MP-20.3** Exécuter l'action d'amélioration	Soukaina Bennani 26 avr. 2026	Action réalisée : contrat-cadre signé avec le prestataire B ; preuve jointe.
UFT-18-04 **Évaluer l'efficacité de l'action**	**MP-20.4** Évaluer l'efficacité de l'action	Soukaina Bennani 29 avr. 2026	Verdict : efficace. L'évaluateur est un utilisateur différent du responsable.

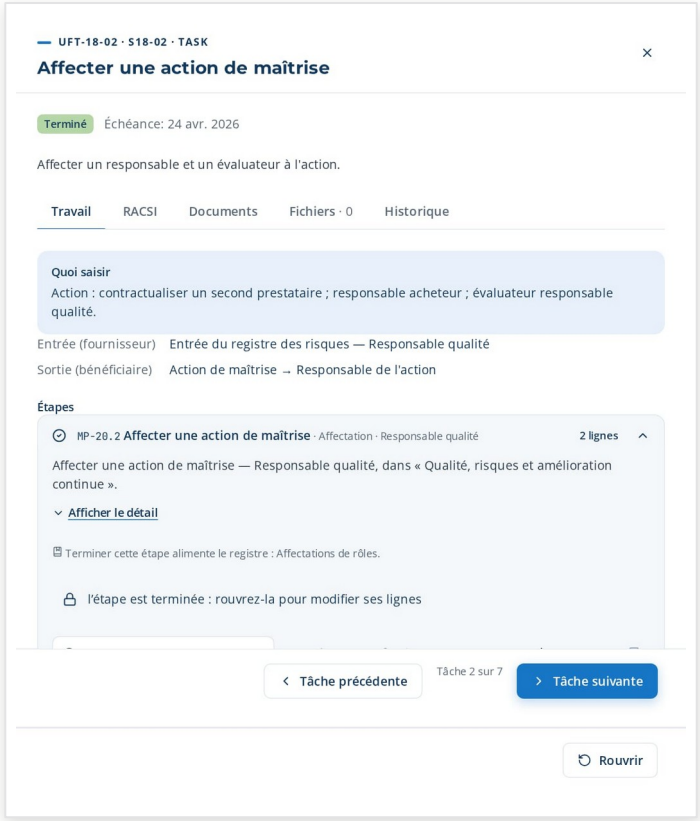


UFT-18-02 ouverte dans CortexSkills : quoi saisir, ses étapes et son résultat.

Suite sur la diapositive suivante

Qualité, risques et amélioration (suite)

Tâche	Étapes exécutées	Responsable · fait	Ce qui a été saisi
UFT-18-05 **Revoir les accès et la sécurité**	**MP-17.4** Revoir le journal des violations d'accès **MP-17.6** Appliquer la limite de tentatives de connexion **MP-17.2** Attribuer des rôles à l'utilisateur *+ 2 autres étapes*	Omar El Idrissi 2 mai 2026	Revue des accès : 2 comptes inactifs désactivés ; 0 tentative inter-organisations.
UFT-18-06 **Mener la revue qualité périodique**	**MP-20.5** Mener la revue qualité périodique **MP-09.7** Revoir les résultats d'évaluation	Soukaina Bennani 5 mai 2026	Compte rendu de revue qualité : 3 KPI rouges, 2 actions ouvertes, prochaine revue dans 30 jours.
UFT-18-07 **Mettre à jour l'efficacité des contrôles**	**MP-20.6** Mettre à jour la note d'efficacité des contrôles	Soukaina Bennani 8 mai 2026	Efficacité du contrôle CTRL-002 : Efficace ; CTRL-031 : Partiellement efficace.

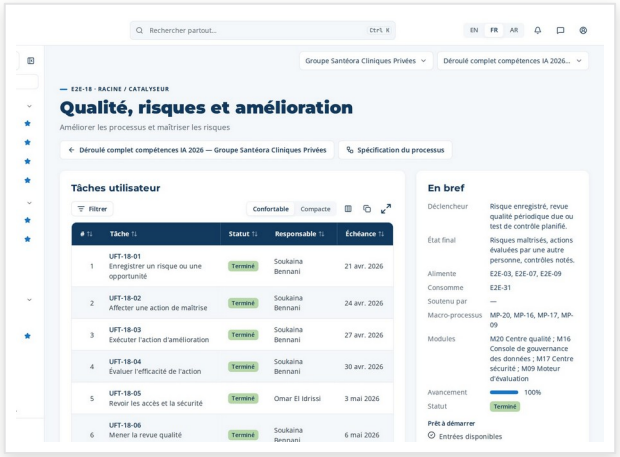

La page de E2E-18 dans CortexSkills : ses tâches, responsables et échéances, et la fiche du processus.

Macro-processus

- MP-20 Qualité, risques et amélioration continue
- MP-16 Gouvernance des données, de l'IA et des intégrations
- MP-17 Gestion des identités, des accès et de la sécurité
- MP-09 Évaluation

Alimente

E2E-03, E2E-07, E2E-09

Soutenu par

—

RÉSULTATS

Ce que le déroulé a produit, en chiffres

Chaque chiffre est la valeur saisie ou calculée à l'étape indiquée dessous

187
réponses au questionnaire consolidées

UFT-03-06

6
thèmes construits à partir de 23 besoins validés

UFT-03-05

1,33 M
MAD de budget formation net approuvé

UFT-01-05

+33 pts
score au test, de 48 % à 81 % (niveau 2)

UFT-07-04

9 / 11
superviseurs appliquent la routine à J+30


UFT-07-05

22 %
ROI, ratio bénéfice-coût 1,22

UFT-08-05

La formation mesurée à chaque niveau de Kirkpatrick

Session S-01, triage IA et aide à la décision clinique pour les superviseurs

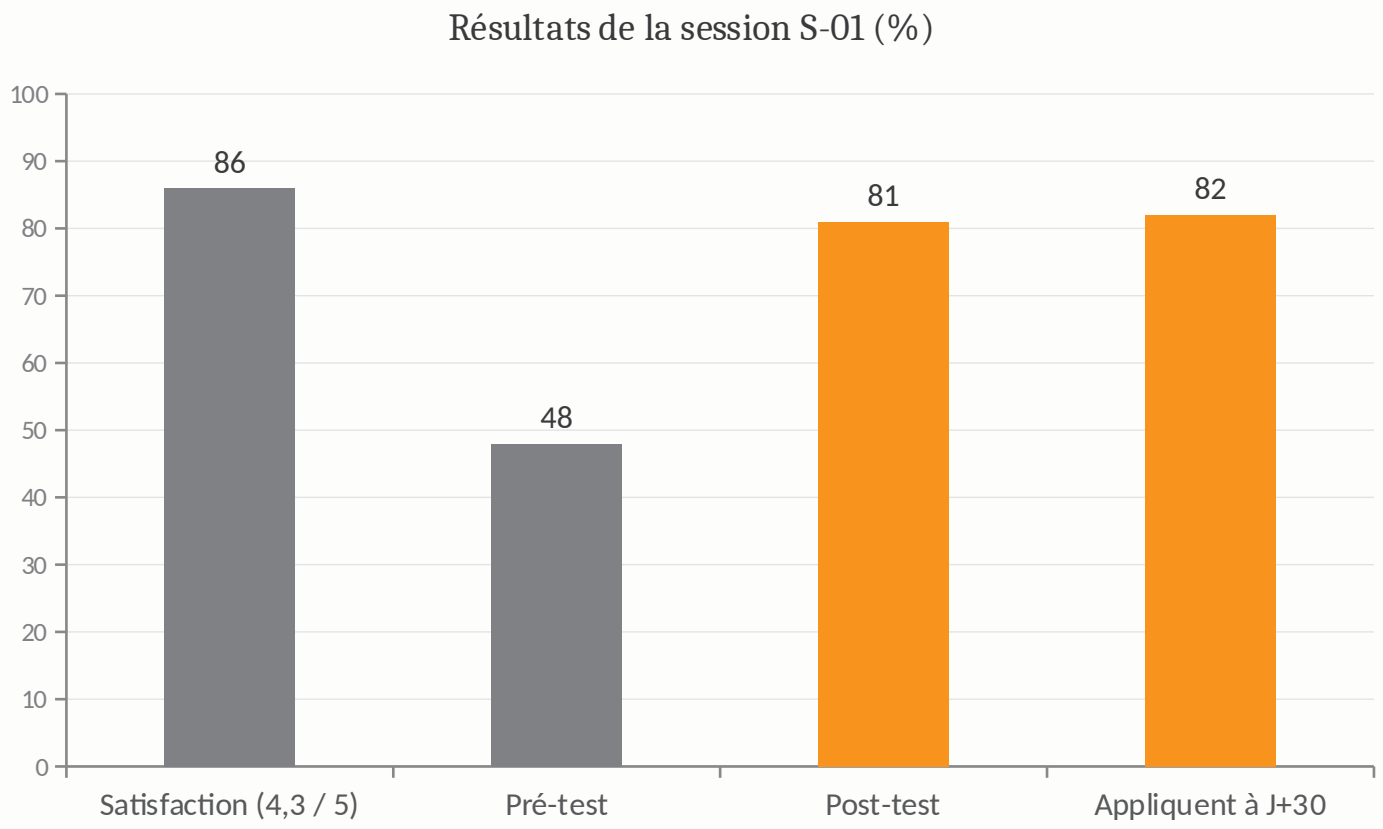

Satisfaction 4,3/5 affichée à 86 % ; 9 participants sur 11 affichés à 82 %. Source : tâches UFT-07-03 à UFT-07-05.

Niveau 1 — Réaction
Enquête à chaud S-01 : 11 réponses, satisfaction 4,3/5.

Niveau 2 — Apprentissage
Niveau 2 : pré-test moyen 48 %, post-test 81 % (+33 points).

Niveau 3 — Comportement
Niveau 3 (J+30) : 9 encadrants sur 11 appliquent la routine Triage IA et aide à la décision clinique chaque jour.


Niveau 4 — ROI
ROI = (410 000 − 335 000) / 335 000 = 22 % ; ratio bénéfice-coût 1,22.

RÉSULTATS

Tous les KPI du projet dans la cible


61 KPI sur 61 au vert — les dix premiers

ID	KPI	Valeur	Cible	Statut
KPI-001	Couverture des objectifs stratégiques	108	100	**Dans la cible**
KPI-002	Taux de validation de l'inventaire des compétences	102,6	95	**Dans la cible**
KPI-003	Taux d'écarts critiques	8,2	10	**Dans la cible**
KPI-004	Délai de production du rapport d'ingénierie de formation	24,6	30	**Dans la cible**
KPI-005	Délai d'approbation de la conception	16,4	20	**Dans la cible**
KPI-006	Conformité de la licence %	108	100	**Dans la cible**
KPI-007	Délai de publication des contenus	12,3	15	**Dans la cible**
KPI-008	Taux de remplissage des sessions	91,8	85	**Dans la cible**
KPI-009	Taux de réalisation du plan	97,2	90	**Dans la cible**
KPI-010	Taux d'achèvement des apprenants	86,4	80	**Dans la cible**

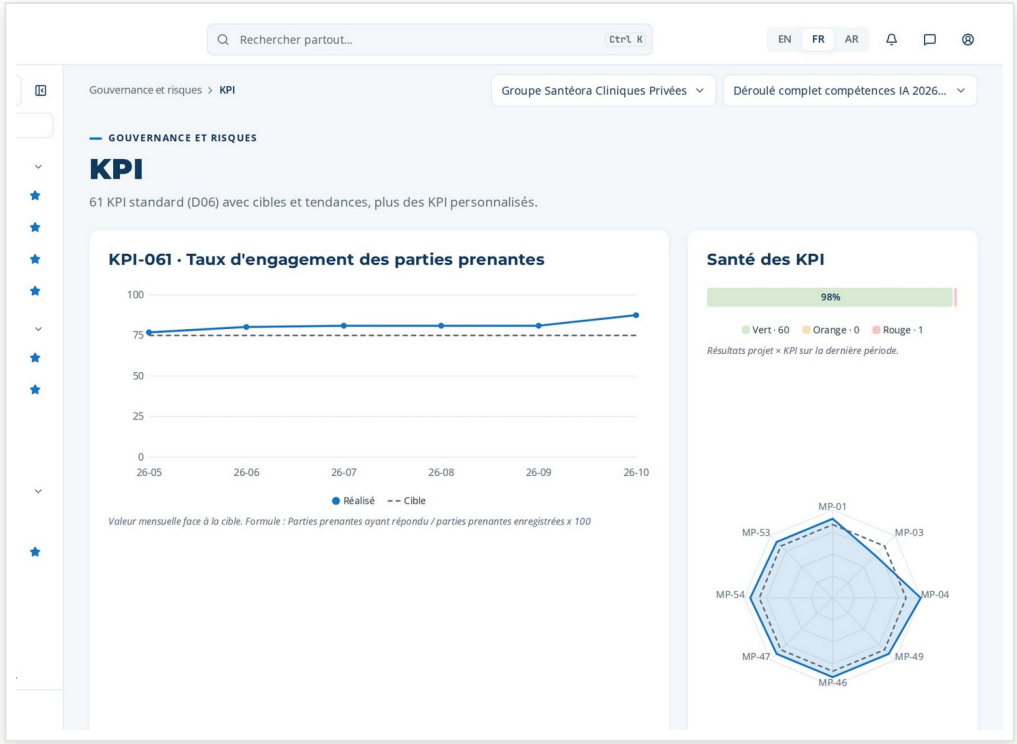


Page des KPI du projet dans CortexSkills.

La campagne de questionnaires

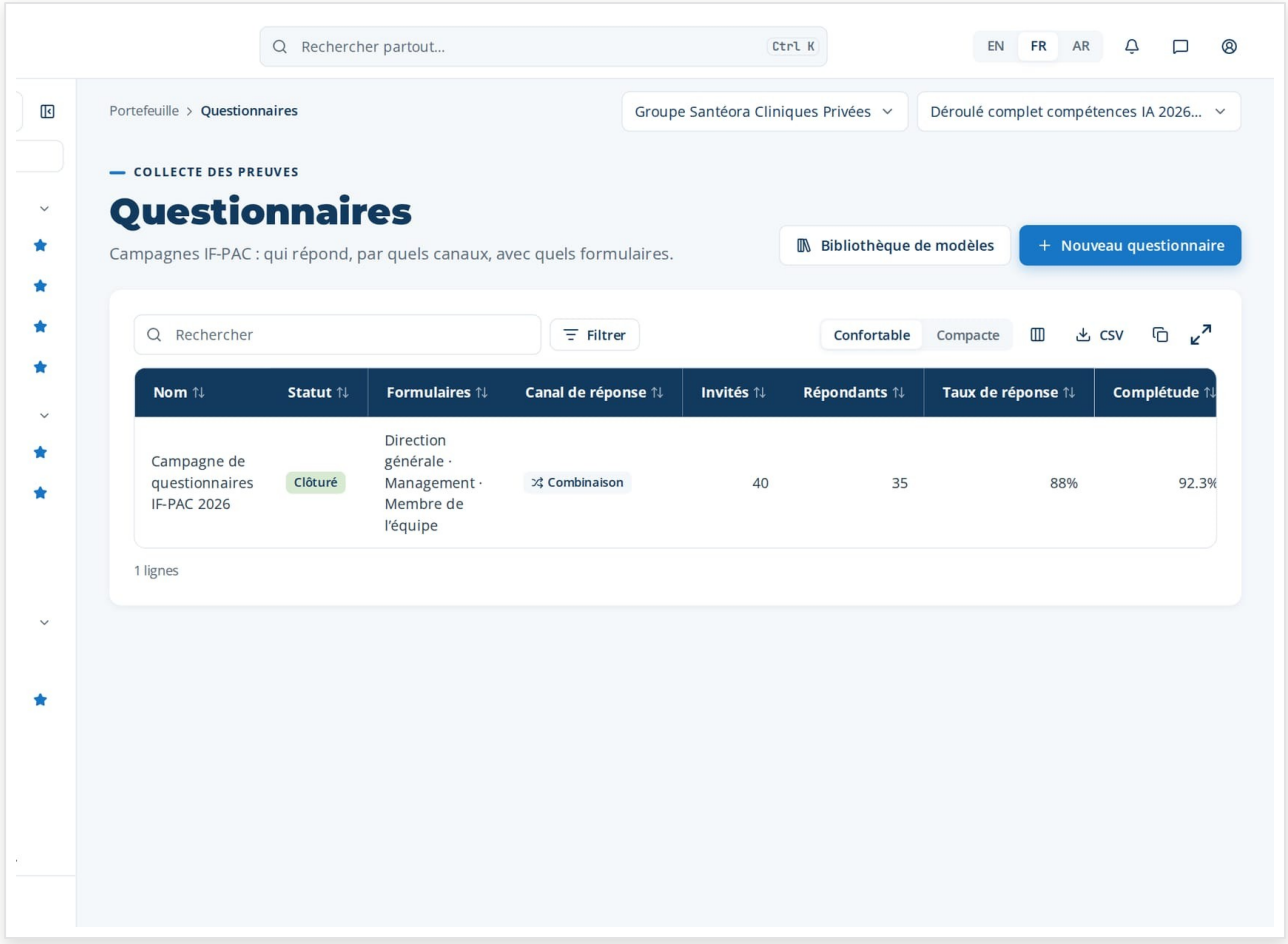


Campagne à trois formulaires (direction générale, encadrement, collaborateurs), canaux, taux de réponse et complétude.

Le plan de formation 2026

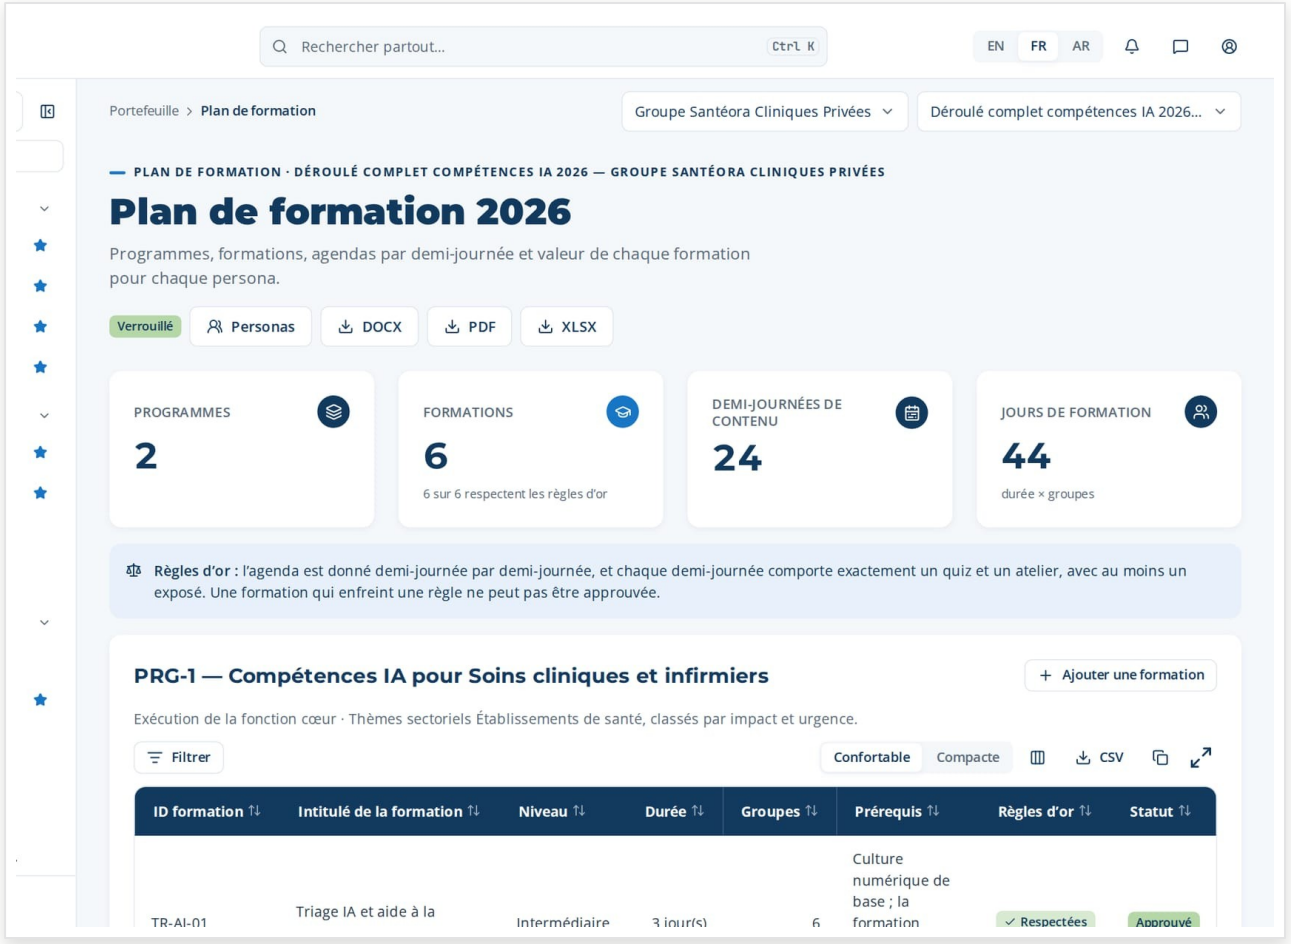


Programmes, formations, agendas par demi-journée et règles d'or vérifiées sur chaque formation.

38 documents publiés, versionnés et approuvés

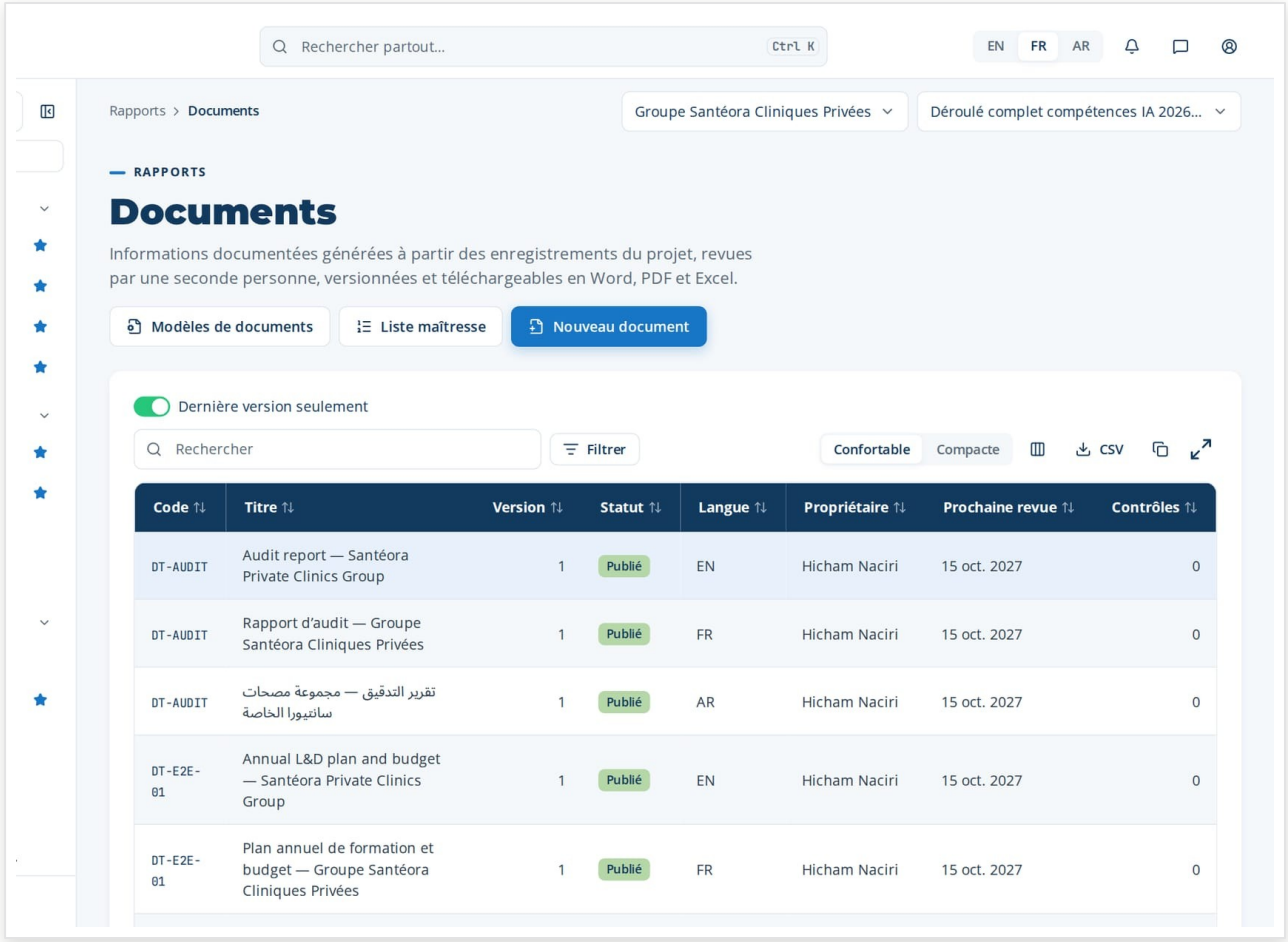

Rapport d'ingénierie de formation, plan de formation, audit, rapport ROI et les autres documents, chacun avec un auteur, un approbateur et une date de revue.

Des rapports standard prêts à exporter

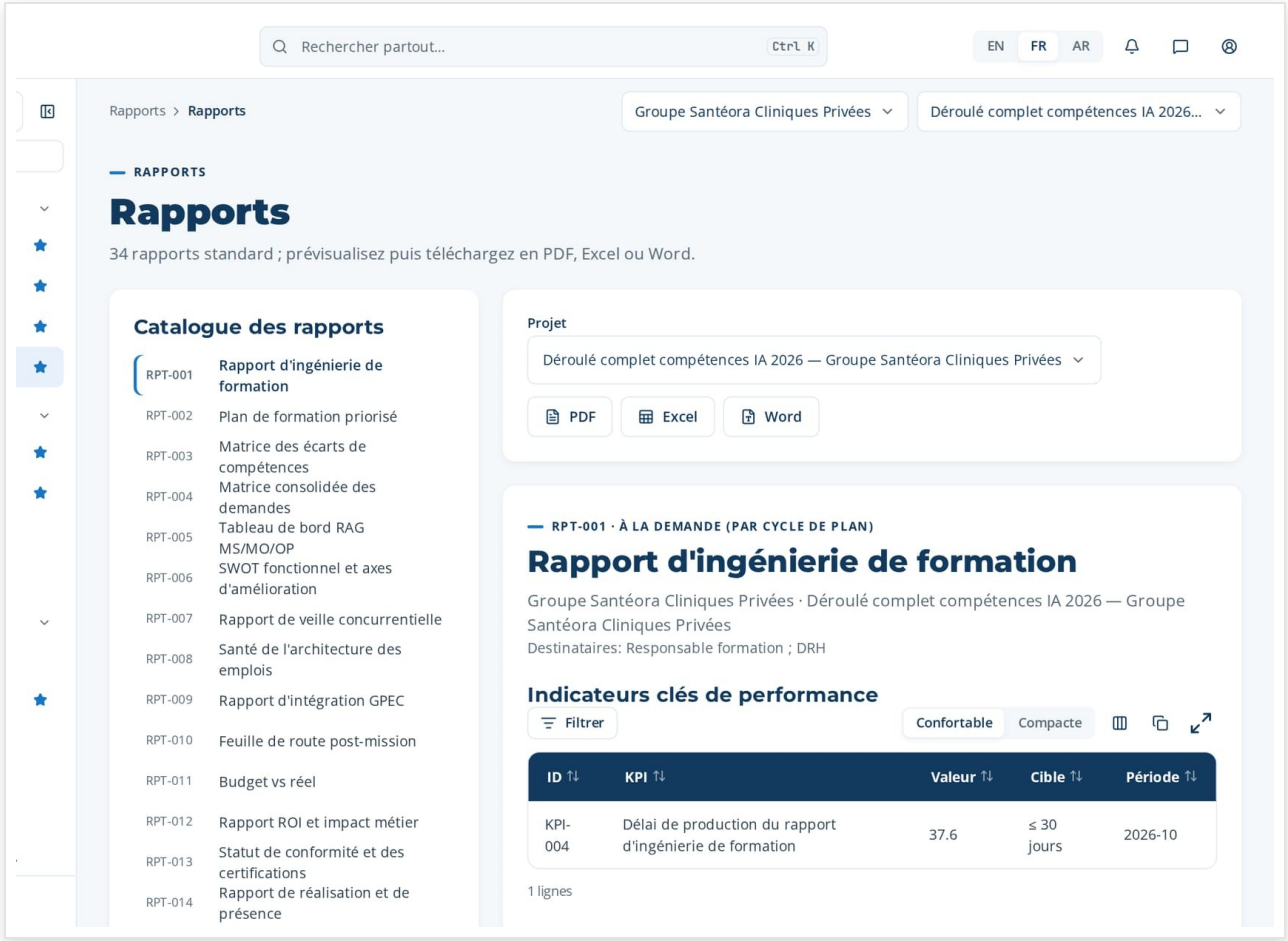

34 rapports standard, prévisualisés et téléchargés en PDF, Excel ou Word.

PROCHAINES ÉTAPES

Parcours proposé pour vos cliniques

Les durées sont indicatives et fixées avec vous lors de l'atelier de cadrage

1

Atelier de cadrage

Une demi-journée : sites, fonctions, niveaux de décision, orientation et parties prenantes — phase 1 dans l'application.

2

Pilote sur une clinique

Questionnaires, diagnostic et rapport d'ingénierie de formation sur vos données — phases 1 à 3.

3

Déploiement sur toutes les cliniques

Déploiement, évaluation jusqu'au ROI et amélioration continue — phases 4 à 6.

Installation sur votre cloud privé ou sur site, sous licence ; interface et documents en français, anglais et arabe.

Merci

POWERACT Consulting · CortexSkills, l’ingénierie de formation pour la santé

Questions et échanges
